



SOURCES *en action*

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT


COFIL

14 janvier 2020

-

Peyrelevade





AGIR pour la BIODIVERSITÉ



Le programme « Sources en action » bénéficie de subventions de :



Cette opération est cofinancée par l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas responsable de la qualité des données ou de l'exactitude des informations.




Ordre du jour

- Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (phases 1 à 3)
- Eléments sur la démarche d'avenants au contrat
- Validation de la programmation 2020 (phase 4)
- Calendrier prévisionnel 2020
- Actualités diverses



Rappel du contexte général



- 1^{er} contrat Sources en action 2011-2015
- 2016 : Bilan – Diagnostics – re-programmation – définition d'un nouveau territoire d'action cohérent →
- Surface de 2 060 km² (10 % bv Vienne)
- 55 masses d'eau (3 338 km de cours d'eau)
- 23 200 ha de zones humides (11 %)
- 1 000 Etangs et 205 obstacles
- 91 communes et 46 500 hab.
- 820 km² surface agricole (40 %) - dont 92 % en prairie
- 1 100 km² de surface boisée (51 %)

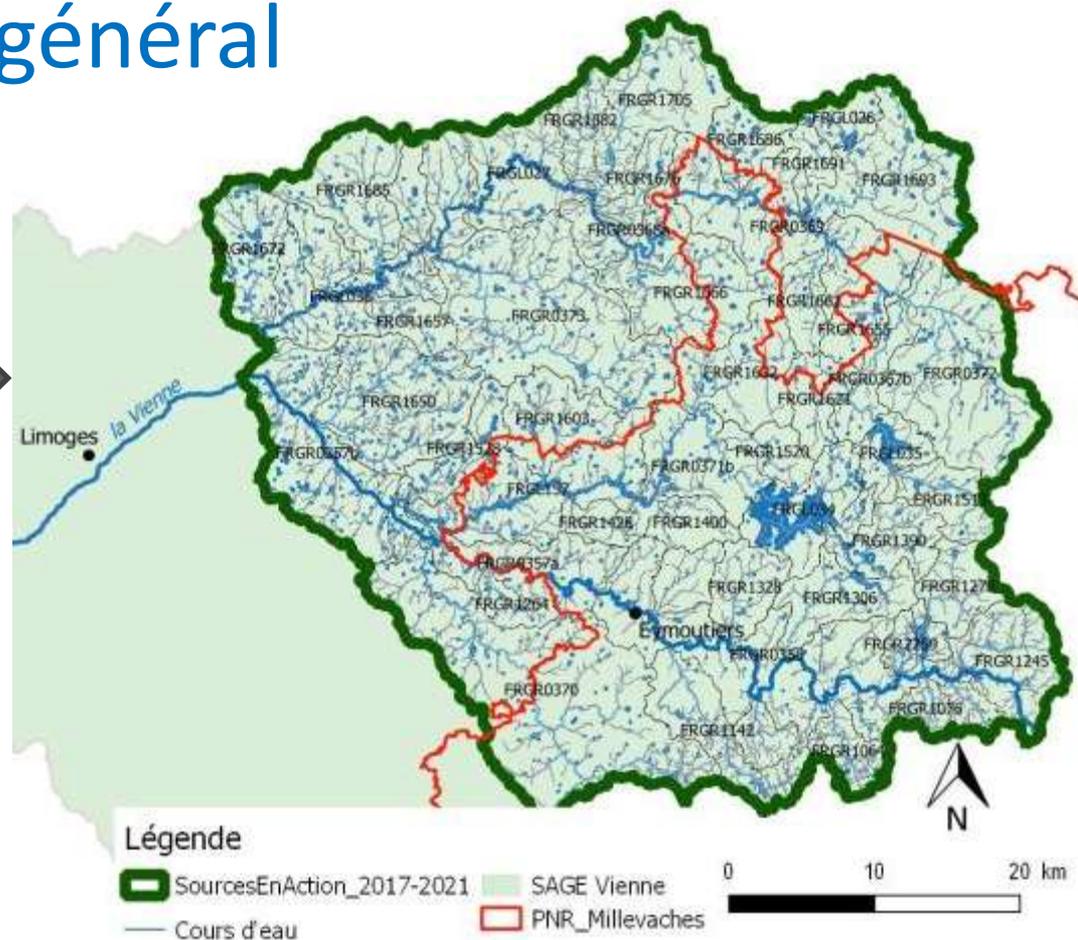

→ 24 structures opératrices pour la restauration et la gestion des milieux aquatiques du bassin en particulier pour l'atteinte du bon état écologique généralisé


Rappel du contexte général

➔ Programmation 2017 – 2022 de 12,3 millions d'euros

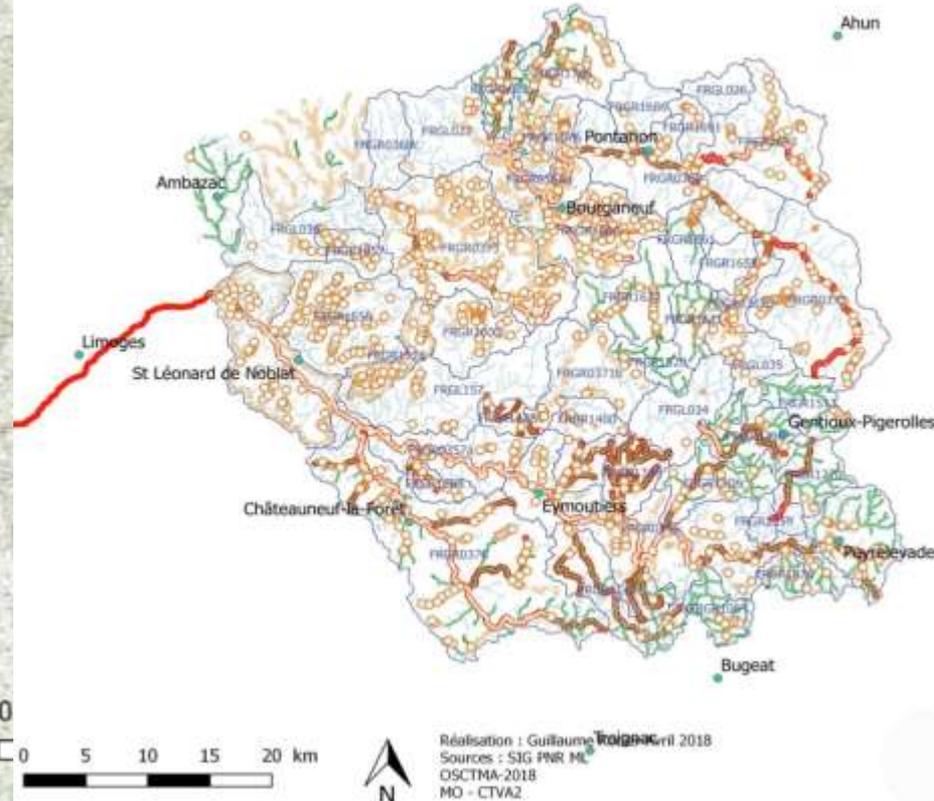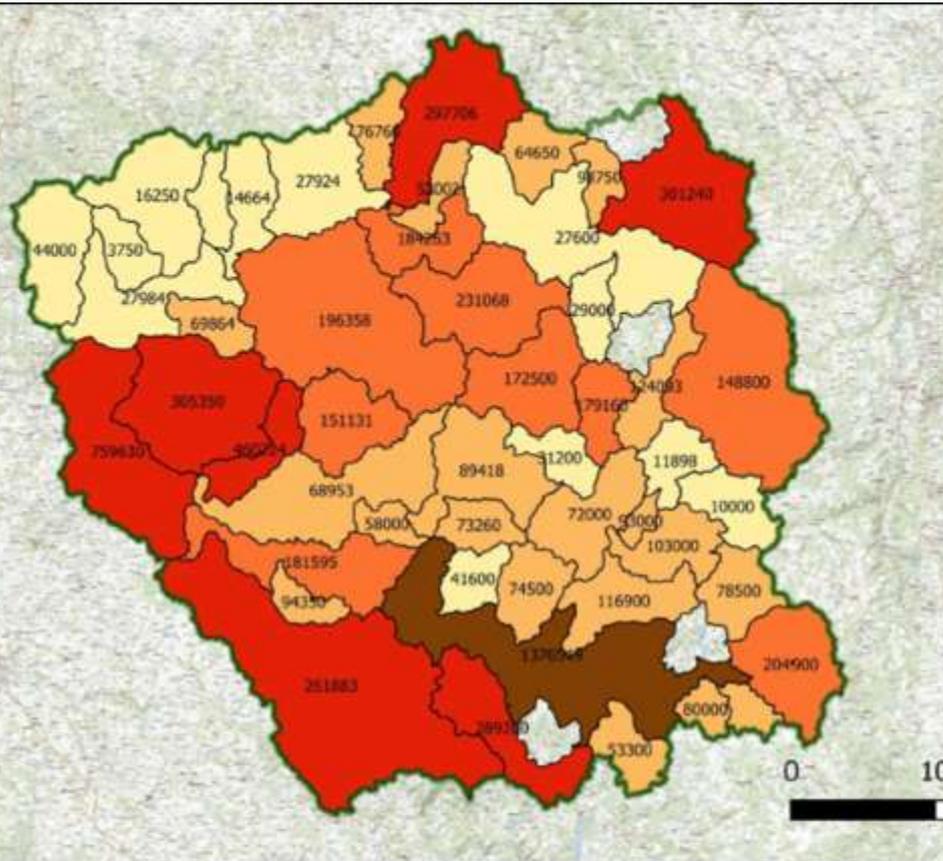


Réalisation : Guillaume TOIGNAC, avril 2018
Sources : SIG PNR ML
OSCTMA-2018
MO - CTV2

Légende

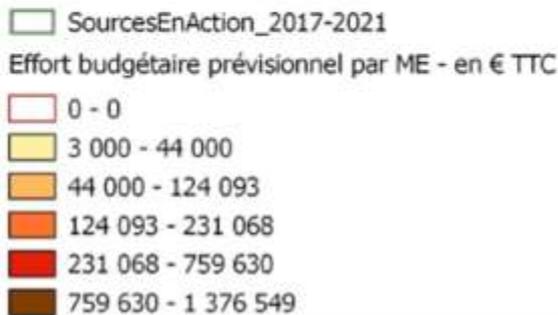

Légende

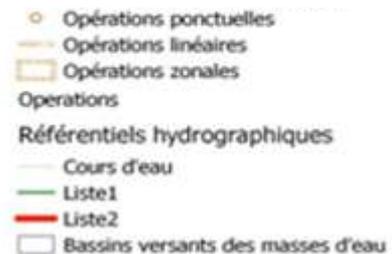

Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

5 200 jours d'animation soit en moyenne 8,4 ETP/an
37% du budget - Taux de réalisation 77%

Prises de contacts, démarchages, informations
sensibilisation, communication

1 100 rencontres techniques avec des riverains dont :

- 125 propriétaires/exploitants forestiers
- 100 propriétaires/exploitants de zones humides
- 225 agriculteurs
- 81 propriétaires d'ouvrages / étangs

Opérations de communications = 10 000 pers. dont:

- 200 élèves (10 classes)
 - 550 personnes lors de 25 manifestations
- Via 40 supports différents

**Le bilan de Sources en action 2011-2015 est
dépassé**



il ne s'agit que des ETP financés



Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

5 200 jours financés d'animation soit en moyenne 8,4 ETP/an
37% du budget - Taux de réalisation 77%

Prises de contacts, démarchage, informations
sensibilisation, communication

Formalisation des accompagnements de
propriétaires – préparation de travaux

1 100 rencontres techniques avec des riverains dont

- 125 propriétaires/exploitants forestiers
- 100 propriétaires/exploitants de zones humides
- 350 agriculteurs
- 81 propriétaires d'ouvrages / étangs

Opérations de communications = 10 000 pers. dont:

- 200 élèves (10 classes)
 - 550 personnes lors de 25 manifestations
- ➔ Via 40 supports différents

Le bilan de Sources en action 2011-2015 est dépassé

Zones humides :

- 63 adhérents au RGZH
- 109 visites conseils
- 143 ha contractualisés (RGZH) – 707 ha depuis 2011
- 90 ha en gestion foncière (25 exploitants agricoles) – 444 ha depuis 2011
- 55 ha de zones humides acquises
- 3 plans de gestion d'ensembles de milieux humides

Agriculture :

- 128 agriculteurs formés en groupe
- 15 agriculteurs formés en individuel
- 106 exploitations diagnostiquées (DIE)
- 7 dossiers « Infrastructures Agro-Ecologiques (AAP Région NA)

Continuité écologique :

- 81 diagnostics d'étangs
- 13 études de seuils
- 5 maîtrises d'œuvres en régie
- 23 propriétaires accompagnés (dont 6 AMO)

Autres études avant travaux :

- 295 diagnostics, stations de suivis, études de priorisation...

Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

Temps d'animation et outils méthodologiques pour la réalisation de travaux :



Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

Temps d'animation et outils méthodologiques pour la réalisation de travaux :

Gestion et préservation des zones humides :

Budget prévisionnel : 746 750 € - Ajusté à 627 250 € - Réalisé à 207 870 € (33%)

Phase 3 non démarrée : le taux de réalisation finale attendu est supérieur à 90 %

Entretien de Zones humides :

- Travaux sur 78 ha
- Pâturage sur 177 ha
- 1,1 km de clôtures mobiles



Restauration de Zones humides :

- Travaux sur 34 ha
- 2 ha de décapage
- Bucheronnage sur 16 ha
- 4,5 km de clôtures fixes
- 3,6 km de clôtures mobiles



Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

Temps d'animation et outils méthodologiques pour la réalisation de travaux :

Continuité écologique :

Budget prévisionnel : 1 498 740 € - Ajusté à 826 163 € - Réalisé à 571 446 € (69 %)

Aménagements d'ouvrages :

- 1 étang (10 ha)
- 1 contournement d'étang
- 1 passe à poissons
- 3 aménagements rustiques (routiers)



Suppressions d'ouvrages :

- 3 suppressions de « petits ouvrages »
- 1 étang supprimé (11 ha)
- 7 m de chutes supprimées



Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

Temps d'animation et outils méthodologiques pour la réalisation de travaux :

Restauration de cours d'eau :

Budget prévisionnel : 1 866 650 € - Ajusté à 1 304 220 € - Réalisé à 704 220 € (54 %)

Phase 3 peu avancée : le taux de réalisation final attendu est supérieur à 65 %

Opérations agricoles :

- 35 km de mise en défens de berges
- 106 abreuvoirs installés
- 40 franchissements de cours d'eau

Restaurations de lits mineurs :

- 0,13 km traités
- 4 tronçons de restauration de frayères



Forêts riveraines et ripisylves :

- 13 km d'entretien de ripisylves
- 38 km de restauration de ripisylves
- 0,2 km de plantations de berges
- 78 embâcles retirés / 4 stations linéaires
- 7 ha de forêts riveraines restaurées (dérésinement)

Traitement de stations de renouée :

- 0,5 ha
- 3 stations ponctuelles

Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

Les éléments d'évaluations (complémentaires aux réseaux DCE)



Opérations de suivis scientifiques :

Budget prévisionnel : 369 640 € - Ajusté à 319 790 € - Réalisé à 127540 € (40 %)

→ Opérations en cours : le taux de réalisation finale attendu est d'environ 55 % (40 000 € de suivis de zones humides en attente de solde)

→ Opérations annulées / reportées : Suivis piscicoles en raisons des arrêts sécheresses 2018 et 2019

- Suivis faunes (loutre, campagnol amphibie, amphibiens, oiseaux) : 270 stations – 15 km de prospections
- 13 stations piscicoles (sur 30 annuelles prévues)
- 5 suivis physico-chimiques (Label Rivières Sauvages)
- 28 Stations hydrogéomorphologiques

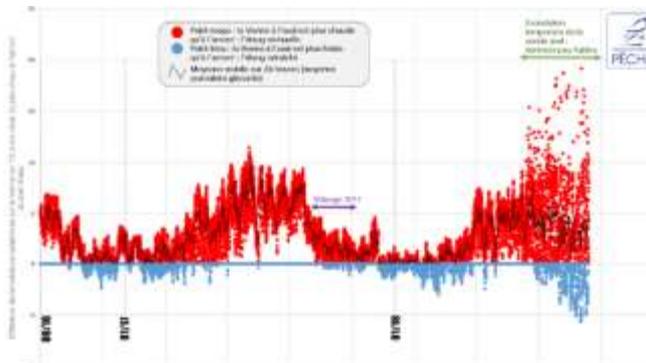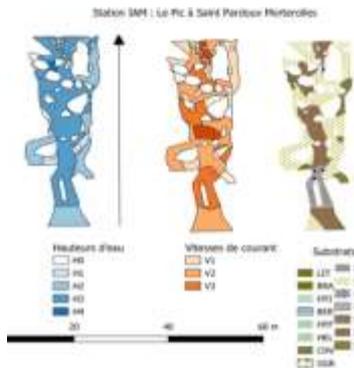

Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours (Phase 1 à 3)

Légende

□ Périmètre CTVA2

Référentiels hydrographiques

— Cours d'eau

Effort ME € P1 P3

0 - 299

299 - 5664

5664 - 11249

11249 - 17140

17140 - 19428

19428 - 22629

22629 - 33863

33863 - 37988

37988 - 67072

67072 - 491622

□ Masses Eau CTVA2

0 5 10 15 km




OSCTMA-2020

SIG-PNR Millevalches - 01.2020

Données MO CTVA2

+ 2 millions d'€ « toutes masses d'eau »

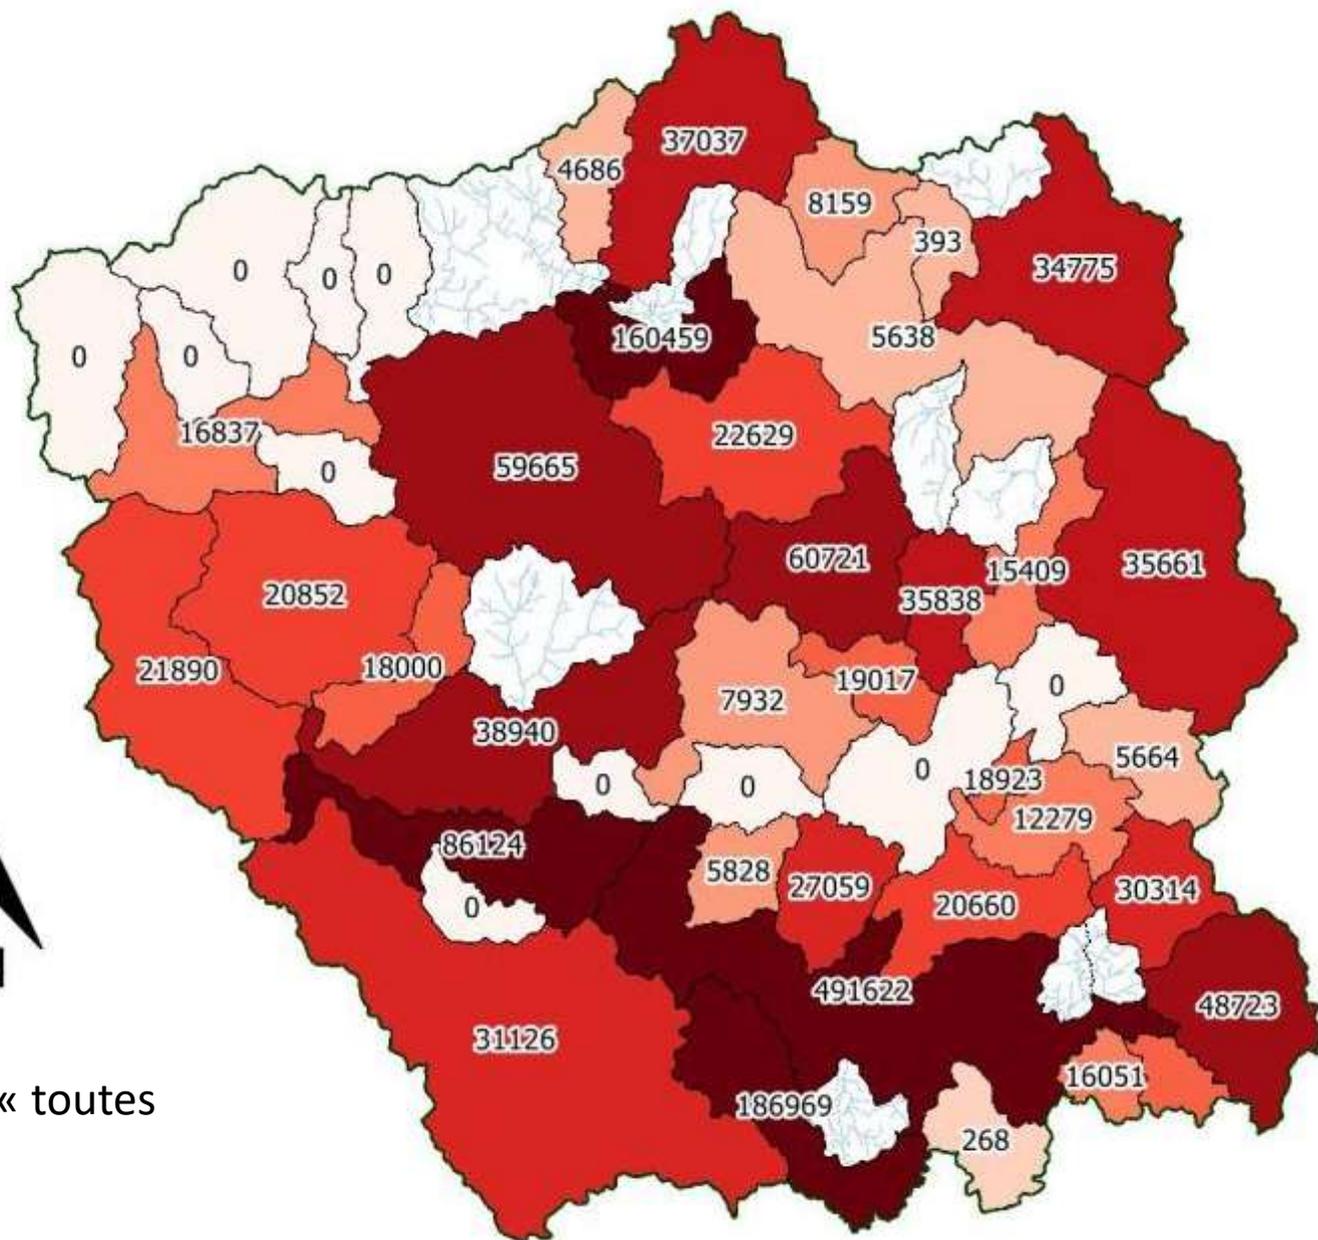


Phase 1




Phase 2




Phase 3

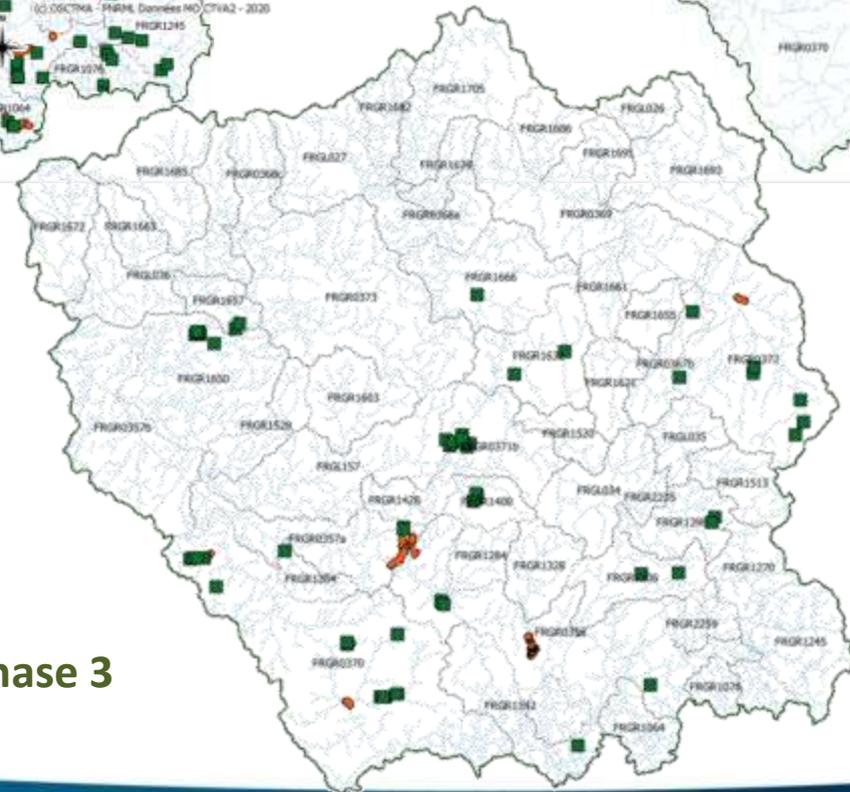

Etat d'avancement des actions réalisées ou en cours

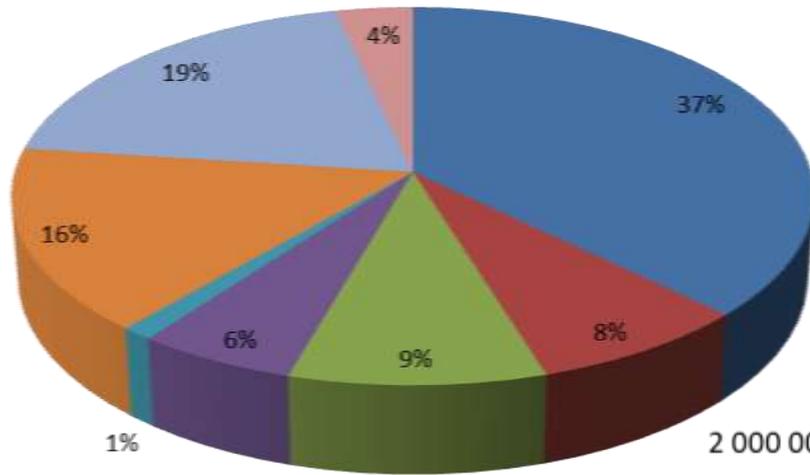


- Animation et coordination du programme
- Information, sensibilisation et communication
- Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques
- Restauration de la continuité écologique
- Etudes complémentaires ou préalables à de actions
- Restauration et entretien des cours d'eau
- Suivis scientifiques
- Gestion et préservation des zones humides

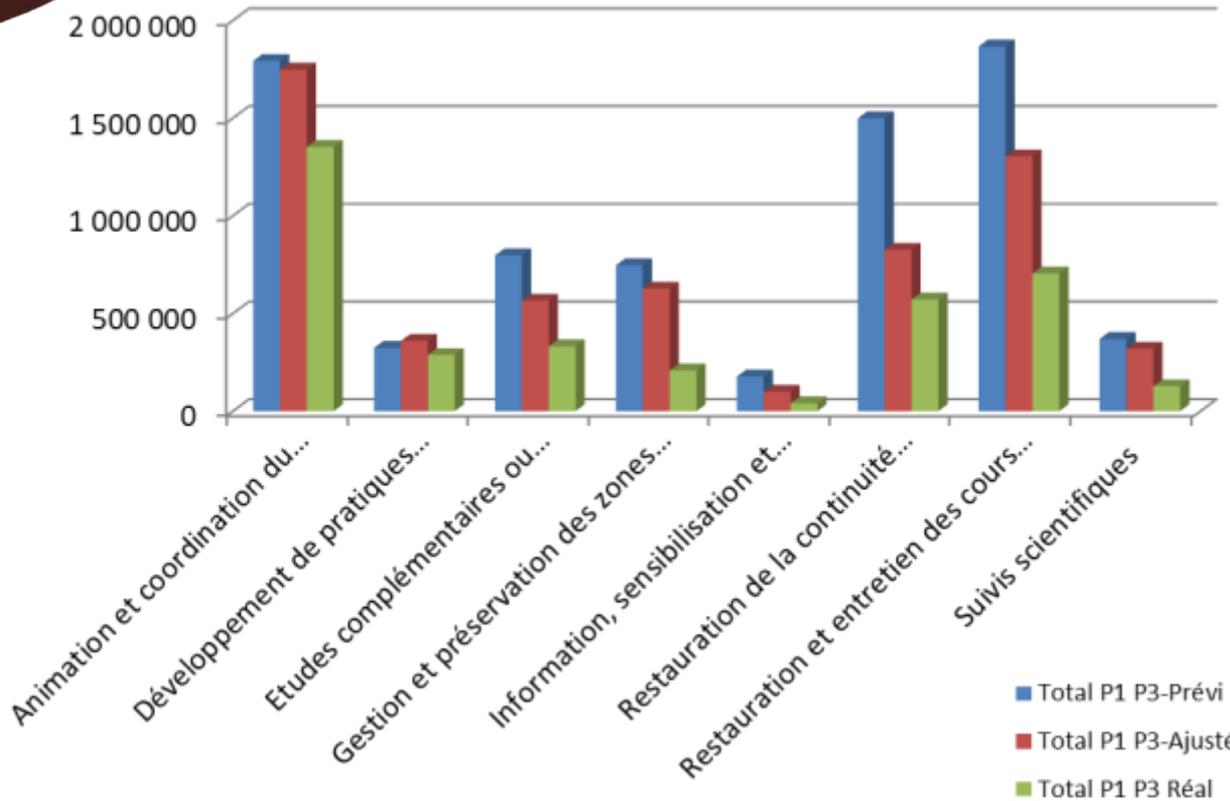

Montant prévisionnel : 7 572 000 €
 Montant « Ajusté » : 5 849 000 € (77 %)
 Montant « Réalisé » : 3 623 000 € (62 %)


Bilan financier global

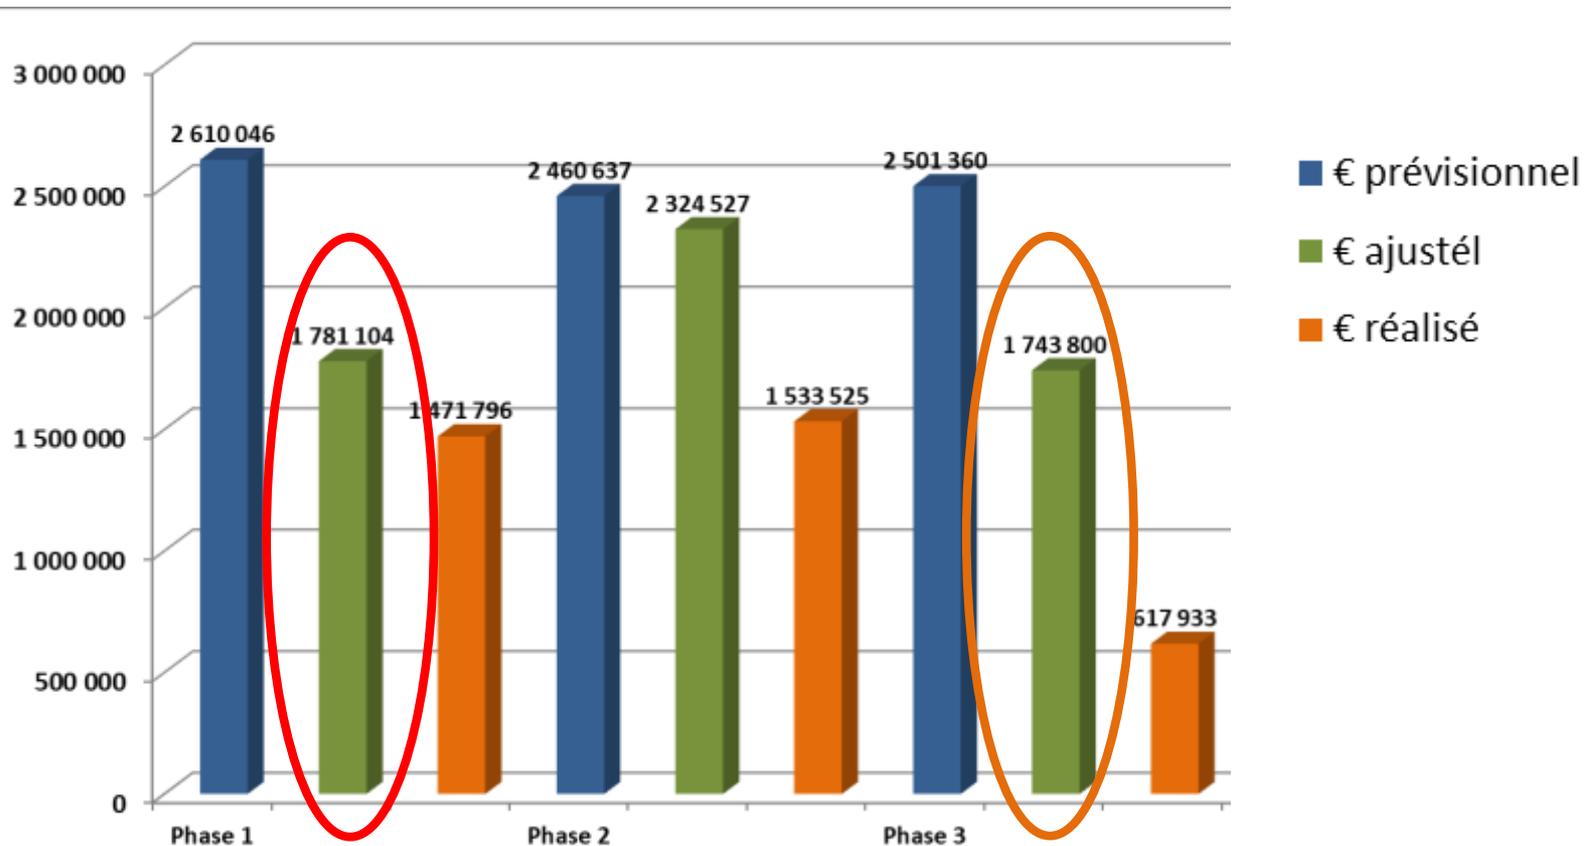

Validation du
Contrat en juin
2017 – démarrage
opérationnel en
septembre 2017

XI^{ème} programme +
Règlement
d'intervention
Région +
Réorganisation
GEMAPI

Bilan financier global

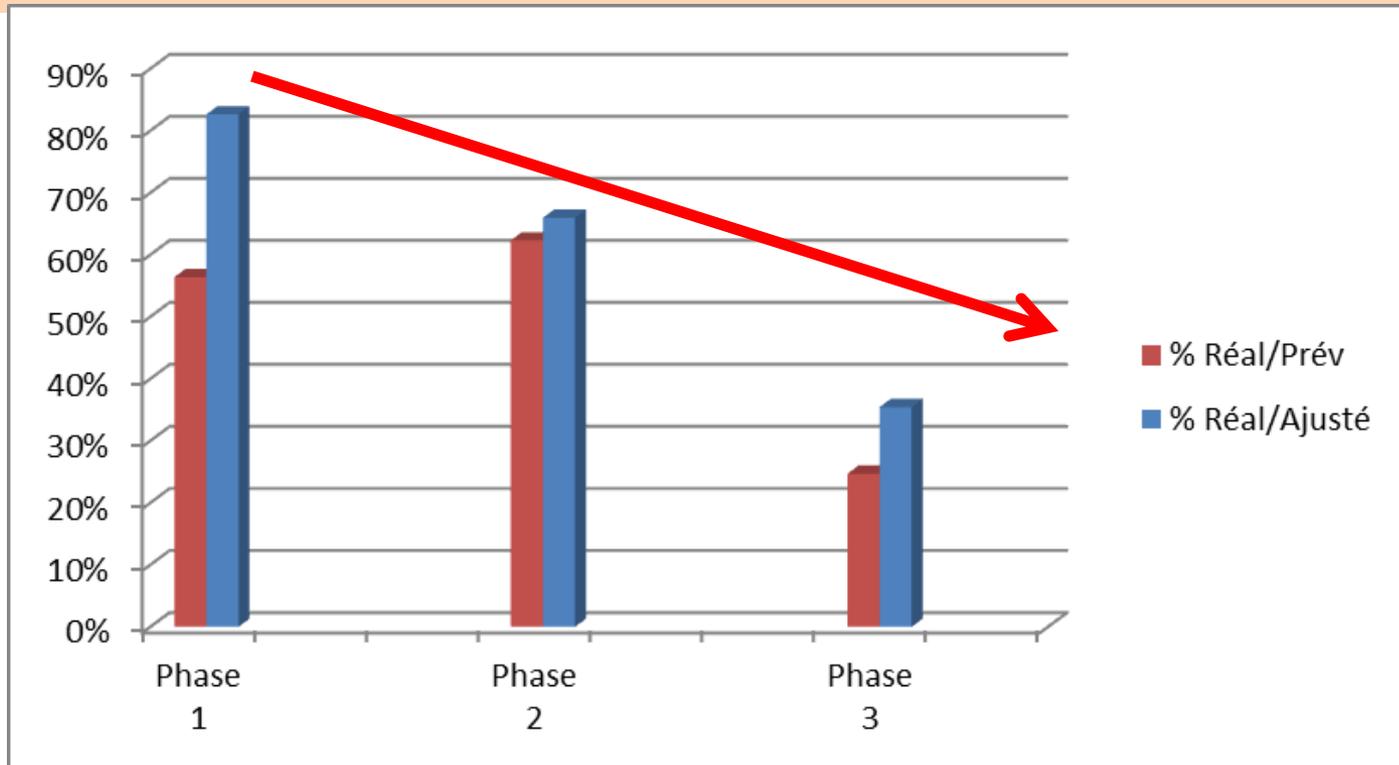

Règle du contrat : 2 ans pour mettre en œuvre les opérations sollicitées en financement

➔ Phase 1 Terminée

➔ Phase 2 en cours d'achèvement avec 150 000 € en attente de solde soit un taux de réalisation prévu à terme de 72% du prévisionnel

➔ Phase 3 : en cours de réalisation


Un décalage de 1,5 à 2 ans entre la demande de financement et la réalisation est constaté
(retard au démarrage en phase 1 – difficultés de trésorerie pour les maîtres d'ouvrage dépendant de financements européens – réorganisations et adaptations GEMAPI)

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade




Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade

Éléments de diagnostics

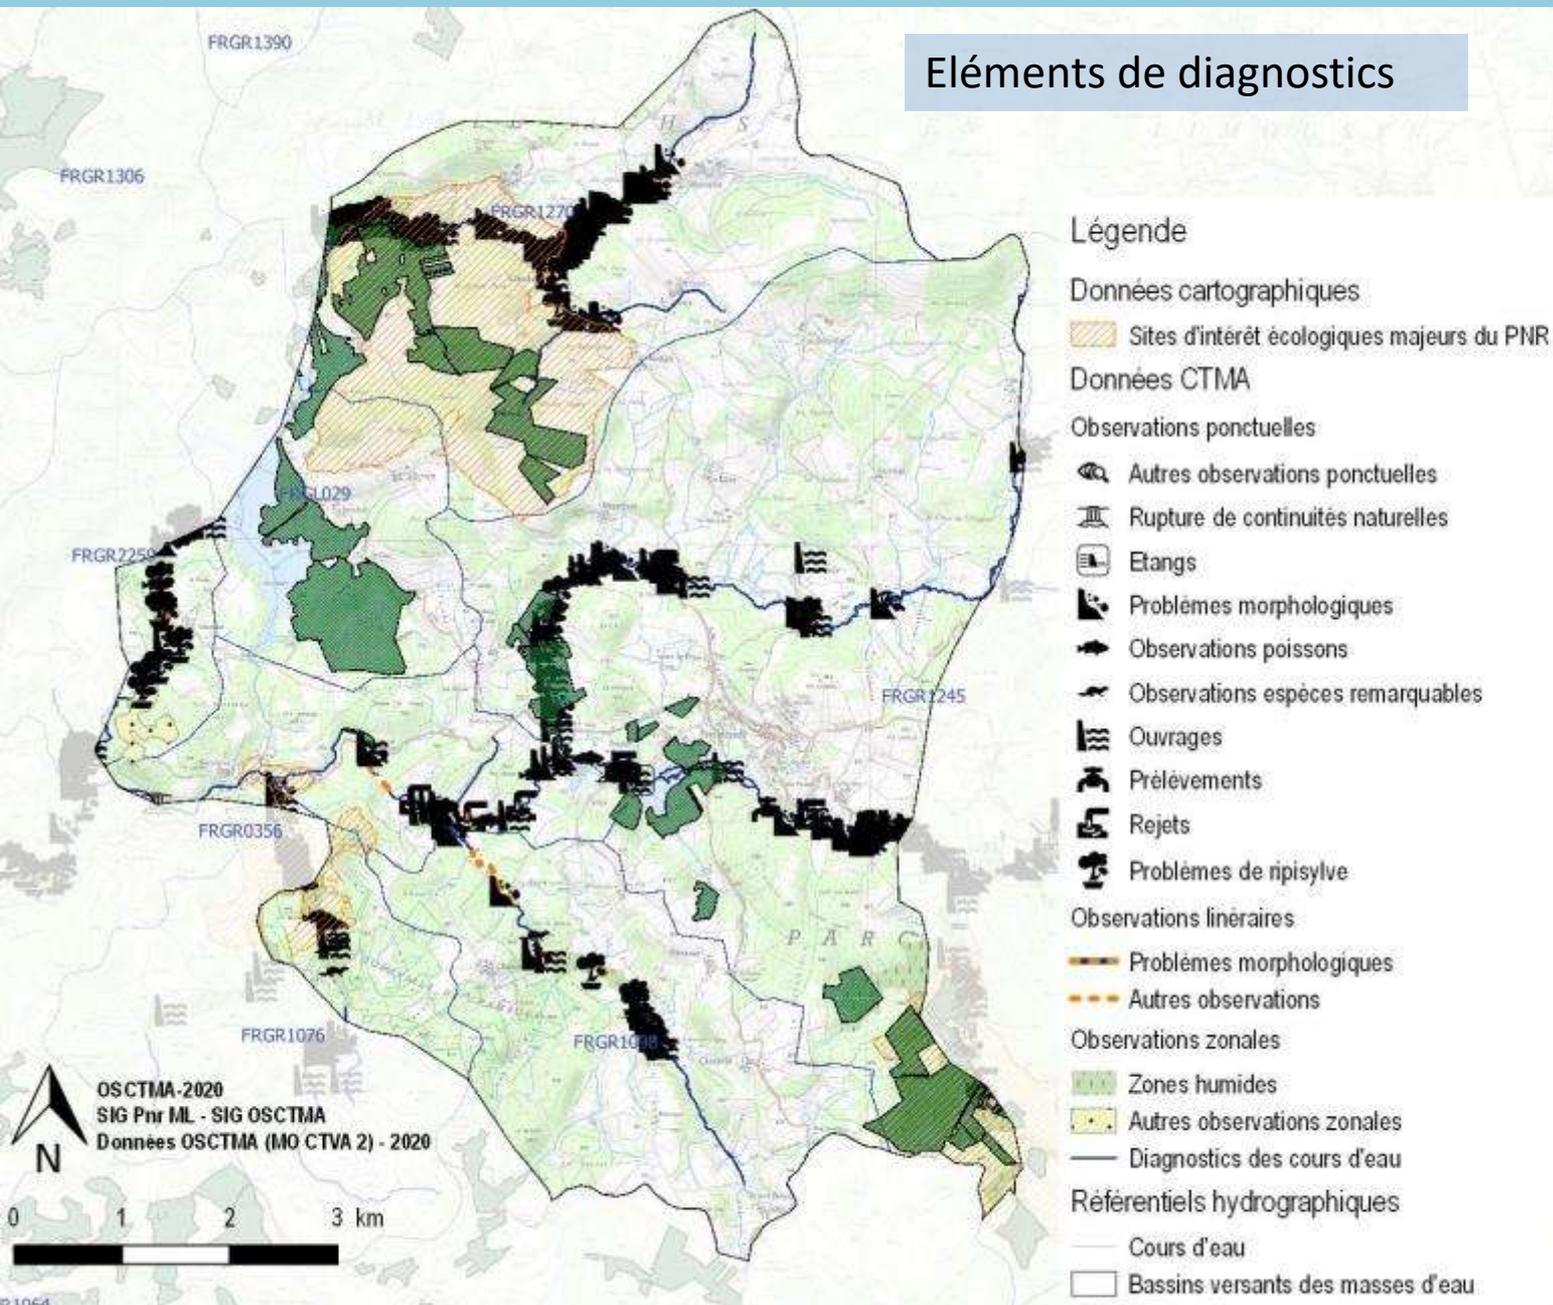

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade

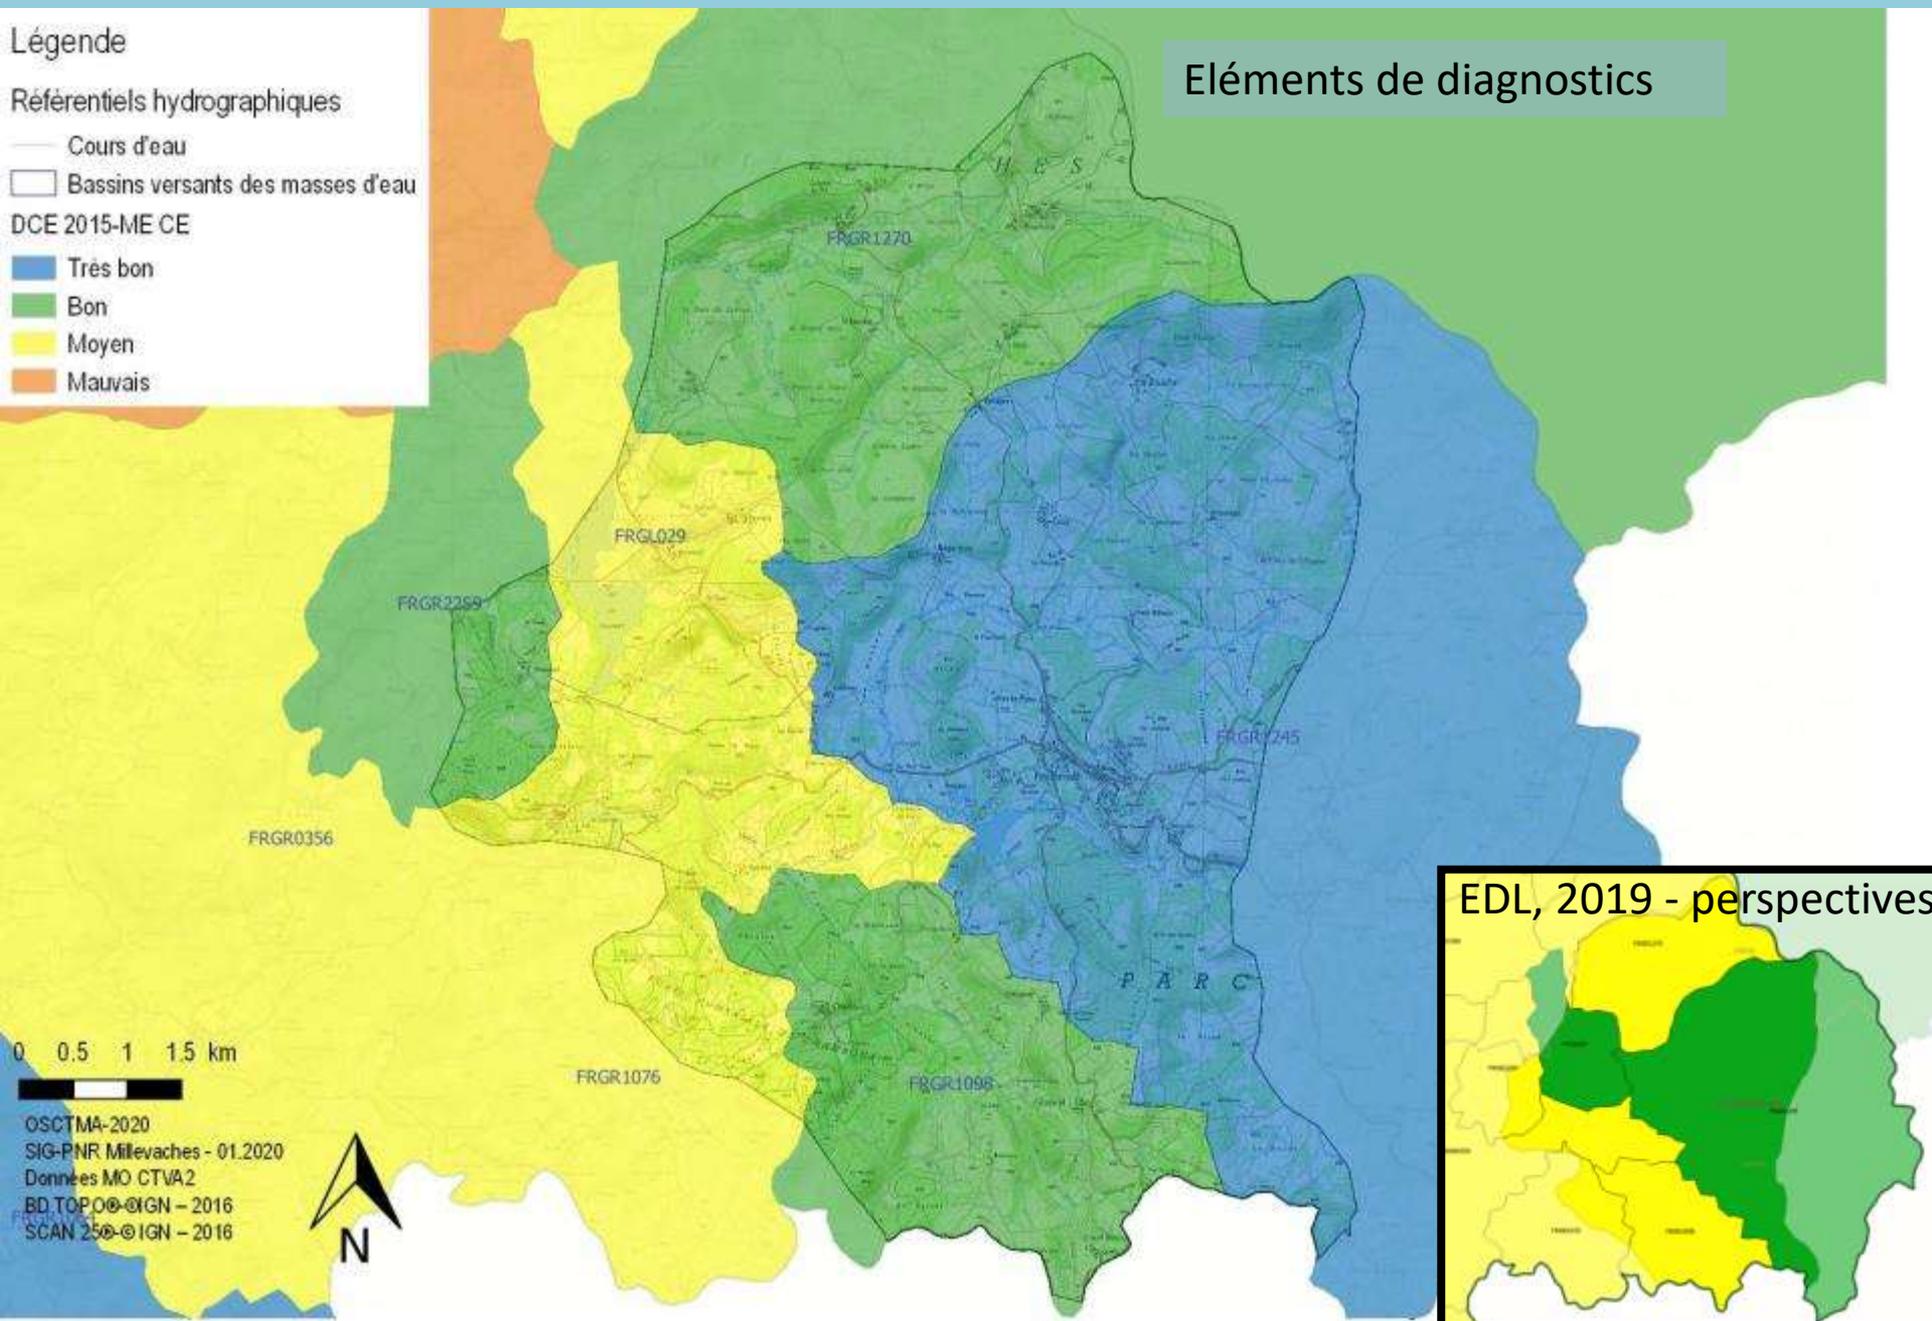

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade

Programmation prévisionnelle 2017-2022

Légende

Référentiels hydrographiques


- Cours d'eau
- Bassins versants des masses d'eau

OPE PCT-Peyrelevade

- CCHCC
- CENL
- FD19
- ONF
- Peyrelevade
- PNRML

OPE LIN-Peyrelevade

- CCHCC
- CCV2M

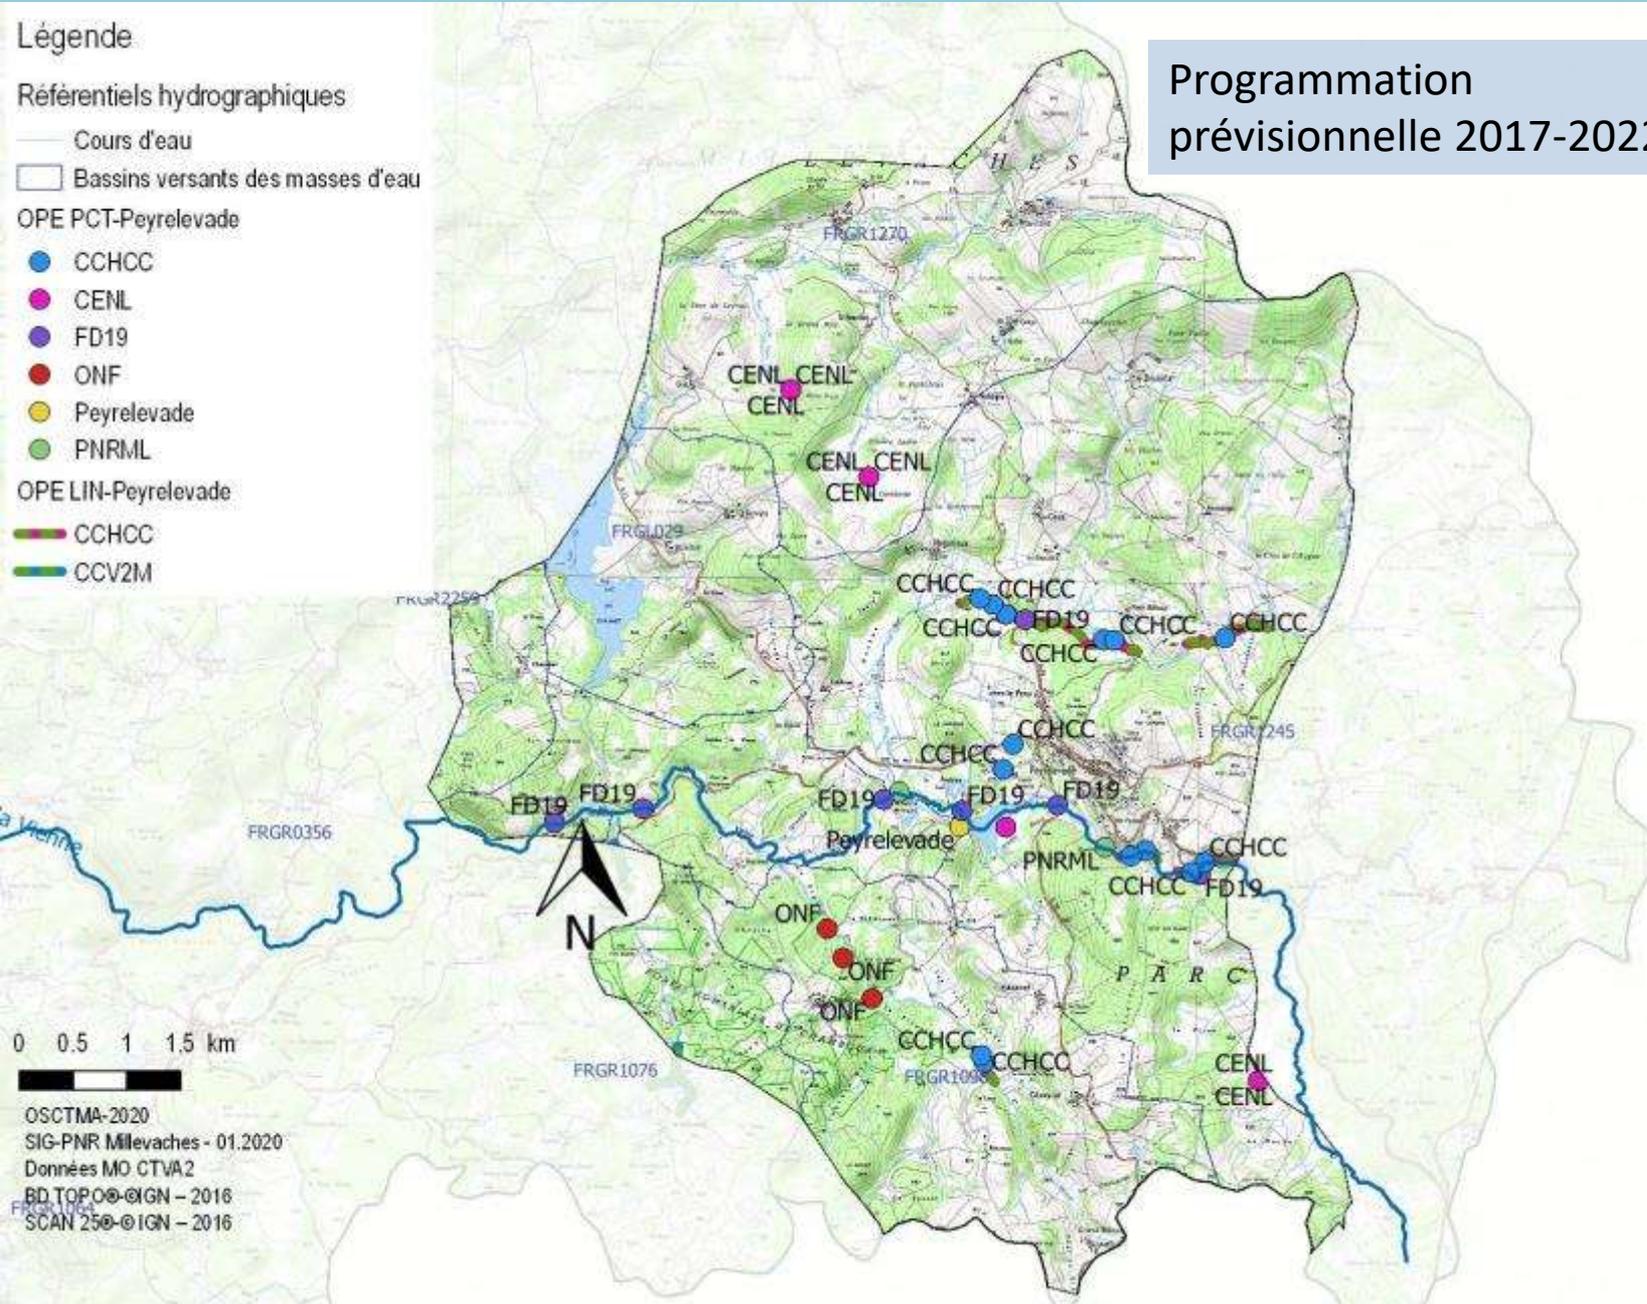

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade

Légende


Référentiels hydrographiques

- Cours d'eau
- Bassins versants des masses d'eau

OPE PCT-Peyrelevade

- 100 - 1 500
- 1 500 - 2 000
- 2 000 - 8 800
- 8 800 - 12 750
- 12 750 - 350 000

Prévisionnel financier
2017-2022

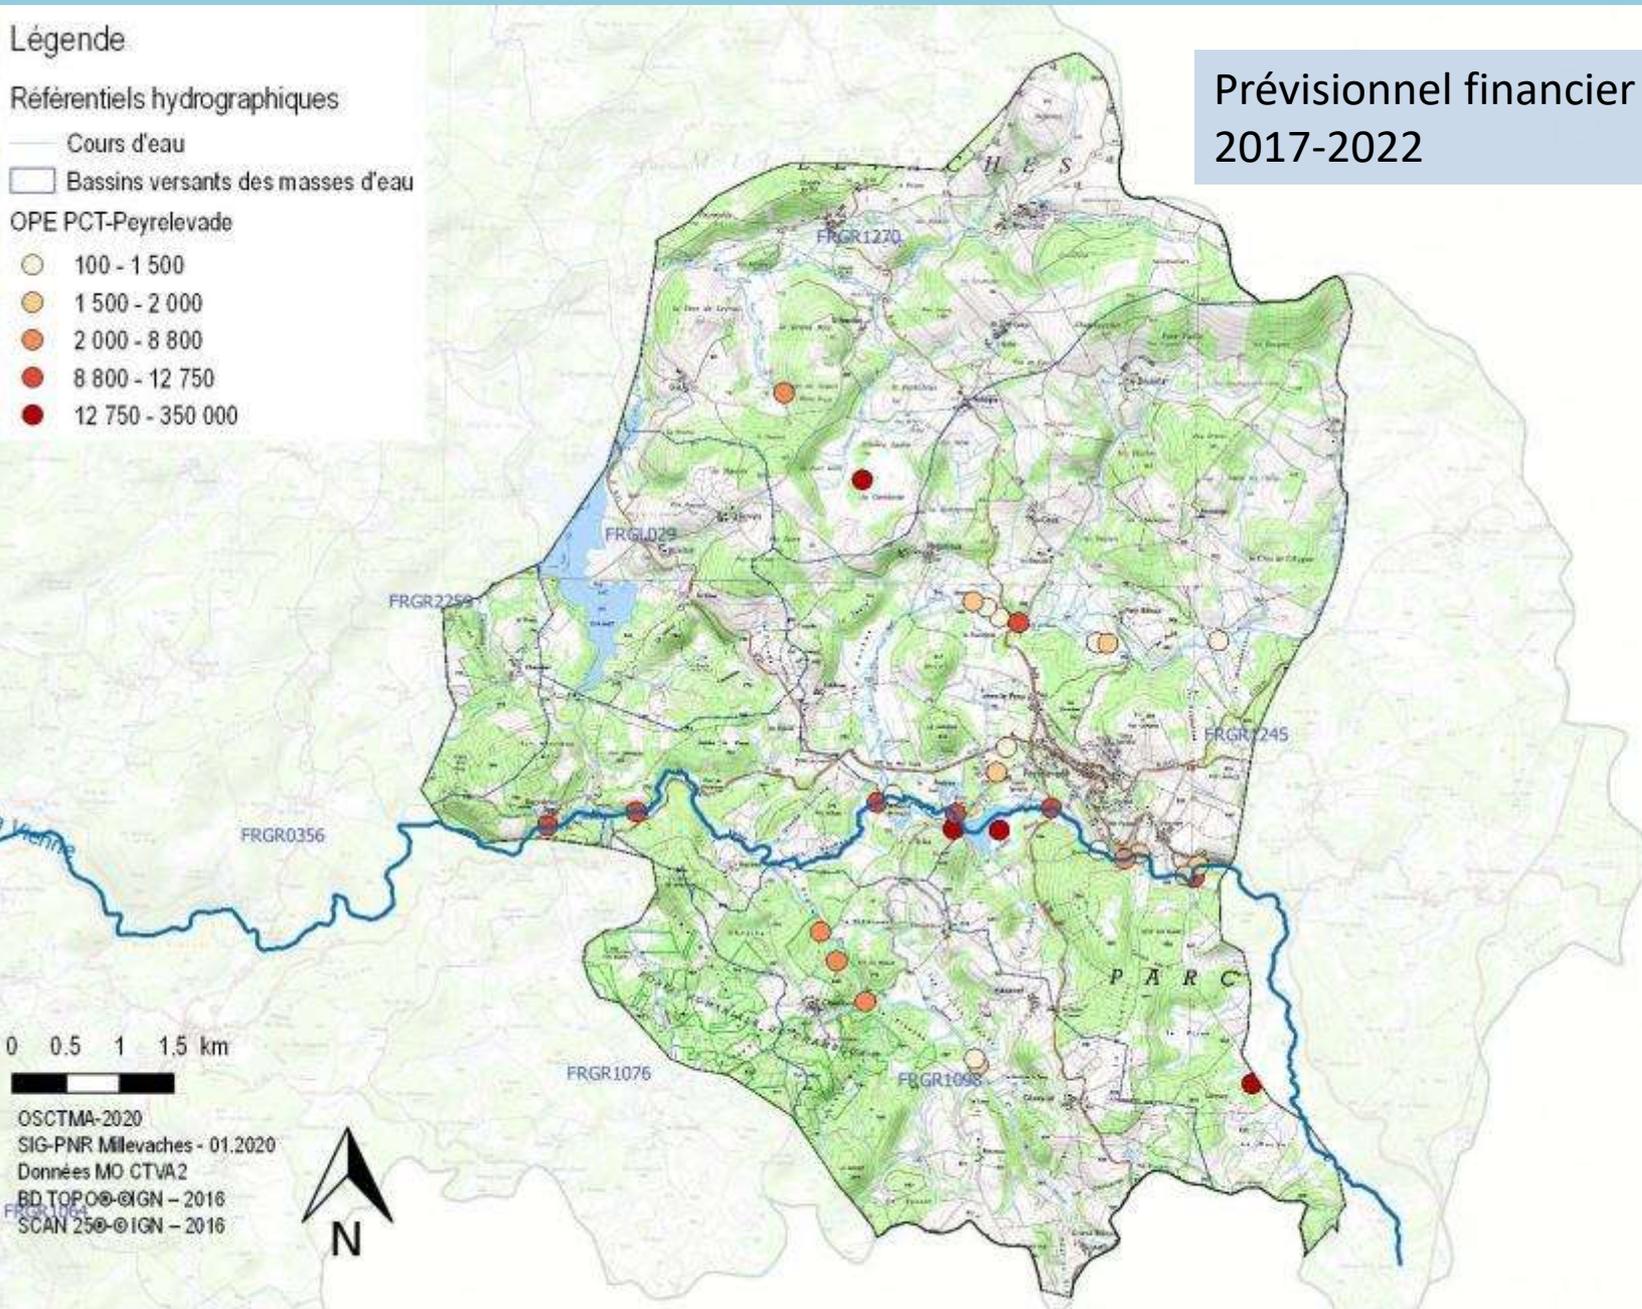

0 0.5 1 1.5 km

OSCTMA-2020
SIG-PNR Millevalches - 01.2020
Données MO CTVA2
BD TOPO © IGN - 2016
SCAN 250 © IGN - 2016



Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade

Légende

Référentiels hydrographiques


- Cours d'eau
- Bassins versants des masses d'eau

OPE PCT-Peyrelevade

- Phase 1
- Phase 2

Code Action	Action Prévisionnelle
CONT01	Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage)
GEZH02	Travaux de restauration de zones humides
GEZH03	Travaux de gestion (entretien) des zones humides
REST10	Travaux forestier
SUIV01	Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.)

Réalisations techniques
2017-2019

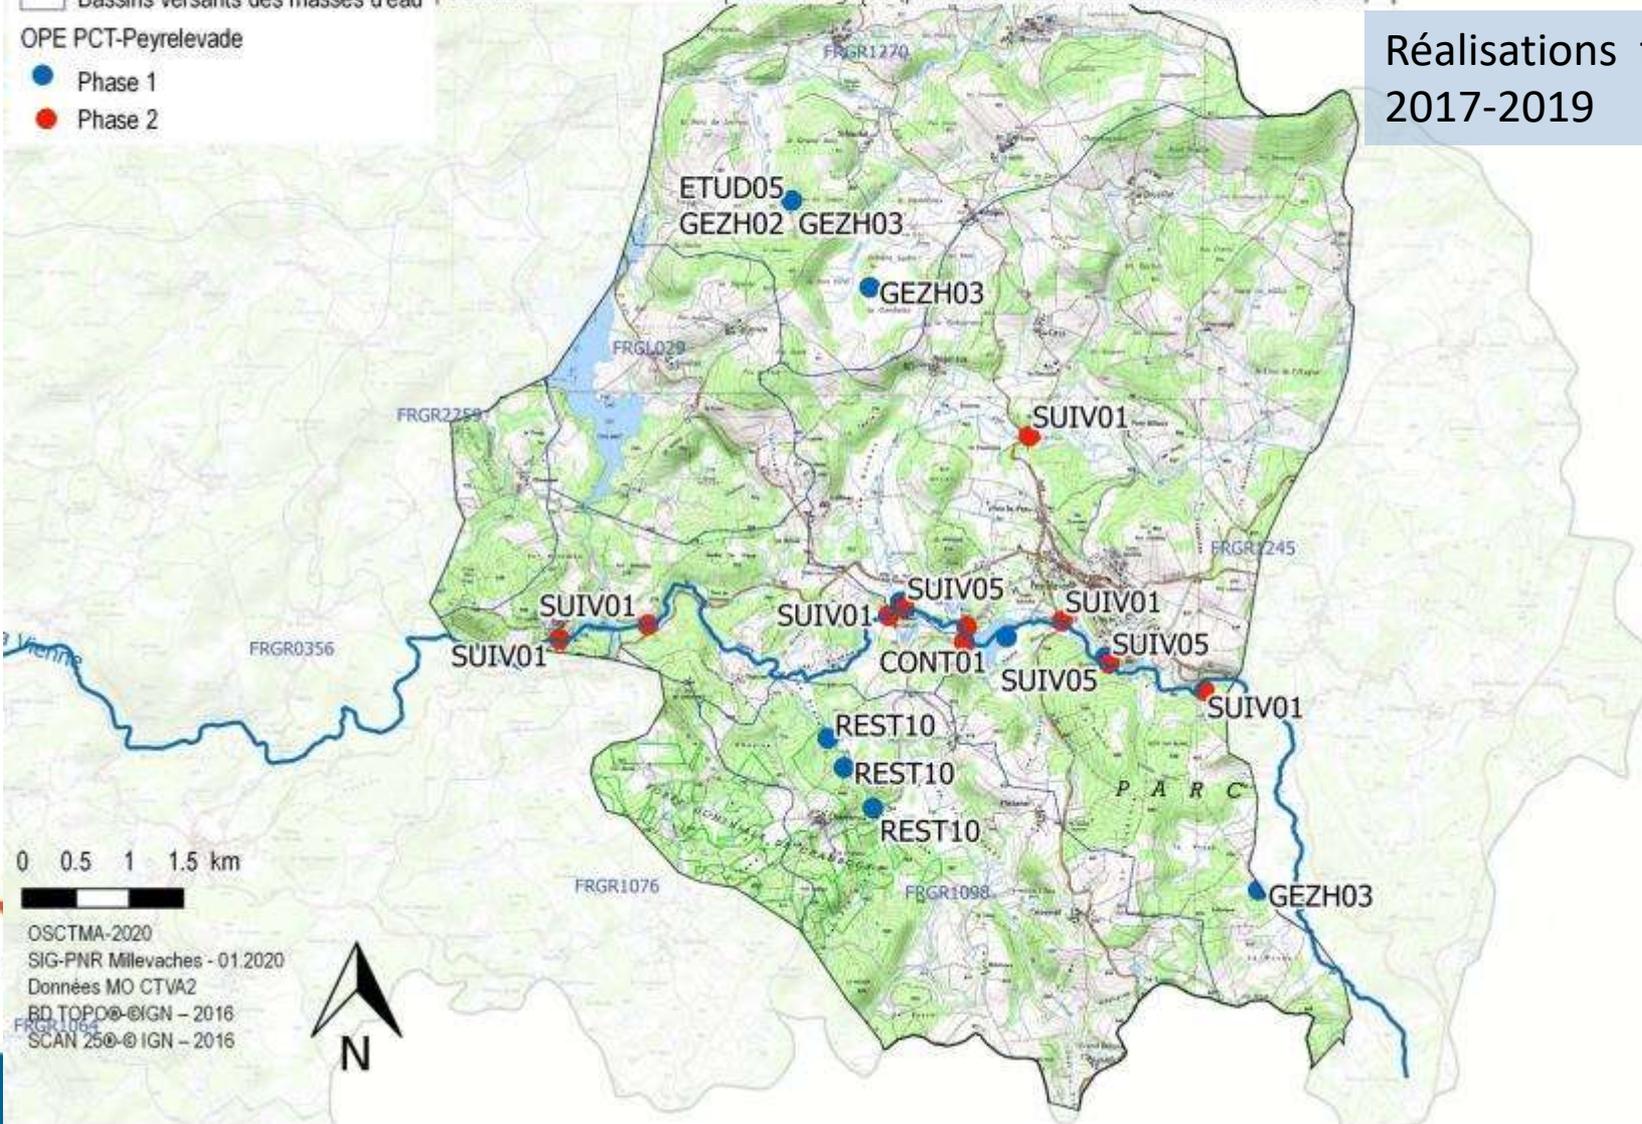

OSCTMA-2020
SIG-PNR Millevaches - 01.2020
Données MO CVA2
BD TOPO © IGN - 2016
SCAN 250 © IGN - 2016

Focus de réalisations sur la commune de Peyrelevade

Opération	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total réalisé
CONT01 - 26/09/2016 14:49:22 - CTVA_INI - Peyrelevade - FRGR0356	350 000	373 568	373 568
ETUD05 - 05/10/2016 11:48:15 - CTVA_INI - CENL - FRGR1270	16 000	15 876	15 876
ETUD05 - 05/10/2016 11:51:33 - CTVA_INI - CENL - FRGR1098	15 000	15 381	15 381
GEZH02 - 05/10/2016 14:21:10 - CTVA_INI - CENL - FRGR1245	45 000	74 802	24 909
GEZH03 - 05/10/2016 16:22:48 - CTVA_INI - CENL - FRGR1270	8 200	8 184	4 042
GEZH03 - 05/10/2016 16:28:25 - CTVA_INI - CENL - FRGR1245	8 000	8 884	3 940
REST10 - 19/10/2016 13:36:08 - CTVA_INI - ONF - FRGR1098	21 600	2 061	2 061
SUIV01 - 13/10/2016 12:24:33 - CTVA_INI - FD19 - TTE_ME	20 150	20 150	16 156
SUIV05 - 16/09/2016 16:25:54 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME	4 000	4 000	3 175
SUIV05 - 16/09/2016 16:25:54 - CTVA_INI - PNRML - TTE_ME	4 000	4 000	3 175
total	491 950	526 906	462 282
Taux de réalisation / Prévisionnel	94%		
Taux de réalisation / Ajusté	88%		

Bilan hors opérations « Toutes masses d'eau » : Animation – Etude globale – Communication (...)



Éléments sur la démarche d'avenant au contrat

- Intégration de la Région au contrat Sources en action. Actée sur le principe en plénière de la Région le 16 décembre 2019
 - ➔ Les modalités de l'avenant sont en cours de formalisation
- Intégration de l'EPAGE de la Vienne médiane au contrat Sources en action
 - ➔ 25^{ème} maître d'ouvrage du contrat – pas de nouvelles actions de terrain autres que celles prévues par le PETR – Ajout de 0,8 ETP Technicien rivière

Dans un second temps à prévoir :


- Bonification de 10% de l'Agence de l'eau sur les thématiques « Animation » et « Communication / sensibilisation ».
 - ➔ Avenant dépendant de l'établissement d'une convention Agences/Région/DREAL.
 - ➔ Les modalités de l'avenant sont à préciser



Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Préambule : Intégration de l'EPAGE

- Modification des territoires administratifs

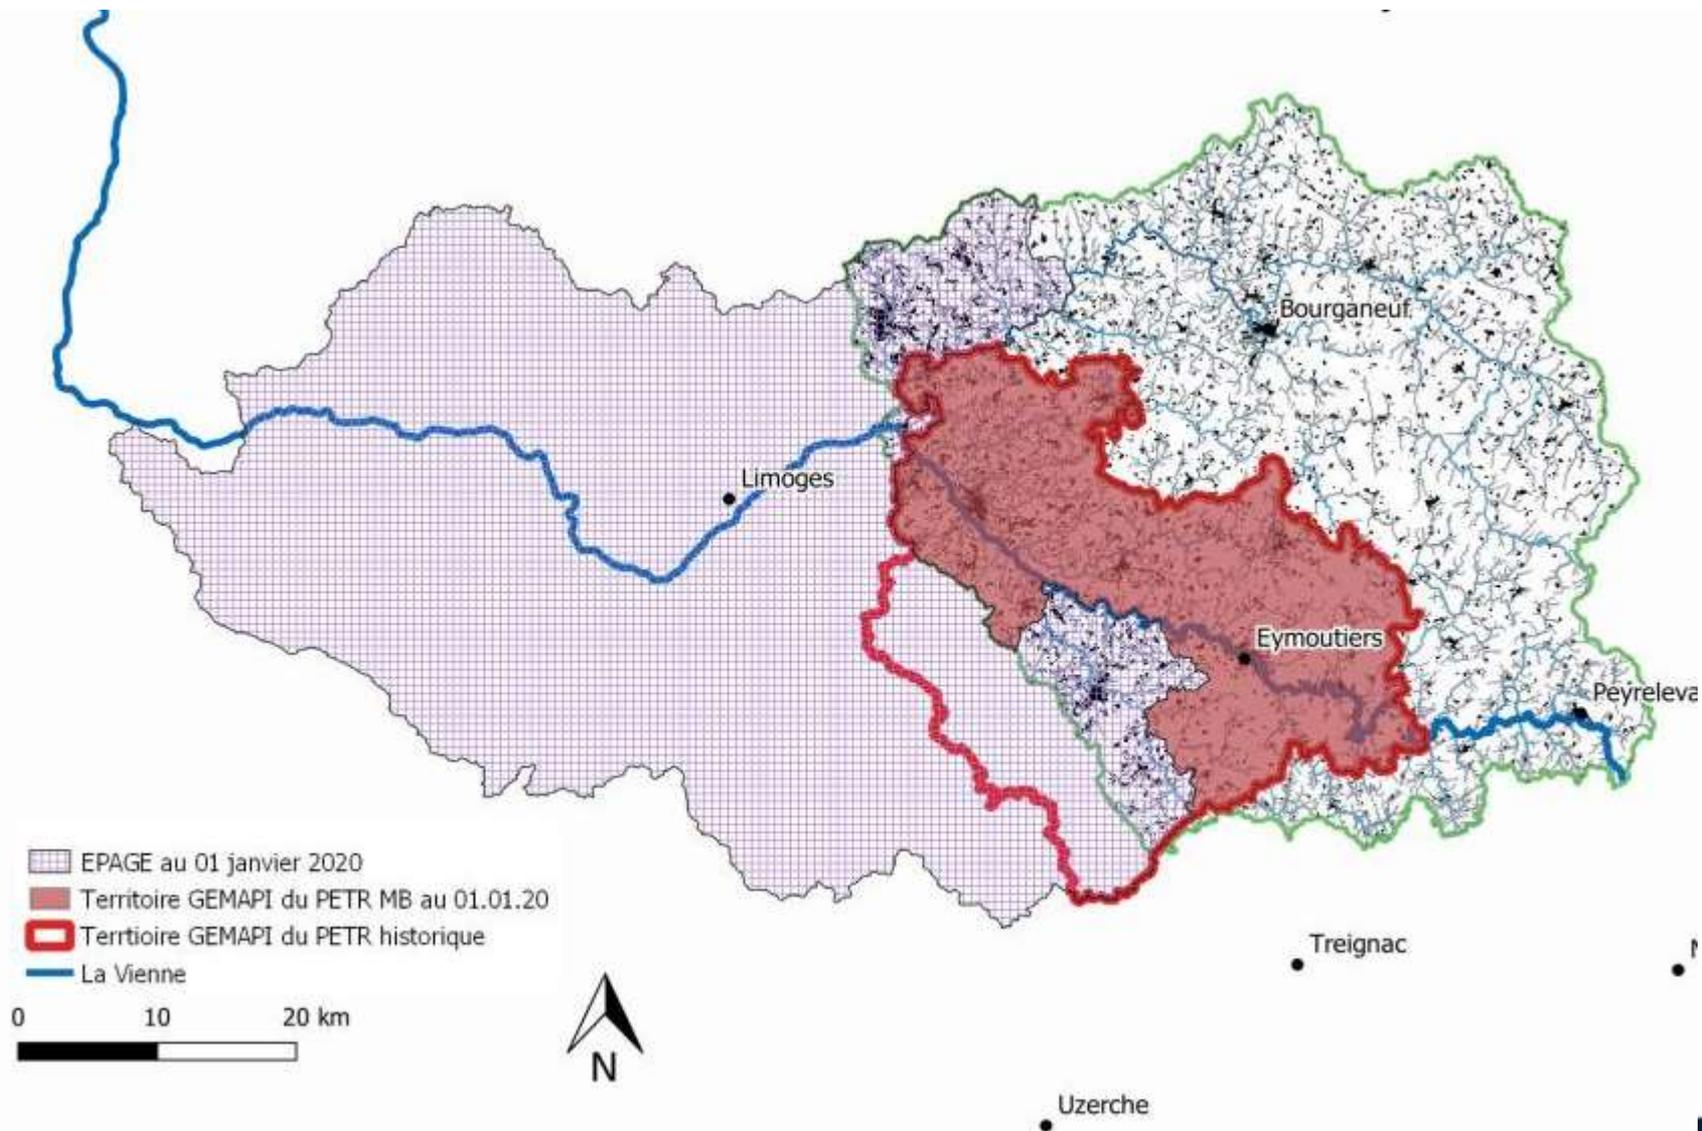

Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Préambule : Intégration de l'EPAGE Evolution des programmations

Aucune programmation EPAGE
Diagnostics en cours pour une future
intervention



Réattribution du programme du PETR
à l'EPAGE

Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Préambule : Intégration de l'EPAGE Evolution des programmations

Phase	Thème prévisionnel	Masse d'eau	Action Prévisionnelle	Unité	Montants prévisionnels PETR	Montants ajustés EPAGE	Quantité
Phase 3	Restauration de la continuité écologique	FRGR0370	Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage)	nbre	5 000	5 000	1
		FRGR0370			5 000	5 000	1
		FRGR1264	Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage)	nbre	50 000	50 000	1
	Restauration et entretien des cours d'eau	FRGR1264	Restauration du lit mineur et diversification des écoulements	ml	15 000	15 000	400
	Suivis scientifiques	FRGR1264	Autre suivi milieux aquatiques	stations	5 500	5 500	2
Total Phase 3					80 500	80 500	
Phase 4	Restauration de la continuité écologique	FRGR0370	Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	nbre	4 000	4 000	1
		FRGR0370	Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	nbre	2 000	2 000	1
	Restauration et entretien des cours d'eau	FRGR0370	Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles	ml	31 383	24 996	8966
		FRGR1264	Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail	nbre	2 100	2 100	3
			Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau	nbre	5 000	5 000	2
	Suivis scientifiques	FRGR1264	Autre suivi milieux aquatiques	stations	2 750	2 750	2
Total Phase 4					47 233	40 846	
Phase 5	Restauration de la continuité écologique	FRGR0370	Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	nbre	4 000	4 000	1
		FRGR0370	Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	nbre	25 000	25 000	1
	Restauration et entretien des cours d'eau	FRGR1264	Aménagement agricole pour la mise en défens des berges	ml	1 400	1 400	700
		FRGR1264	Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail	nbre	2 100	2 100	3
		FRGR1264	Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau	nbre	2 500	2 500	1
Total Phase 5					35 000	35 000	
Total général					162 733	156 346	

Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Préambule : Intégration de l'EPAGE Evolution des programmations

- Report automatique de la programmation du PETR Monts et Barrages sur l'EPAGE, dont une partie de la programmation de la Phase 3 (2019)
- Report automatique des budgets de la phase 3 sur la phase 4 (2020) pour l'EPAGE
- Création de 0,8 ETP Technicien Rivière pour l'EPAGE (40 000 €)
- ➔ Le volume financier contractualisé pour l'animation sur 2017-2022 n'est pas modifié
 - 9,3 ETP annuels contractuellement prévus sur 2017-2022
 - 8,4 ETP réalisés sur 2017-2019



Eléments sur la démarche d'avenant au contrat

- Intégration de la Région au contrat Sources en action. Actée sur le principe en plénière de la Région le 16 décembre 2019
 - ➔ Les modalités de l'avenant sont en cours de formalisation

- Intégration de l'EPAGE de la Vienne médiane au contrat Sources en action
 - ➔ 25^{ème} maître d'ouvrage du contrat – pas de nouvelles actions de terrain autres que celles prévues par le PETR – Ajout de 0,8 ETP Technicien rivière

Dans un second temps à prévoir :

- Bonification de 10% de l'Agence de l'eau sur les thématiques « Animation » et « Communication / sensibilisation ».
 - ➔ Avenant dépendant de l'établissement d'une convention Agences/Région/DREAL.
 - ➔ Les modalités de l'avenant sont à préciser



Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Autres modifications de programmations :



: Décalage de réalisation. La phase 2 a été reportée à la phase 3 et la phase 3 est sollicitée en report phase 4, hormis l'animation maintenue. Soit 45 000 € de restauration de cours d'eau et 15 000 € de suppression de plan d'eau.

➔ La programmation de la phase 4 sera sollicitée partiellement en report phase 5



: Report intégral de la phase 3 sur la phase 4 (10 290 €). Le budget phase 4 est porté à 18 138 €



: Budget d'acquisition de zones humides de la phase 3 et de la phase 4 reporté en phase 5 (soit 30 000 € portant le budget phase 5 à 90 000 €)



: Modification thématique des Accompagnements Individuels (4 800 €) en jours d'animation (10 jours) pour 2020. Le budget animation passe de 38 400 € à 43 200 €.



: pour mémoire, 194 000 € de travaux continuité ont été avancés de la phase 4 à la phase 3 (Etang de Tarnac) sur un budget initial de 300 000 €. 100 000 € sont maintenus en phase 4.

Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Autres modifications de programmations :



: Report des budgets associés aux pêches électriques de la phase 3 – reportés en phase 4 (phase 4 reportées en phase 5)

45 000 € pour la FD87

13 585 € pour la MEP 19

20 150 € pour la FD 19



Validation de la programmation 2020 (phase 4)

2370 jours d'animation soit environ 11 ETP

Montant prévisionnel : 605 030 €

Montant « Ajusté » : 584 900 € (93 %)

Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques

- Accompagnement collectif = 143 jours
- Accompagnement individuel = Annulé
- Diagnostic Individuel d'Exploitation = 40 dossiers

Montant prévisionnel : 117 900 €

Montant « Ajusté » : 107 100 € (91 %)

Etudes complémentaires ou préalables à des actions

- 79 études continuité écologique
- 3 maîtrise d'œuvre en régie
- 3 plans de gestions Zones Humides
- 150 diagnostics préalables à des travaux

Montant prévisionnel : 226 380 €

Montant « Ajusté » : 184 157 € (81 %)



Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Gestion et préservation des zones humides

- Acquisition foncière = report
- Travaux d'entretien : 53 ha
- Travaux de restauration : 53 ha

Montant prévisionnel : 258 600 €

Montant « Ajusté » : 191 200 € (74 %)

Restauration de la continuité écologique

- 18 aménagements d'ouvrages
- 20 suppressions d'ouvrages
- 2 acquisitions pour suppression

Montant prévisionnel : 804 460 €

Montant « Ajusté » : 669 660 € (83 %)



Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Restauration et entretien des cours d'eau

- Mise en défens de berge : 16 km
- Abreuvement : 126 aménagements
- Franchissement : 33 aménagements
- Ripisylve : 53 km de restauration / entretien
- Lit mineur : 5,8 km de restauration + 2 ha

Montant prévisionnel : 558 570 €

Montant « Ajusté » : 592 270 € (106 %)

Information, sensibilisation et communication

- 13 classes (primaires)
- 10 journées grand public
- 14 outils de communication
- 1 évènementiel grand public

Montant prévisionnel : 64 300 €

Montant « Ajusté » : 64 620 € (85 %)



Suivis scientifiques

- 30 stations suivis piscicoles
- 105 points d'écoutes oiseaux
- 5 stations de suivis Zones humides
- 11 stations de suivis spécifiques (Label Rivières Sauvages...)

Montant prévisionnel : 117 925 €

Montant « Ajusté » : 145 975 € (123 % - report des budgets suivis piscicoles)



Validation de la programmation 2020 (phase 4)

Légende

□ Périmètre CTVA2

— Référentiels hydrographiques

— Cours d'eau

□ Masses Eau CTVA2

Effort ME € P4

□ 0 - 1000

□ 1000 - 6867

□ 6867 - 11898

□ 11898 - 12667

□ 12667 - 15555

□ 15555 - 20000

□ 20000 - 29375

□ 29375 - 34976

□ 34976 - 55000

□ 55000 - 68328

□ 68328 - 86557

□ 86557 - 266550


0 5 10 15 km




OSCTMA-2020

SIG-PNR Millevaches - 01.2020

Données MO CTVA2

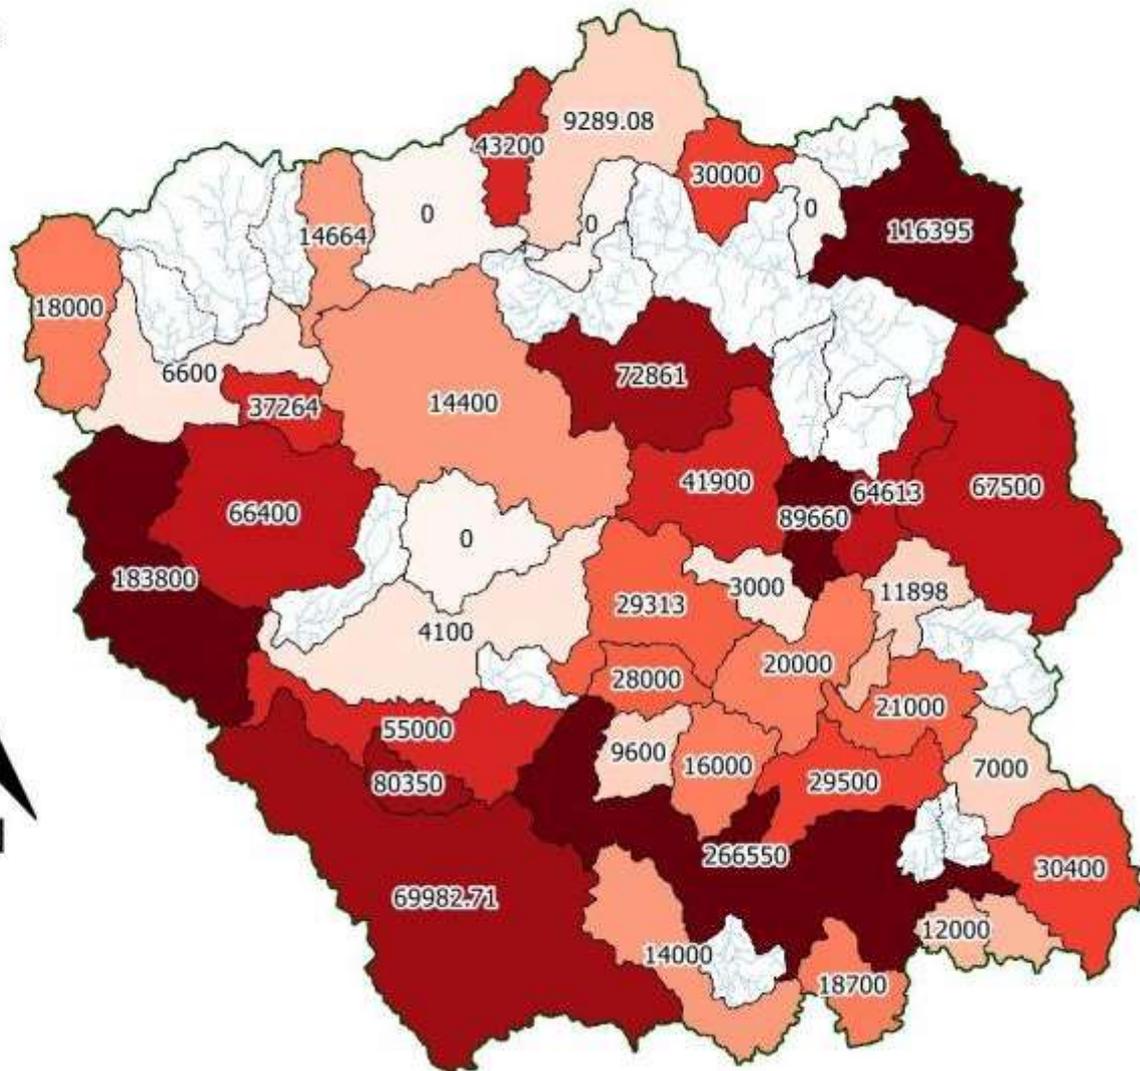

Validation de la programmation 2020 (phase 4)

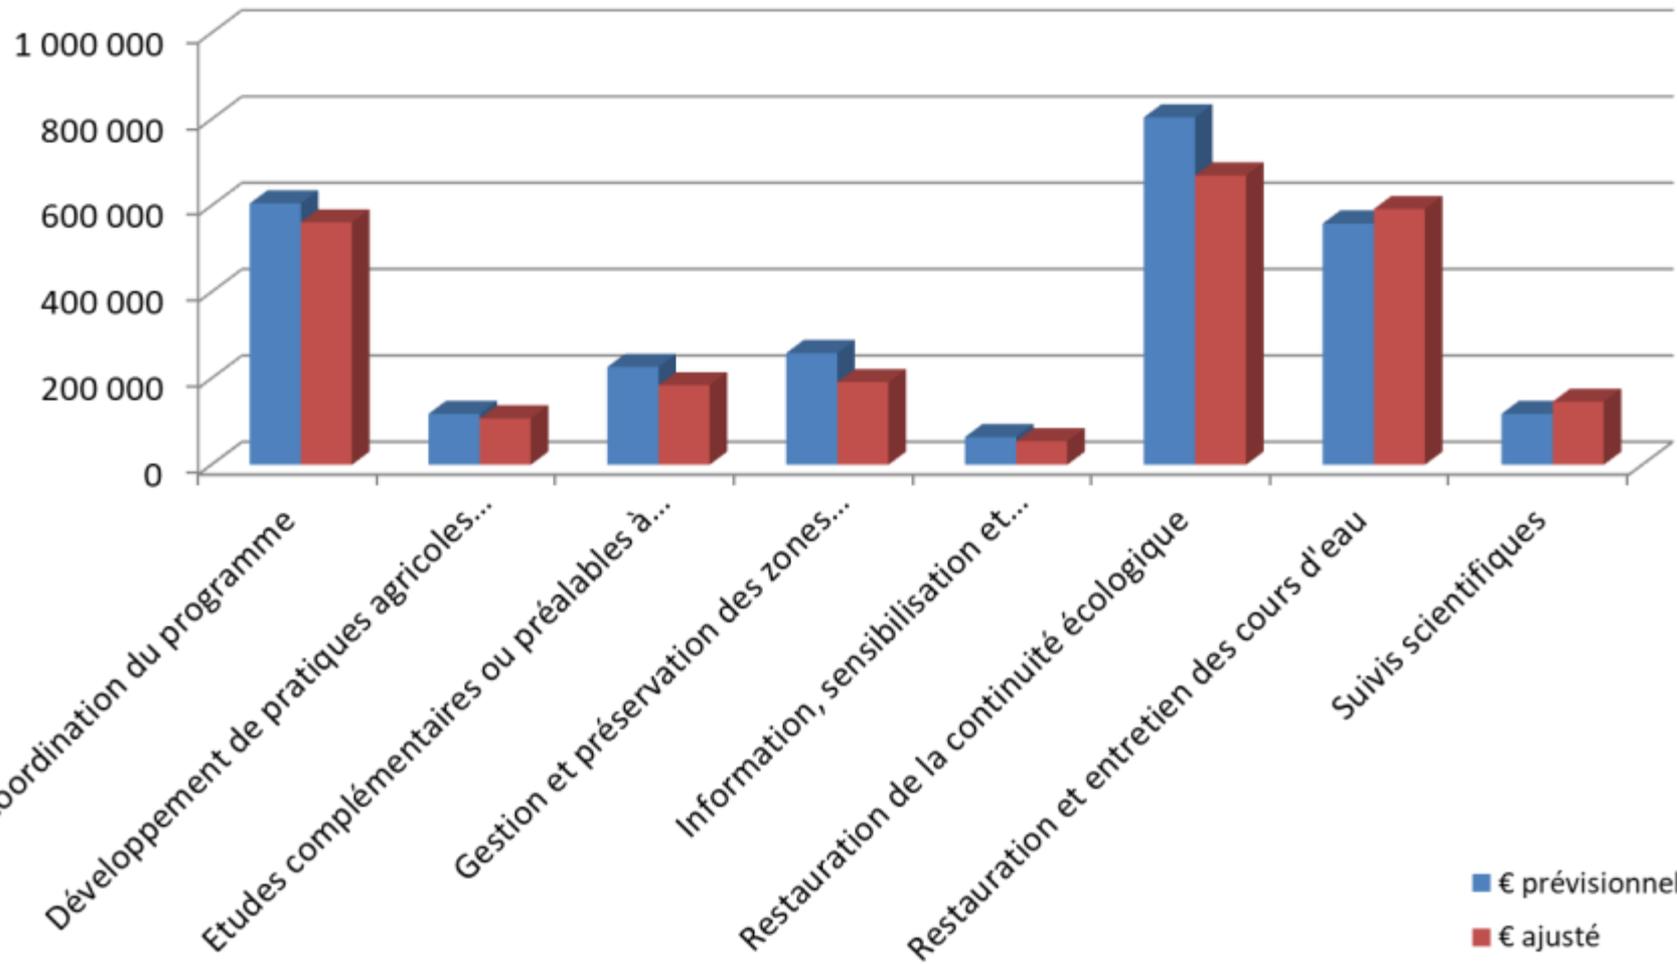


Montant prévisionnel : 2 753 178 €

Montant « Ajusté » : 2 506 385 € (91 %)

Calendrier prévisionnel 2020

➤ Les instances de gouvernance

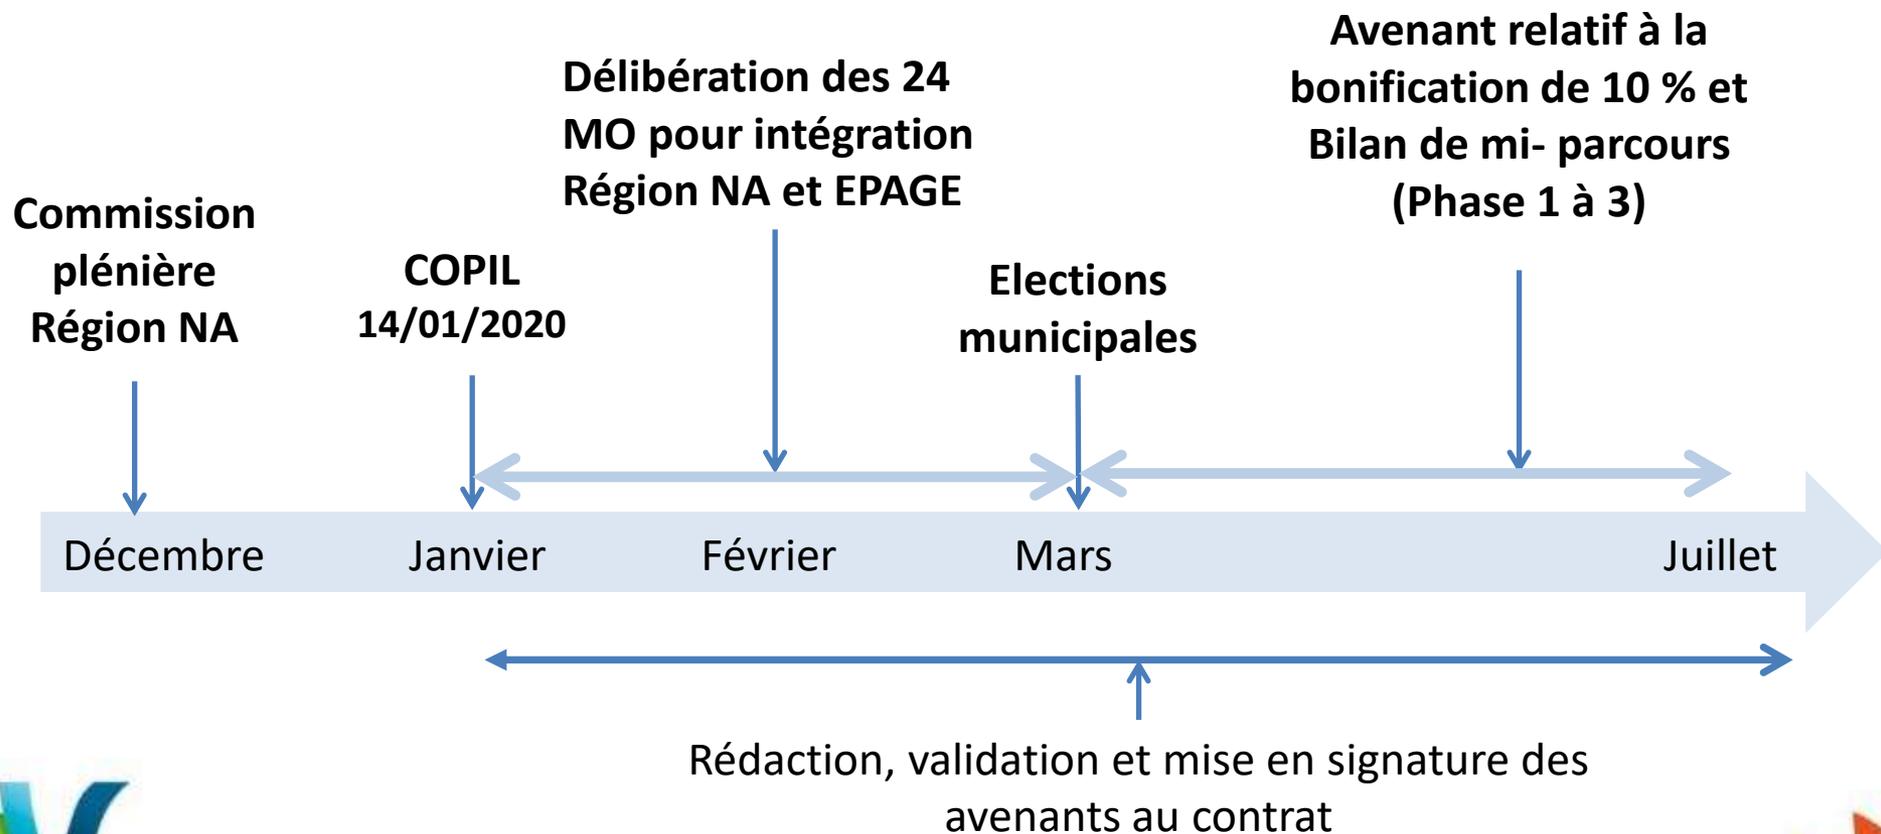

Calendrier à venir

- Des rencontres plus fréquentes entre les maîtres d'ouvrage

Journée gestion du
pâturage

Echanges sur la
gestion des
effluents d'élevage

Echanges : qu'est-ce
qu'une ripisylve / un cours
d'eau en « bon état »

Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

Commission
communication ?

Commission suivis /
Participation à des
pêches électriques

Actualités diverses

➤ Communication :

- Lettre d'info n°5 éditée
- Recueil des réalisations 2018
- Valorisation d'actions possible via la communication institutionnelle portées par l'EPTB
- Site internet : Création et mise à jour de l'onglet « Ressources »
- Participation à la création de l'exposition « Les têtes de bassin versant, trésors d'eau douce en Nouvelle Aquitaine » (OIEau, 2019)
- Filmographie de Télé Millevaches : les premiers films prévus pour 2020



Actualités diverses

➤ Communication :

Amélioration des échanges de données et de la transversalité

Mise à disposition :

- Des rapports d'études
- De données brutes et analysés
- De Cahiers des Charges thématiques
- De diagnostics
-

➔ Mise à jour annuelle



The screenshot shows the website for SOURCES en action, a territorial contract in the Vienna Amont region. The page features a navigation menu with items like Accueil, Actualités, Présentation, Opérateurs, Réalisations, Communication, Ressources, and Contact. The main content area displays a news article titled "Effacement du plan d'eau de Peyrelevalde : études, travaux et suivis" dated 15 November 2018. The article describes the removal of a 1974 water plan in the Pyrénées-Nord region, involving various stakeholders like the Commune de Peyrelevalde, PNR de Millevaches en Limousin, and DFFMA 15. A list of related studies is provided at the bottom, each with a green folder icon and a link to the document.

ACTUALITÉS

Le 15 novembre 2018

Effacement du plan d'eau de Peyrelevalde : études, travaux et suivis

Maîtres d'ouvrage : Commune de Peyrelevalde, PNR de Millevaches en Limousin, DFFMA 15, CEN Nouvelle Aquitaine, SMH, LPO, T66 Millevaches
Avec la participation de TAAPMA de Peyrelevalde.

Une opération d'ouvrage du programme « Sources en action » concerne le plan d'eau communal de Peyrelevalde. Construit en 1974, le stig de plan d'eau, situé à quelques kilomètres des sources de la Vienne, va s'effacer progressivement du paysage entraînant le déplacement de l'étang (d'une superficie initiale de 10 ha) au profit d'une zone humide.

Cette opération phare du programme « Sources en action » rassemble de nombreux porteurs de projets du contrat, chacun apportant ses compétences spécifiques et complémentaires au déroulement de cette action.

Les différents études liées à l'effacement du plan d'eau de Peyrelevalde sont téléchargeables ci-dessous.

LES ACTEURS DU CONTRAT

TÉLÉ
Millevaches

- 2009-Etude dérivation F03.pdf (6 téléchargeables)
- 2010-Réport-analyse-des-données-de-niche-F03.pdf (6 téléchargeables)
- 2011-Etude-sensat-F03.pdf (6 téléchargeables)
- 2012-Etude-2000-cyprines-PNE.pdf (3 téléchargeables)
- 2013-2014-Protocole-de-suivi-Poisson (remédiation mesur) effacement F03.pdf (2 téléchargeables)
- 2016-CCTP-Etude-effacement.pdf (6 téléchargeables)
- 2016-Réport-analyse-des-données-de-niche-F03.pdf (3 téléchargeables)
- 2017-Réport-analyse-des-données-de-niche-F03.pdf (6 téléchargeables)
- 2017-Résultat-Etude-Effacement.pdf (6 téléchargeables)
- 2017-Résultat-Etude-Effacement-Anneex-A0000.pdf (3 téléchargeables)
- 2017-Résultat-Etude-Effacement-Etude_violence_10000.pdf (2 téléchargeables)
- 2017-Résultat-Etude-Effacement-plan_masse_C_A0.pdf (3 téléchargeables)
- 2017-Suivi-entomologique-PNE.pdf (3 téléchargeables)
- 2018-Arrete-Effacement.pdf (4 téléchargeables)
- 2018-PNE_RetourNécessaire.pdf (3 téléchargeables)
- 2018-Réport-analyse-des-données-de-niche-F03.pdf (3 téléchargeables)

Actualités diverses

➤ Outils complémentaires à Sources en action :

➔ Projet de Programme LIFE « Eau et Climat »

➔ Démarche d'économie d'eau au niveau des bâtiments et espaces publics : expérimentation sur la commune de Nedde


➔ Mise en place d'une prime à l'effacement d'étangs



Actualités diverses

➤ Outils complémentaires à Sources en action :

Projet de Programme LIFE « Nature et Biodiversité » en faveur des populations de moules perlières (Pnr Périgord-Limousin – Pnr de Millevaches en Limousin – Université de Bordeaux – Université de Limoges)

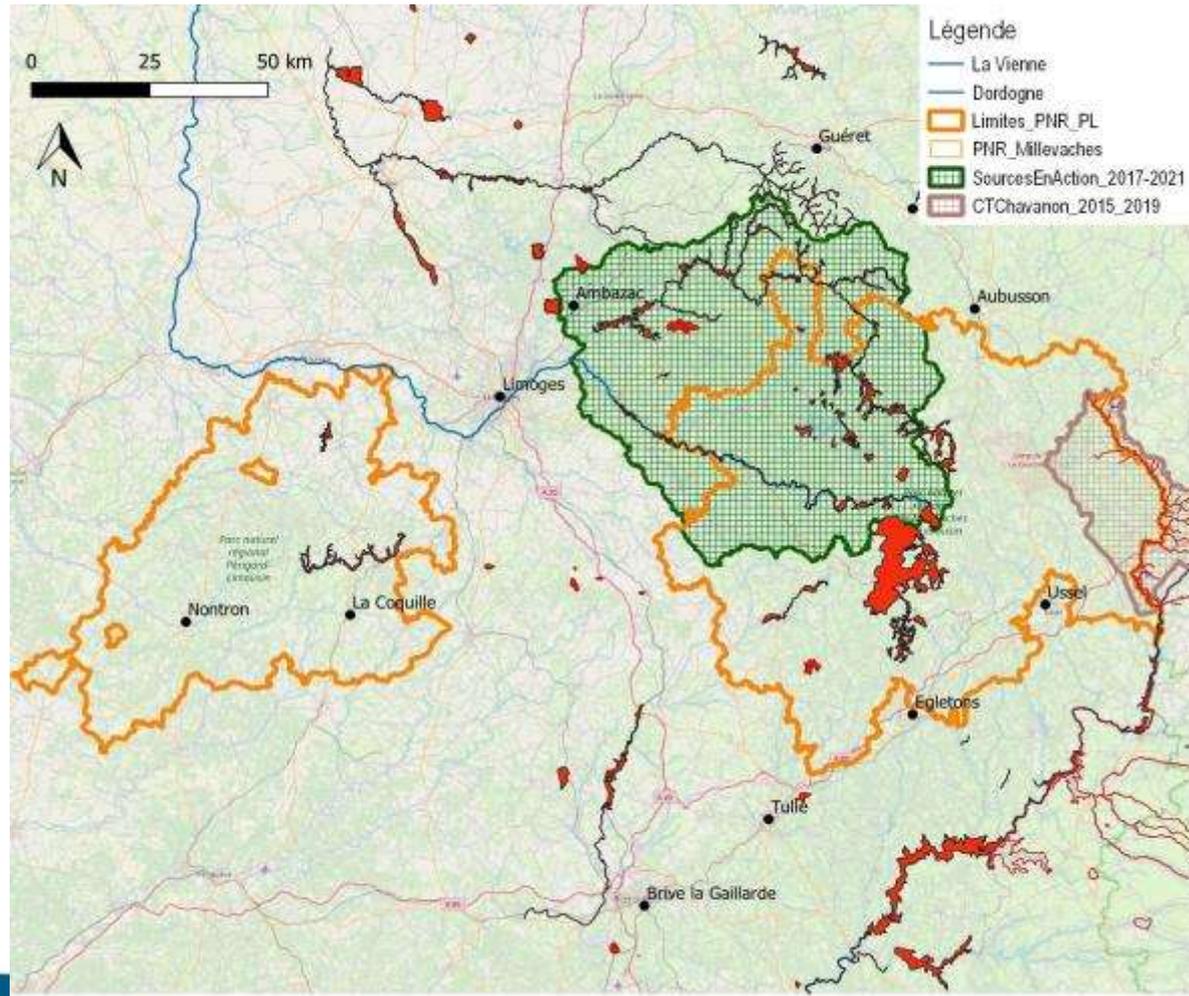

Actualités diverses


Programmation prévisionnelle (focus périmètre Sources en action)

Items	Objectifs quantifiés	Total thématiques 5 ans
Restauration des milieux	8 ouvrages dont étangs	330 000
	20 pièges à sable	22 500
	Prototype extraction fraction sableuse	50 000
	1 500 m ² de frayère restaurées + recharge sédimentaire (10	22 500
Elevage ex-situ	Soutien PNR PL - logistique	3 000
Renforcement des populations - Réintroduction	Définition précise des tronçons - logistique	3 000
Acquisitions de données - suivis	Diagnostics MOL-03 - 100 kml	77 500
	Suivis réintroduction - frayères - glochidies - débits -	45 600
	ADNe (20 analyses)	25 000
	5 stations par an - 15 stations en tout (alternances des suivis)	75 000
Sensibilisation/communication	5 publications + affiches + frais associés aux journées d'échanges (1/an) et de formation(1/an)	40 000
Frais "Voyage"	100 dplct /an - 25 repas - 5 nuités	41 375
Animation	1 ETP coordination - 0,3 ETP administratif	328 640
Stagiaire	Stages	12 000
Equipement/ matériels	Matériels	7 500
Total annuel		1 084 615



Actualités diverses

Programmation prévisionnelle (focus périmètre Sources en action)

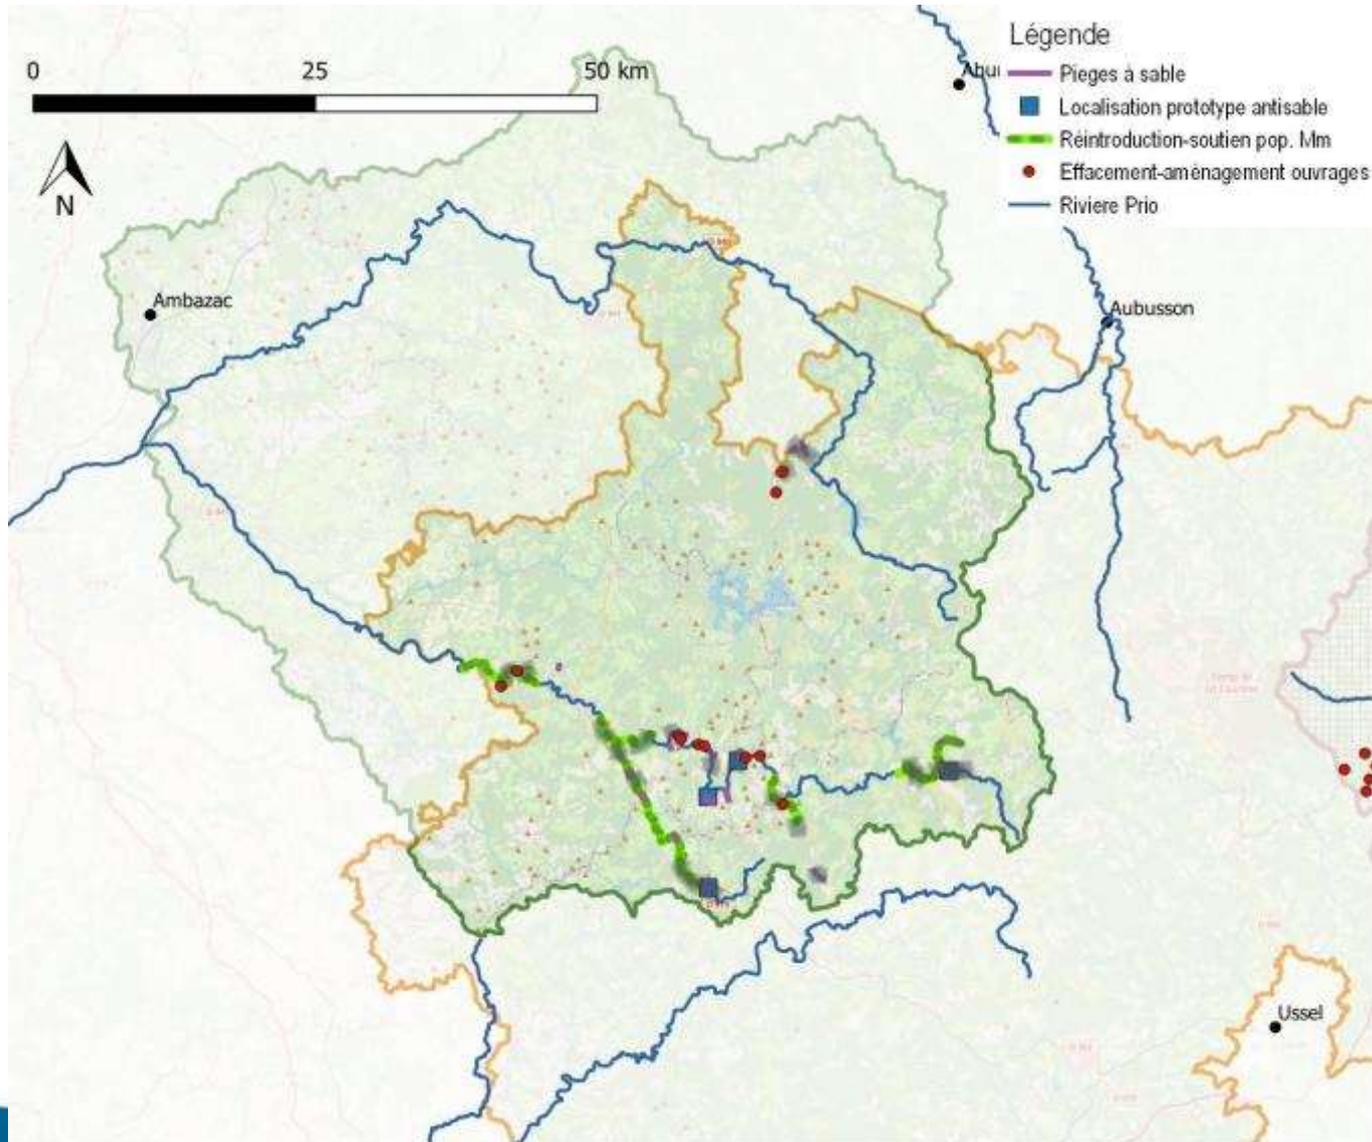

www.sourcesenaction.fr



Pauline BENESTEAU

05 55 06 39 42

p.benesteau@eptb-vienne.fr



Guillaume RODIER

05 55 96 97 01

g.rodier@pnr-millevaches.fr



SOURCES
en action

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT

