



SOURCES *en action*

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT

COTECH

13 novembre 2019 - Bourganeuf





FÉDÉRATION HAUTE-VIENNE
PÊCHE

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
PÊCHE

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
PÊCHE



AGIR pour la BIODIVERSITÉ



TÉLÉ Millevaches

Le programme « Sources en action » bénéficie de subventions de :



Cette opération est cofinancée par l'Union européenne.
L'Europe s'engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.



Ordre du jour

- Point sur l'avancement des phases 1 à 3 & ajustement de la phase 4 en préparation du COPIL de janvier 2020
- Retour sur le Comité des Financeurs du 4/11/2019
- Calendrier à venir (COPIL – démarche d'avenant)
- Points divers (communication, suggestions, etc.)



Point sur l'avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4

➤ Evaluation par thématique sur budgets cumulés P1 à P3 :

Thème prévisionnel	Phase 1			Phase 2			Phase 3		
	Tx de réalisation Ajusté/Prév	Tx de réalisation Réalisation / Prév	Tx de réalisation Réalisation / Ajusté	Tx de réalisation Ajusté/Prév	Tx de réalisation Réalisation / Prév	Tx de réalisation Réalisation / Ajusté	Tx de réalisation Ajusté/Prév	Tx de réalisation Réalisation / Prév	Tx de réalisation Réalisation / Ajusté
Animation et coordination du programme	100%	89%	89%	97%	80%	83%	89%	57%	64%
Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques	100%	29%	29%	140%	135%	97%	91%	87%	96%
Etudes complémentaires ou préalables à des actions	90%	71%	79%	63%	44%	69%	53%	10%	19%
Gestion et préservation des zones humides	71%	71%	100%	123%	39%	32%	65%	0%	0%
Information, sensibilisation et communication	77%	50%	64%	58%	15%	27%	56%	15%	26%
Restauration de la continuité écologique	18%	20%	110%	139%	123%	88%	74%	11%	15%
Restauration et entretien des cours d'eau	91%	75%	82%	88%	35%	40%	42%	9%	22%
Suivis scientifiques	71%	56%	79%	93%	23%	24%	93%	10%	11%
Total général	68%	57%	84%	99%	61%	62%	68%	23%	34%

Lié à un report de programmation (DIE) sur P2

•192 700 € sans information - en attente de réalisation (CEN / CFBL) = trésorerie / incendie criminel

65 000 € sans information - en attente de réalisation (données PEI FD87 – suivis CEN)

• 271 000 € annulés ou reportés (CCV2M – CC CSO – PNR - PETR)
•129 000 € sans information (données HCC-V2M-PETR-FD87)

Pour la com' : annulation du projet PNR – annulation de budgets pour la plupart des MO – Retards de TLMV

Point sur l'avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4

➤ Bases d'évaluation : retours d'expériences des phases 1 à 3

	Phase 1			Phase 2			Phase 3			Phase 4		
	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total réalisé	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total réalisé	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total réalisé	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total réalisé
Total	2 571 646	1 742 704	1 466 565	2 422 237	2 397 725	1 484 025	2 462 960	1 671 940	572 487	2 714 779	1 885 483	-
Tx de réalisation Ajusté/Prév	68%			99%			68%			69%		
Tx de réalisation Réalisation / Prév	57%			61%			23%			0%		
Tx de réalisation Réalisation / Ajusté	84%			62%			34%			0%		

- 180 000 € PETR annulés (en lien avec activités CPIE 19) + 44 000 € reports REST05 et 06 sur P3
- 129 000 € sans information
- ➔ **Taux de réalisation potentiel : 67%**

- 966 000 € d'ajustement à 0 (dont report intégral pour la FD 23 sur P4 – 220 000 € de REST pour la CC CSO – 350 000 € annulés/reportés sur CONT pour CC CSO et PETR)
- 200 000 € de P4 sur P3 en CONT (CC V2M)
- 80 500 € PETR reportés sur l'EPAGE en Phase 4
- 87 500 € sans information

Enjeux : les nouveaux CTMA doivent avoir un bilan de mi parcours avec 60% de réalisation budgétaire

	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total réalisé
Total P1 à P3	7 456 843	5 812 368	3 523 077
Tx de réalisation Ajusté/Prév	78%		
Tx de réalisation Réalisation / Prév	47%		
Tx de réalisation Réalisation / Ajusté	61%		

Point sur l'avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4

➤ Ajustement de la Phase 4 au regard du prévisionnel

Montant ajusté global de la phase 4 = 69% du prévisionnel

Compléments à apporter par les MO ?



Thème prévisionnel	Phase 4		
	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Taux Ajusté/Prév
Animation et coordination du programme	566 637	474 661	84%
Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques	117 900	107 100	91%
Etudes complémentaires ou préalables à des actions	226 385	184 157	81%
Gestion et préservation des zones humides	258 600	238 600	92%
Information, sensibilisation et communication	64 299	40 329	63%
Restauration de la continuité écologique	804 460	464 660	58%
Restauration et entretien des cours d'eau	558 573	296 836	53%
Suivis scientifiques	117 925	79 140	67%
Total général	2 714 779	1 885 483	69%

Point sur l'avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4

➤ Point d'information sur l'EPAGE (au 1^{er} janvier 2020) :


- Héritage intégral des programmations du PETR sur les masses d'eau : FRGR0370 et FRGR1264 pour les Phases 4 et 5 + Phase 3 en partie (report automatique de phase)
- Interrogation sur l'animation (en cours de calage)

		Phase 4		Phase 5	
		Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté
EPAGE SABV	Restauration	66 000	66 000	29 000	29 000
	Restauration	47 096	47 096	6 000	6 000
	Suivis scientifiques	8 250	8 250		
	Animation	?	?	?	?
Total EPAGE SABV		121 346	121 346	35 000	35 000



Point sur l'avancement des phases 1 à 3. Ajustement de la phase 4

➤ Présentation cartographique des réalisations sur 1 masse d'eau : Phase 1 – FRGR0356

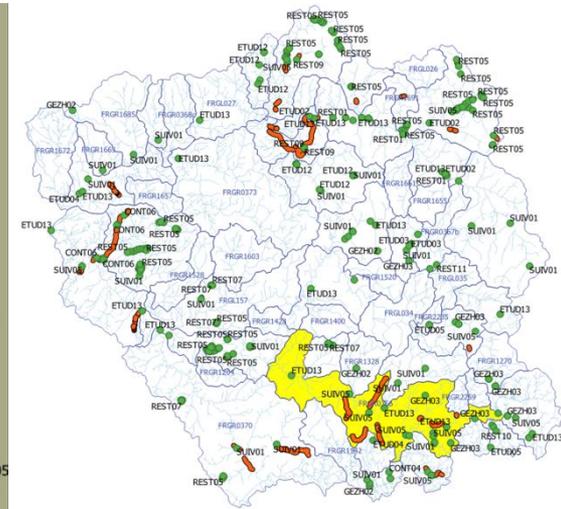

Présentation cartographique des réalisations sur 1 masse d'eau : Phase 1 – FRGR0356

1° - Des opérations localisées à la masse d'eau


Phase Masse d'eau	Phase 1 FRGR0356					
Thème prévisionnel	Action Prévisionnelle	MO	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total réalisé	Commentaires
Etudes complémentaires ou préalables à des actions	Autre étude complémentaire ou préalable	FD87	750	750	750	
	Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs	CCV2M	25 000	6 522	6 522	15 000 € reportés en P2
		FD87	5 000	4 000	4 000	
Gestion et préservation des zones humides	Travaux de gestion (entretien) des zones humides	CENL	3 000	3 115	3 115	
Restauration de la continuité écologique	Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage)	PETRMB	5 000	-		Abandon
		Peyrelevade	350 000	-	-	Report en P2
	Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)	PETRMB	27 000	-		Abandon
Restauration et entretien des cours d'eau	Aménagement agricole pour la mise en défens des berges	CCV2M	5 000	5 040		En cours
	Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail	CCV2M	3 000	2 400	-	En cours
	Autres travaux ou aménagements (dont plantation ripisylve)	FD87	52 500	44 164	44 164	
	Entretien des berges et de la ripisylve	CCV2M	12 000	7 632	3 120	
		PETRMB	2 100	2 100		Report en P2
Total général			490 350	75 723	61 671	

Nom indicateur	Phase 1
ml de clôture fixe	
ml de clôture mobile	
ml restaurés	3253
Nombre d'abreuvoirs installés	
Nombre de diagnostics	1
Nombre de propriétaires, exploitants contactés, sensibilisés, informés	1
Nombre d'embâcles traités (si non linéaire)	

Tx de réalisation (R/A)	81%
-------------------------	------------



1° - Des opérations localisées à la masse d'eau : prévision cartographique sur 5 ans

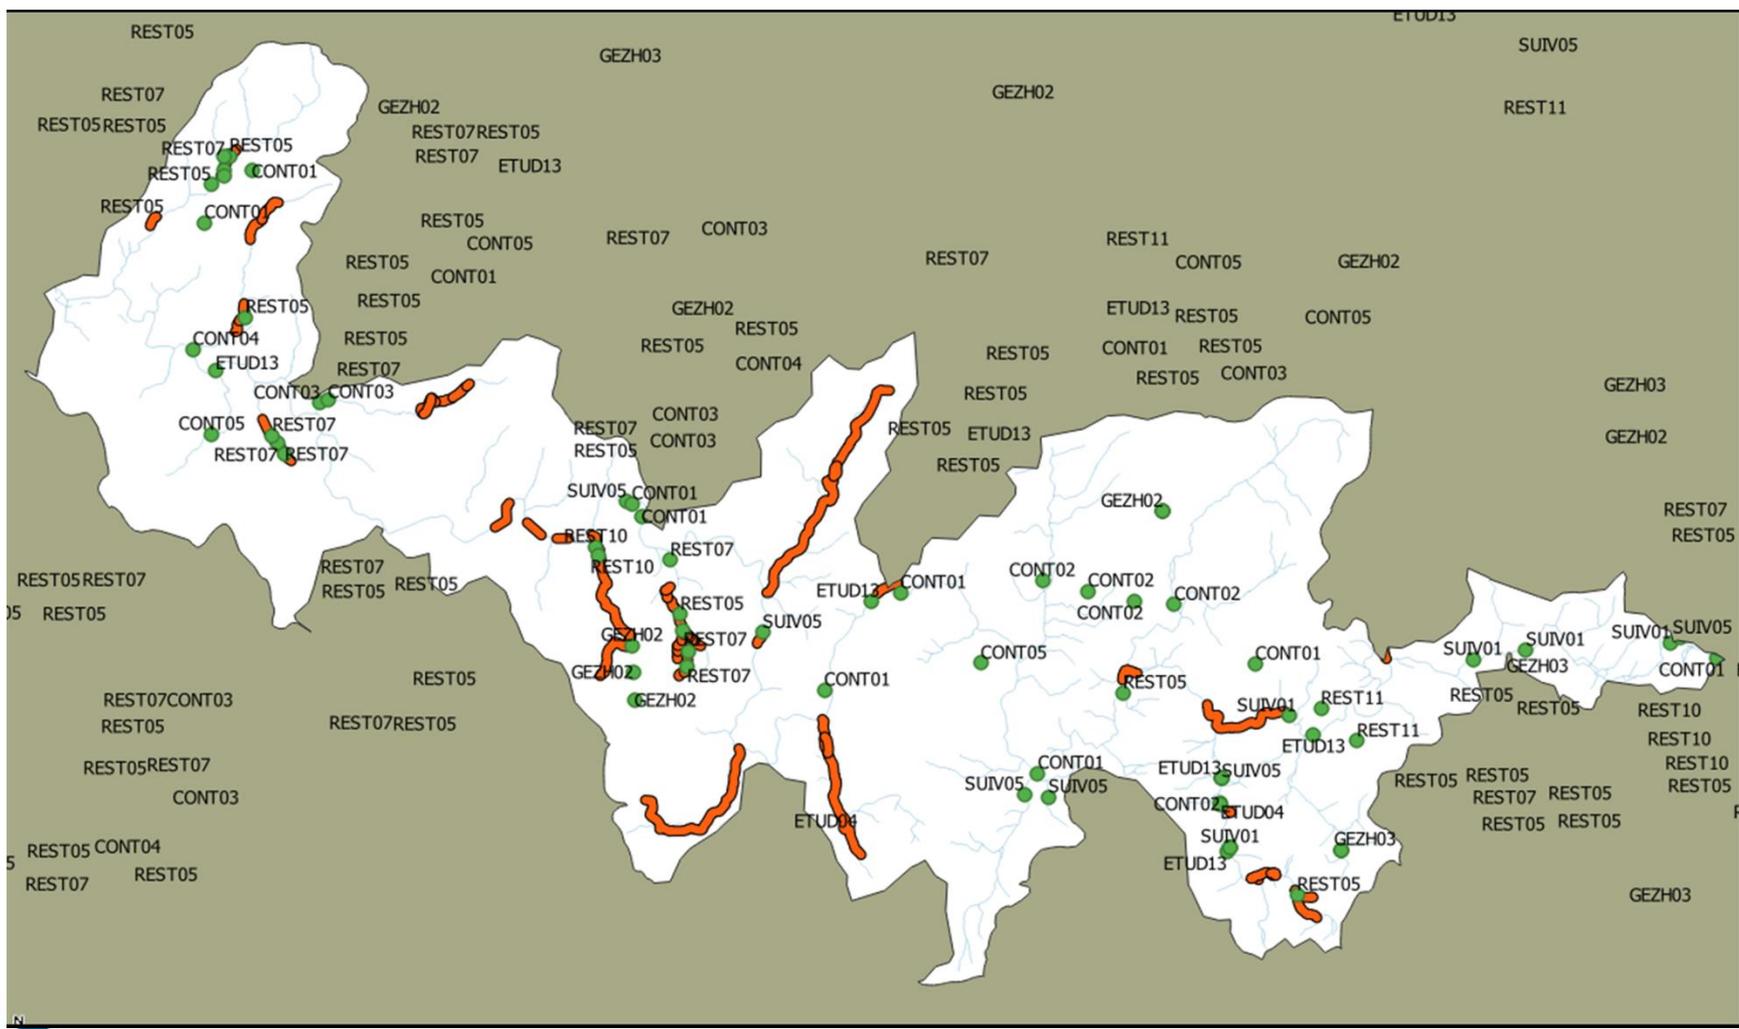

Présentation cartographique des réalisations sur 1 masse d'eau : Phase 1 – FRGR0356

2° - Des opérations non localisées à la masse d'eau

Thème prévisionnel	Action Prévisionnelle	MO	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Montant total réalisé
Animation et coordination du programme	Animation (autres)	PNRML	18 250	9 932	12 381
	Animation du volet agricole	CA23	38 400	38 400	38 400
		CIVAML	9 360	9 300	9 300
	Animation et suivi des actions forestières	CCCIATE-BRV	11 750	11 750	5 796
		PNRML	10 000	9 867	10 441
	Animation et suivi des travaux cours d'eau	CCCGS	33 750	45 000	17 269
		CCCIATE-BRV	72 419	72 419	64 571
		CCV2M	31 462	31 462	27 928
		FD23	17 940	17 625	17 625
		FD87	13 200	13 200	13 200
PETRMB		77 242	77 242	57 063	
Animation pour la gestion zones humides	CENL	136 000	134 442	134 450	
Coordination du programme	EPTBV	40 000	40 218	40 218	
	PNRML	40 000	39 466	41 767	
Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques	Accompagnement collectif	CA23	4 800	4 800	4 800
		CIVAML	13 200	13 200	13 200
	Accompagnement individuel	CA23	4 800	4 800	-
		CIVAML	7 500	7 500	7 500
Diagnostic Individuel d'Exploitation	CA23	57 600	57 600	-	
Etudes complémentaires ou préalables à des actions	Autre étude complémentaire ou préalable	CCV2M	3 000	2 824	3 014
		MEP19	5 828	-	-
		PNRML	24 000	20 515	20 515
	Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs	CCCIATE-BRV	27 260	27 260	26 791
Gestion et préservation des zones humides	Acquisition foncière	CENL	30 000	-	-
Information, sensibilisation et communication	Education à l'environnement des scolaires	CPIE23	-	-	-
	Information et sensibilisation du public	LNE	4 450	4 450	-
		CCCIATE-BRV	2 400	2 400	1 325
	Mise en place d'outils de communication	EPTBV	20 000	20 000	13 542
		GMHL	2 000	2 000	2 000
		PETRMB	1 000	-	-
		PNRML	1 000	953	953
		TLMV	7 849	-	-
Organisation de manifestations et événements	CCCIATE-BRV	700	700	1 755	
Suivis scientifiques	Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.)	FD87	45 000	18 000	18 000
		MEP19	12 594	8 816	4 501
	Suivi de qualité physico-chimique de l'eau	CCV2M	2 500	2 500	968
	Suivi d'espèces inféodées aux milieux aquatiques	GMHL	30 038	30 038	23 346
		SEPOL	10 966	9 300	9 300
Suivi hydromorphologique	PNRML	4 000	4 000	3 175	
Total général			872 257	791 979	645 095



Présentation cartographique et chiffrée pour une masse d'eau et une phase – de manière synthétique

→ A reproduire 55 fois avec 6 thématiques « cartographiables » - présentation mutli-phases possible

Est-ce adapté ?

Quelles alternatives pour améliorer les présentations « catalogues » lors des COPIL notamment ?

→ Dans le cadre du bilan mi-parcours du CTMA : mise à jour de l'atlas à réaliser. Il répondra partiellement à la demande des partenaires financiers.

Mise à jour possible sur la base des réalisations Phase 1 et 2 (données partielles) – Phase 3 ?
Pour mi-2020.



Retour sur le comité des financeurs du 4/11/2019

- **Objet :** Anticiper le calendrier en vue d'intégrer la Région, l'EPAGE et la convention Région / Agences

- **Intégration de la Région NA :**
 - Délibération pour que la Région NA contractualise Sources en action présentée en commission plénière de décembre 2019
 - Engagement de la Région NA sur des montants maximums
 - L'avenant permettant d'intégrer la Région doit être signé par les 24 maîtres d'ouvrage

- **Intégration de l'EPAGE Vienne médiane :**
 - Labellisation prévue au 01/01/2020
 - Reprise de la programmation du PETR sur son futur territoire de compétence : CC Briance Combade = Vergnas + Combade en partie
 - Ne peut être couplé à l'avenant d'intégration de la Région car labellisation non finalisée
 - L'avenant permettant d'intégrer l'EPAGE doit être signé par les 24 maîtres d'ouvrage



Retour sur le comité des financeurs du 4/11/2019


➤ Convention Région / Agences :

- Bonification des aides AELB (+10% sur l'animation et la communication) : forte attente des maîtres d'ouvrage
- La DREAL souhaite être intégrée à la convention
- L'avancement de la démarche a pris du retard (pas de présentation en commission fin 2019)
- Rétroactivité de la bonification possible selon la date de validation de la convention




Calendrier à venir

➤ Les instances de gouvernance

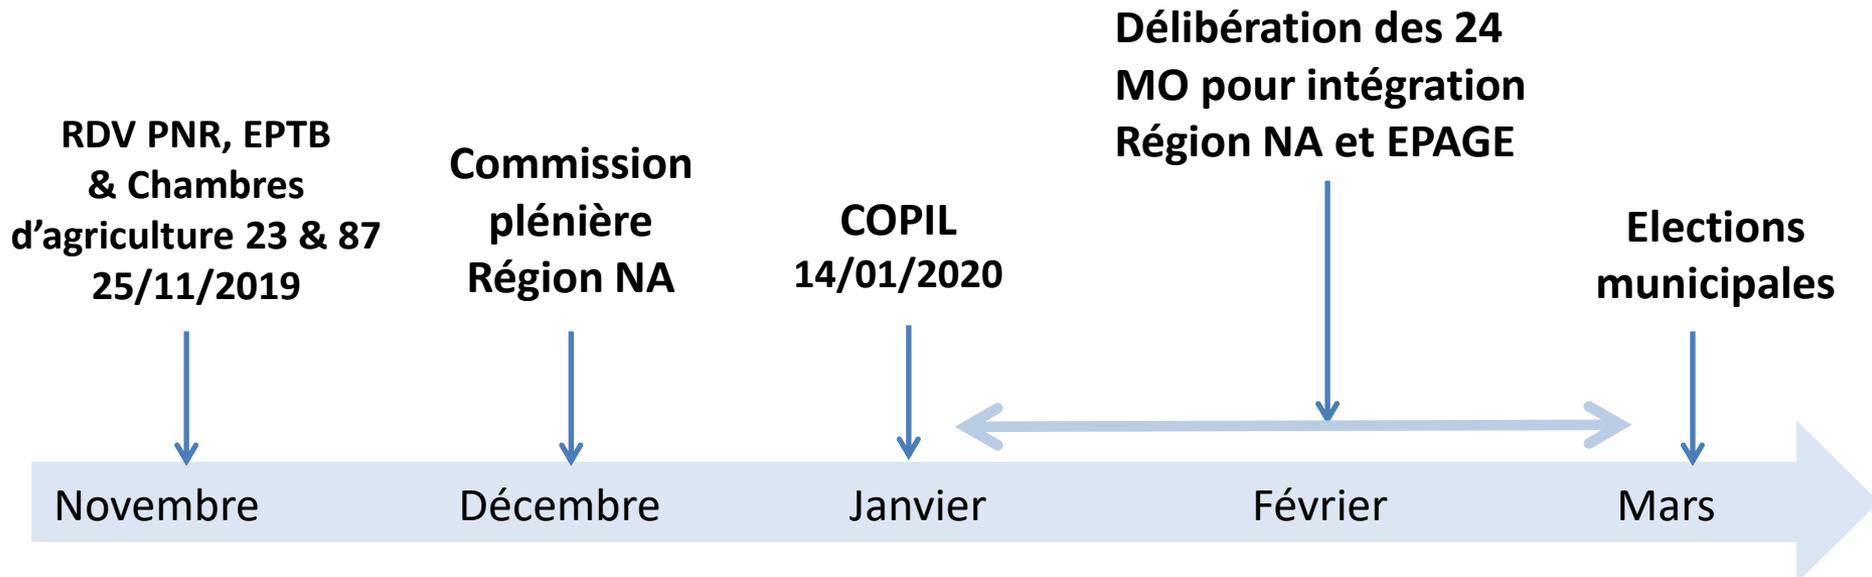

Calendrier à venir

- Des rencontres plus fréquentes entre les maîtres d'ouvrage

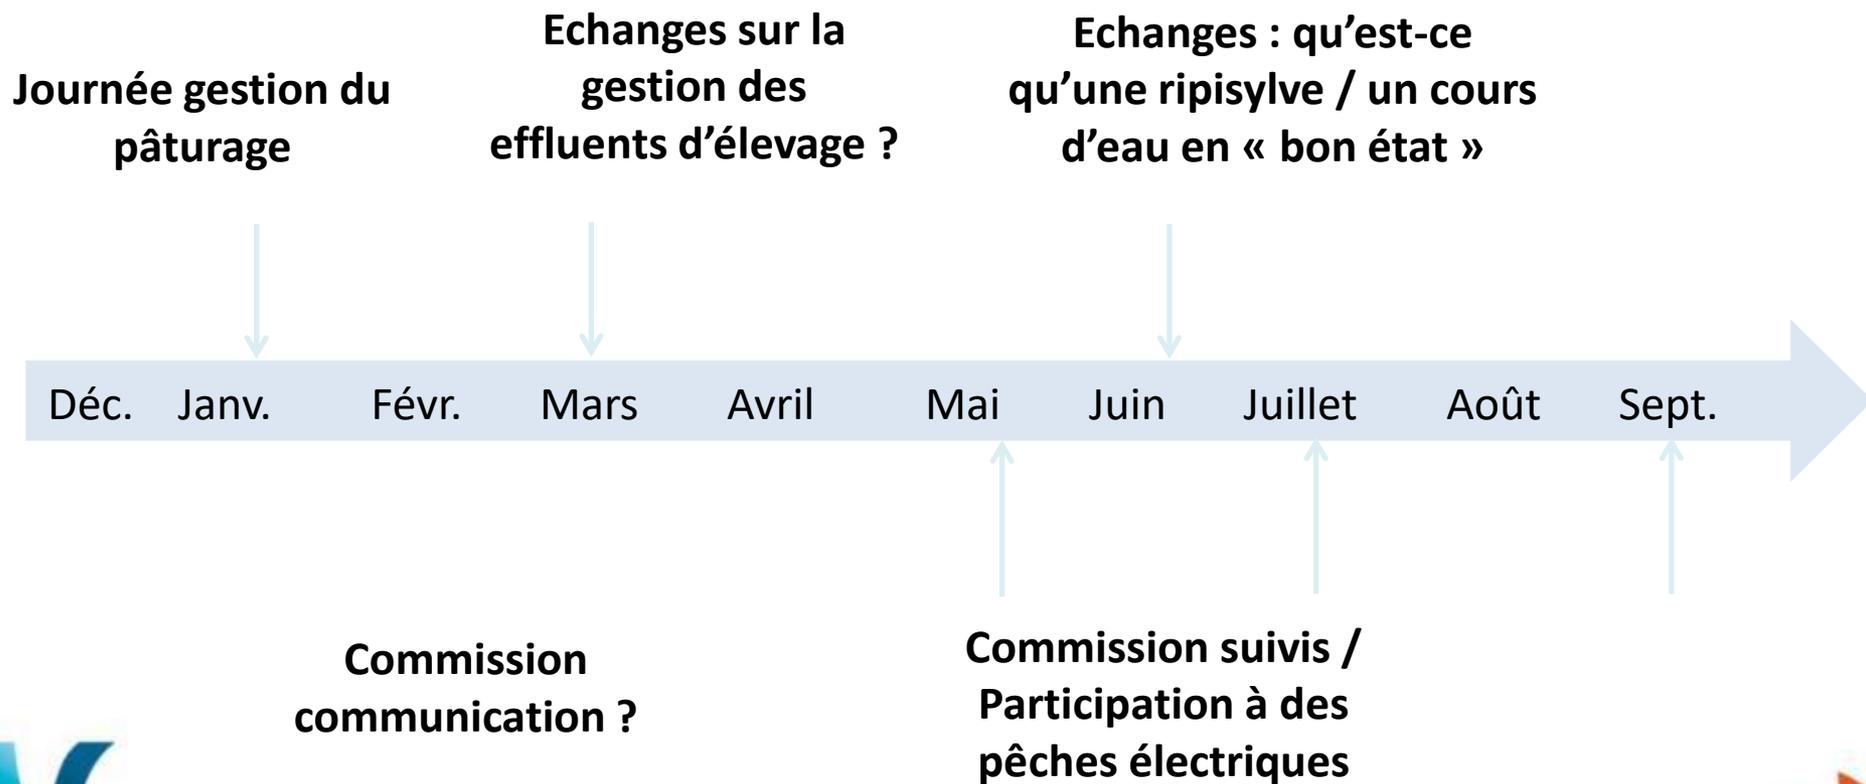

Autres informations / questions / suggestions

➤ **Vigilance :**

- Attention aux dates butoirs pour solder les dossiers de subventions
- Attention aux formulaires utilisés pour les demandes de subventions


➤ **Communication :**

- Lettre d'info n°5 éditée, Recueil des réalisations 2018 à paraître dans les prochains mois
- Valorisation d'actions possible via les opérations portées par l'EPTB Vienne : quelle(s) modalité(s) ?
- Site internet : Envoyer aux coordonnateurs l'ensemble des documents à partager (fichiers numériques ou lien Internet) pour mise en ligne
- Télé Millevaches



Autres informations / questions / suggestions

➤ Actions sur le bassin de l'Enclose

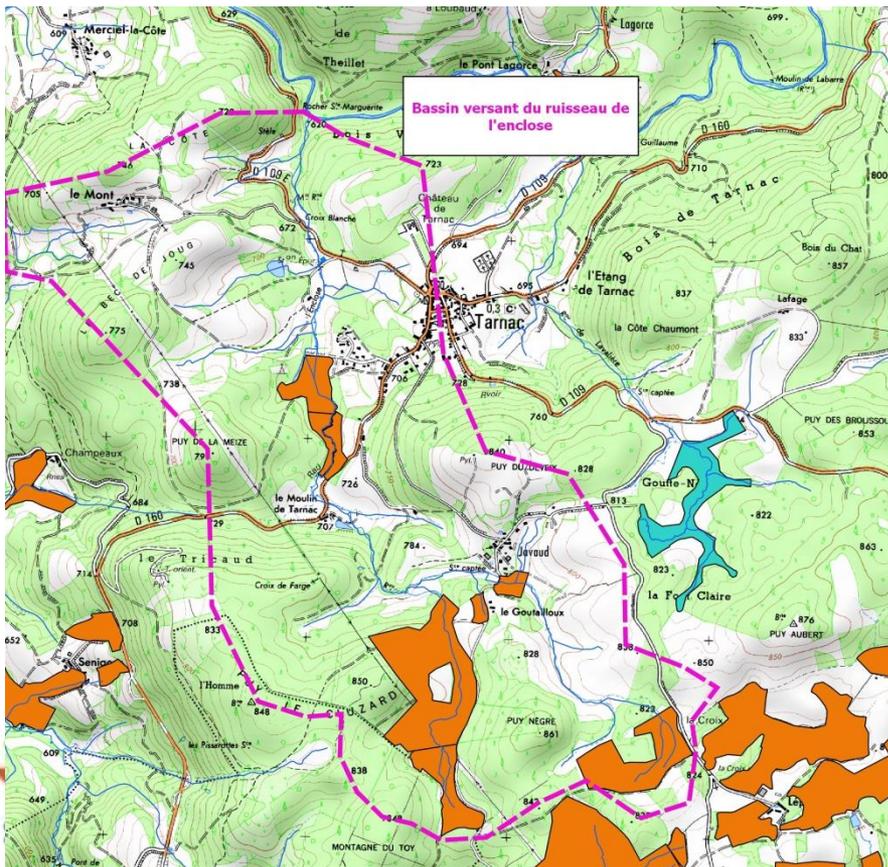

Cartographie des Actions CEN
Bassin versant du ruisseau de l'Enclose

Légende

Implication du CEN

- Maîtrise d'usage ou foncière
- Site d'étude de Goutte Nègre
- Réseau Zones Humides en Limousin



Sources : Scan25_2016, BD_topo, données CEN
Réalisation : CEN Nouvelle-Aquitaine, Octobre 2019

Objectif :

- Diagnostic complet 1^{er} trimestre 2020
- En aval : 3 points noirs
Continuité écologique
➔ Etude – programmation – répartition des maîtrises d'ouvrage (CCV 2M – Département – Commune – PNR – FD19 ...)
- En amont : Programmation travaux ZH ? CEN ?

Autres informations / questions / suggestions

➤ Suggestions / attentes / améliorations ?



www.sourcesenaction.fr



Pauline BENESTEAU

05 55 06 39 42

p.benesteau@eptb-vienne.fr



Guillaume RODIER

05 55 96 97 01

g.rodier@pnr-millevaches.fr



SOURCES
en action

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT



Volet agricole : Retour des DIE – validation des AI – modification de programmation de la CIVAM

➤ Postulats :

- Les DIE (Chambre d'agriculture 23) alimentent les données du contrat. Ils sont partagés via OSCTMA
- Les projets d'AI, faisant suite à des DIE, doivent être validés avant démarrage de l'action
- Les AI sont validés en COPIL (format de validation revu au COPIL du 5 décembre 2018)

➤ Difficultés :

- 10 mois de discussions entre les coordonnateurs et les Chambres 23 et 87
- Absence d'échange de donnée phase 1 et 2 – pas de validation des AI
- Rencontre prévue fin novembre entre les Présidents des Chambres 23 et 87 et du PNR ML + EPTB Vienne

➤ En parallèle :

- La CIVAM ne souhaite plus réaliser de DIE en 2020.

