



SOURCES *en action*

CONTRAT TERRITORIAL
Vienne Amont

COTECH

12 novembre 2020 – Visioconférence





AGIR pour la BIODIVERSITÉ



Le programme « Sources en action » bénéficie de subventions de :




Cette opération est cofinancée par l'Union européenne. L'Europe s'engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.



Ordre du jour

- Bilan de mi-parcours des phases 1 à 3
- Etat d'avancement P4 – Préparation/ajustement P5
- Présentation du calendrier de renouvellement du contrat
- Point d'information sur les journées d'échanges
- Points divers (communication, suggestions, etc.)
 - Cas du plan d'eau de St Dizier Leyrenne en assistance à maîtrise d'ouvrage de la CC Creuse Sud Ouest

Chronologie de Sources en action 2

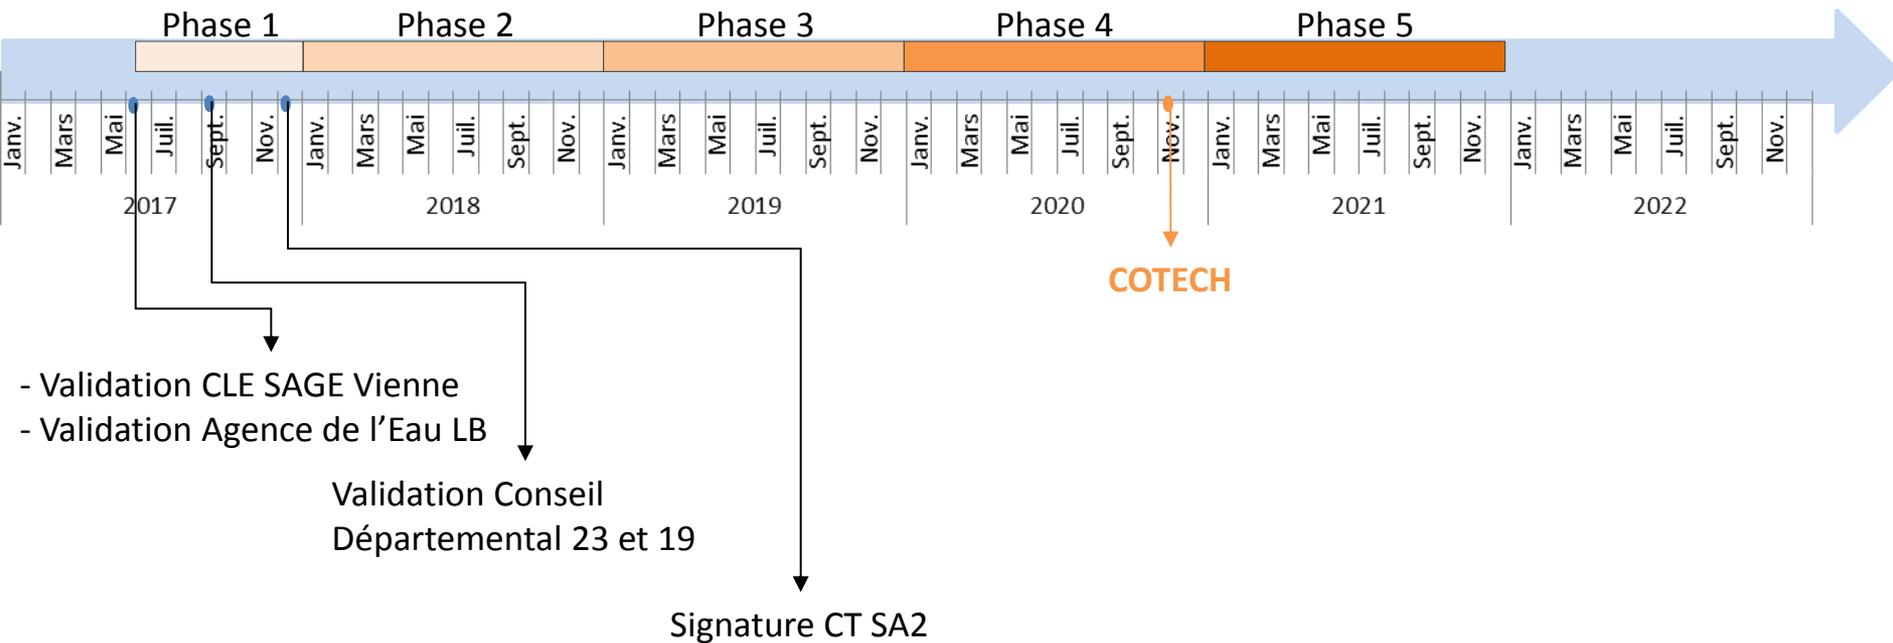

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3)

➤ Taux de réalisation : Evaluation par thématique de la consommation des enveloppes financières par phase

Thème	Phase 1 (2017)			Phase 2 (2018)			Phase 3 (2019)		
	Ajusté / Prév.	Réalisé / Prév.	Réalisé / Ajusté	Ajusté / Prév.	Réalisé / Prév.	Réalisé / Ajusté	Ajusté / Prév.	Réalisé / Prév.	Réalisé / Ajusté
Animation et coordination du programme	100%	88%	88%	97%	80%	82%	89%	81%	91%
Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques	100%	29%	29%	140%	135%	97%	91%	87%	96%
Etudes complémentaires ou préalables à des actions	90%	69%	76%	67%	59%	88%	44%	34%	78%
Gestion et préservation des zones humides	71%	71%	100%	123%	109%	89%	65%	50%	77%
Information, sensibilisation et communication	77%	50%	64%	58%	50%	87%	36%	20%	56%
Restauration de la continuité écologique	18%	19%	108%	127%	117%	92%	126%	11%	9%
Restauration et entretien des cours d'eau	91%	71%	78%	77%	62%	80%	44%	10%	23%
Suivis scientifiques	71%	56%	79%	90%	73%	81%	78%	63%	82%
Total général	68%	56%	82%	95%	81%	86%	74%	42%	56%

Report de programmation (DIE) sur P2




Suppression/aménagement d'ouvrages transversaux
 - 299 000€ annulé
 - 77 000€ en attente (*en attente d'autorisation, en cours de réalisation, difficultés de mises en place, mises à jour de l'OSCTMA*)

Aménagement pour abreuvement, mise en défens des berges, franchissement, ...

- 17 000€ en cours
 - 123 860€ transféré en P4
 - 33 000€ annulé
 - 343 690€ en attente (*en attente d'autorisation, difficultés de mises en place, mises à jour de l'OSCTMA*)

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3)

➤ Réalisation financière : Evaluation par thématique sur chacune des phases

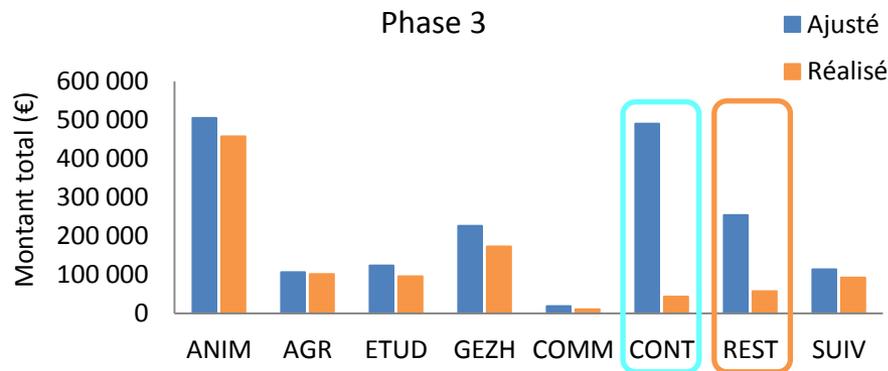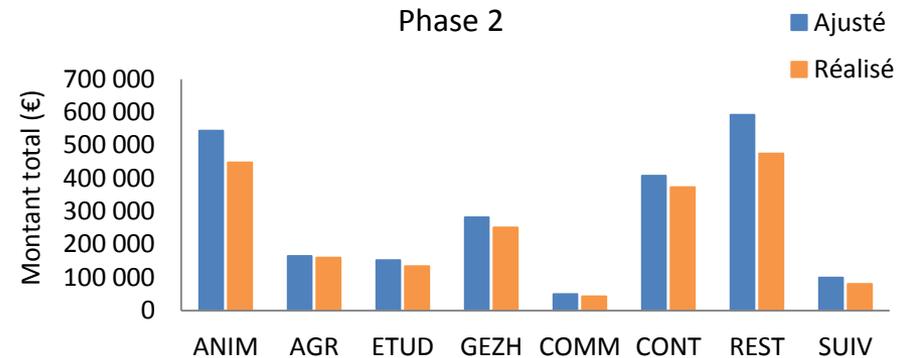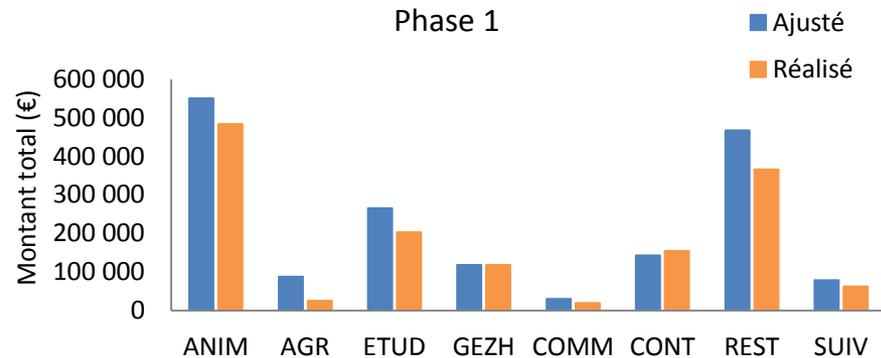

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3)

➤ Taux de réalisation : Evaluation globale sur chacune des phases

	Phase 1			Phase 2			Phase 3		
	Prévi.	Ajusté	Réal.	Prévi.	Ajusté	Réal.	Prévi.	Ajusté	Réal.
TOTAL	2 571 646	1 742 704	1 433 547	2 422 237	2 292 107	1 965 608	2 482 960	1 840 319	1 034 927
Tx de réalisation Ajusté / Prévi	68%			95%			74%		
Tx de réalisation Réalisé / Prévi	56%			81%			42%		
Tx de réalisation Réalisé / Ajusté	82%			86%			56%		

Thèmes déclassants
CONT et REST
1 257 000€ prévu
769 000€ ajusté
101 000€ réalisé

➤ Taux de réalisation : Evaluation globale cumulée (phases 1 à 3)

	Prévi.	Ajusté	Réal.
TOTAL	7 476 843	5 875 129	4 434 082
Tx de réalisation Ajusté / Prévi	79%		
Tx de réalisation Réalisé / Prévi	59%		
Tx de réalisation Réalisé / Ajusté	75%		

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3)




➤ Taux de réalisation : Proportion de ME prioritaire sur les réalisations

	Montant total		
	Prévisionnel	Ajusté	Réalisé
ME prioritaire	3 643 133	2 569 171	1 685 908
ME non prioritaire	1 205 127	908 095	690 068
Toutes ME	2 628 582	2 397 863	2 058 107
TOTAL	7 476 843	5 875 129	4 434 082

	Prévisionnel	Ajusté	Réalisé
Ratio prioritaire / (non prioritaire + prioritaire)	75%	74%	71%
Ratio non prioritaire / (non prioritaire + prioritaire)	25%	26%	29%
Ratio prioritaire / montant total	49%	44%	38%
Ratio non prioritaire / montant total	16%	15%	16%


Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3)

➤ Réalisation : Quelques indicateurs de réalisation cumulés sur les phases 1 à 3

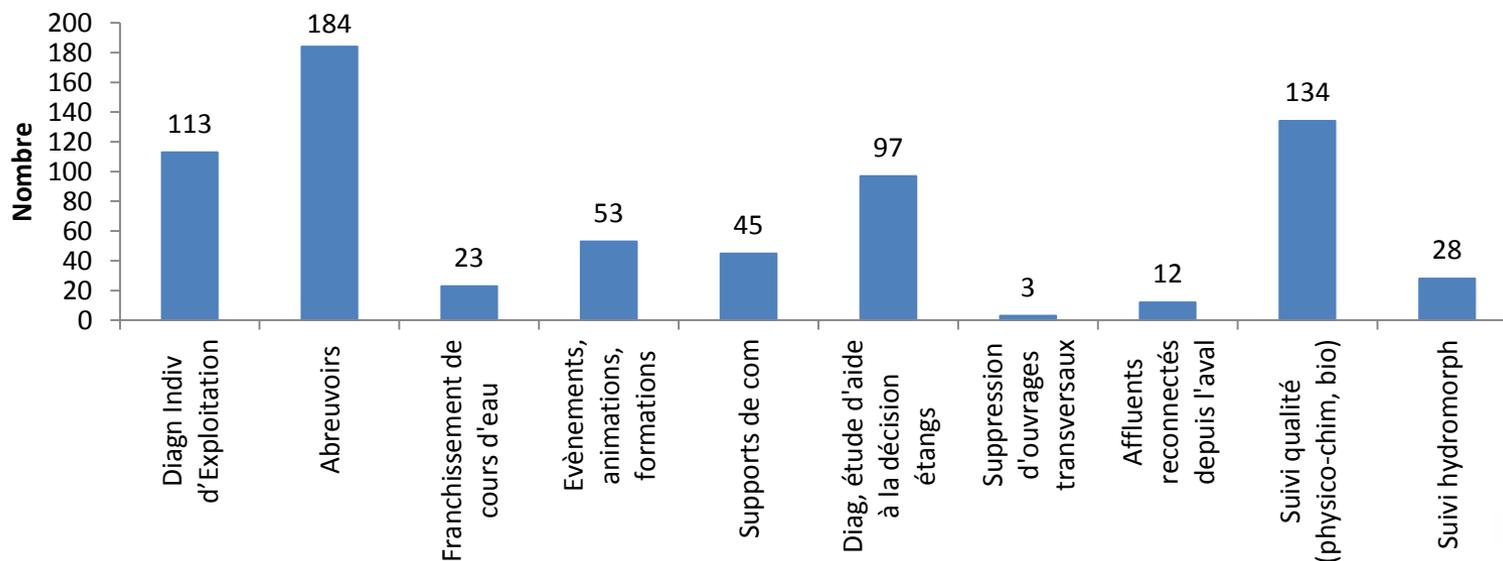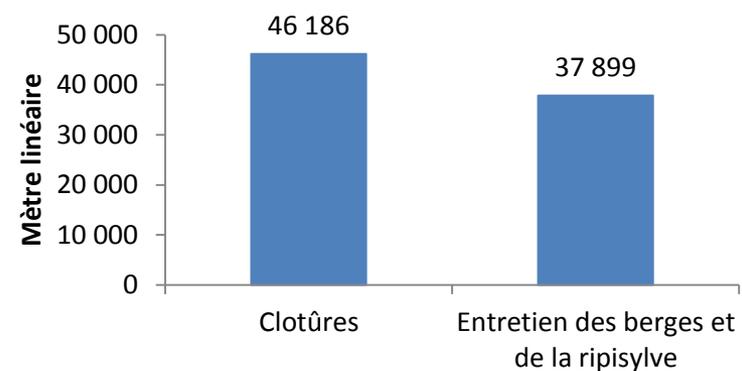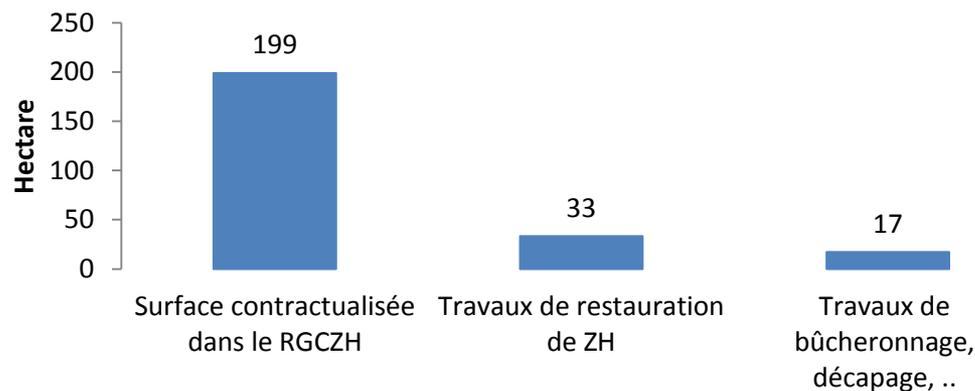



Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3)

➤ Localisation des réalisations en P1, P2 et P3

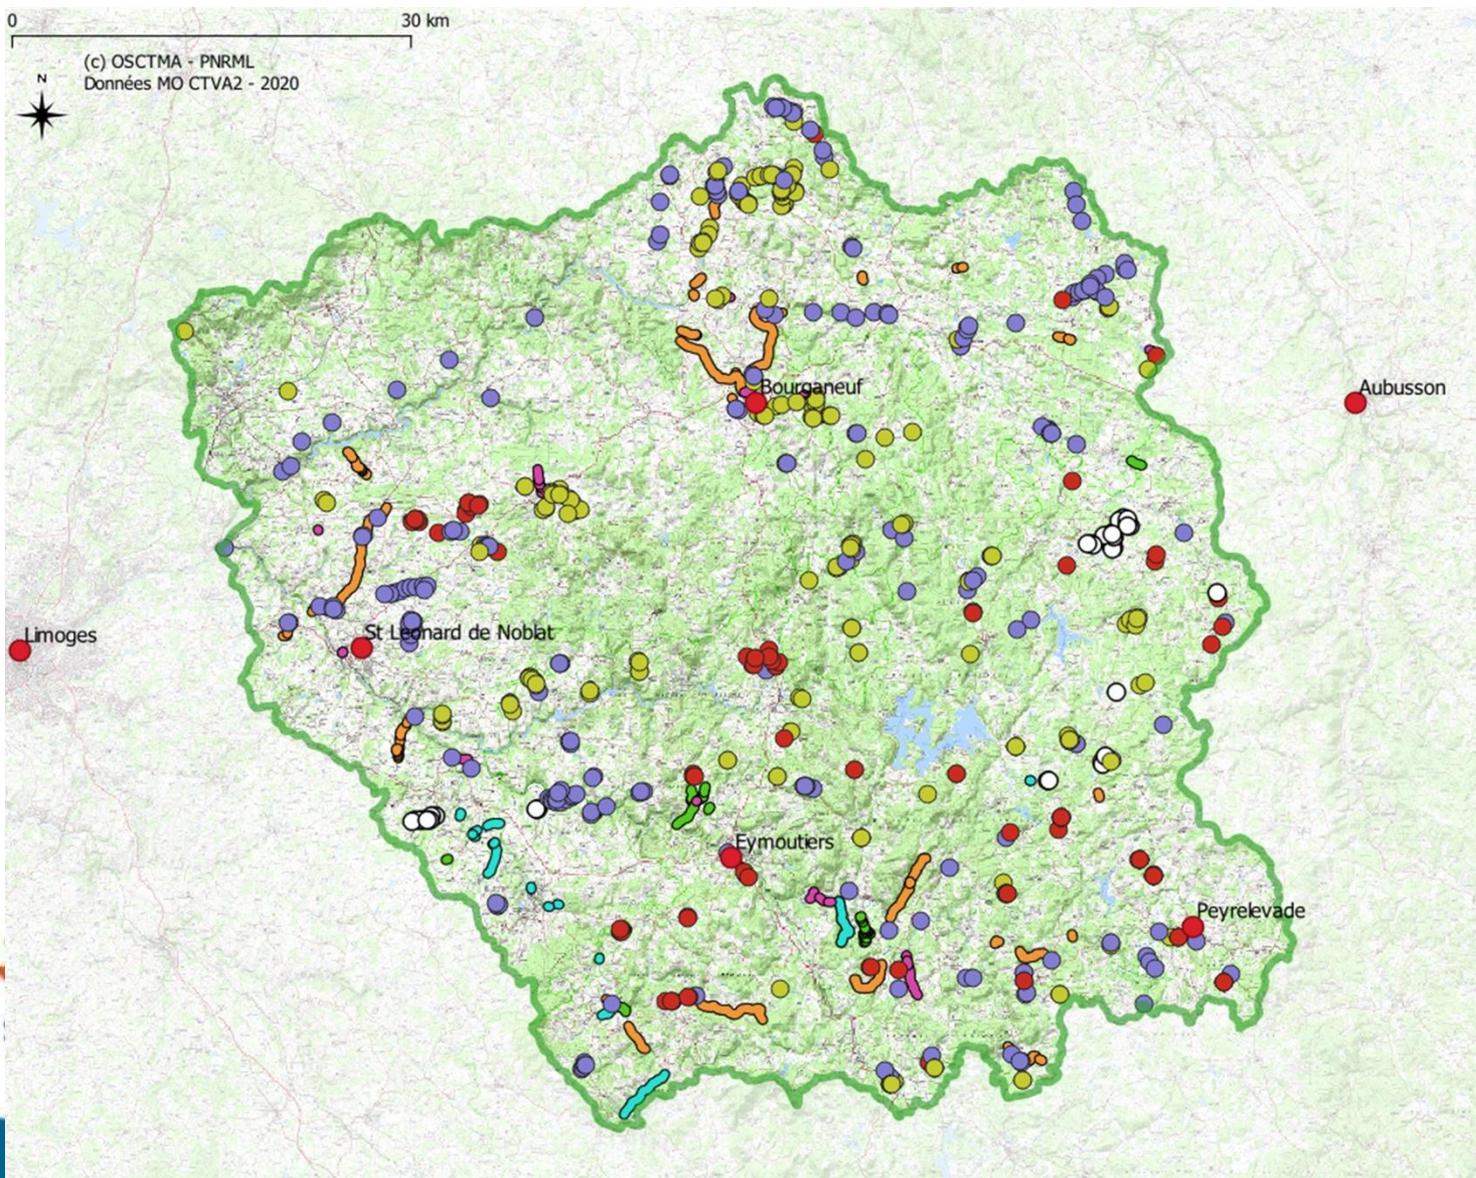

Bilan de mi-parcours (Phases 1 à 3)

➤ Bilan financier des réalisations

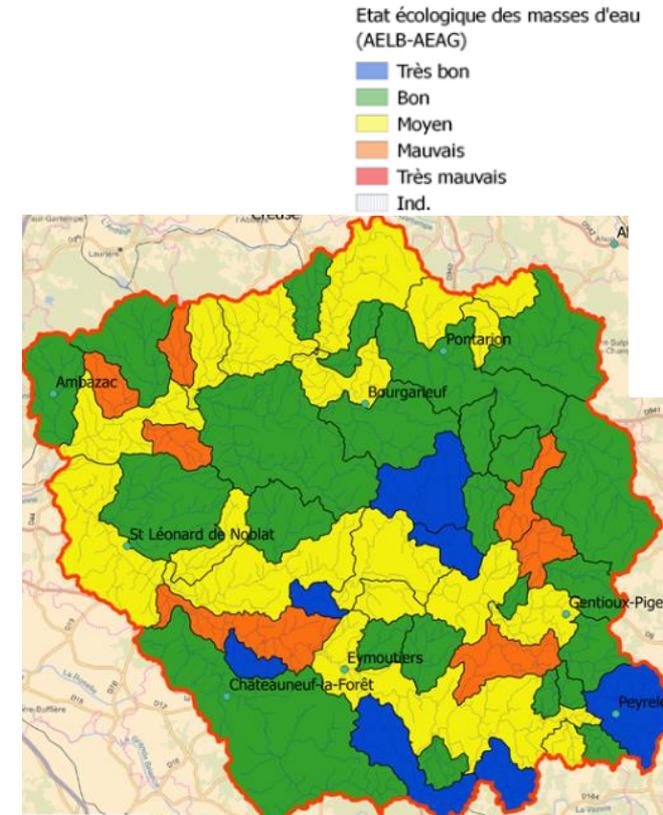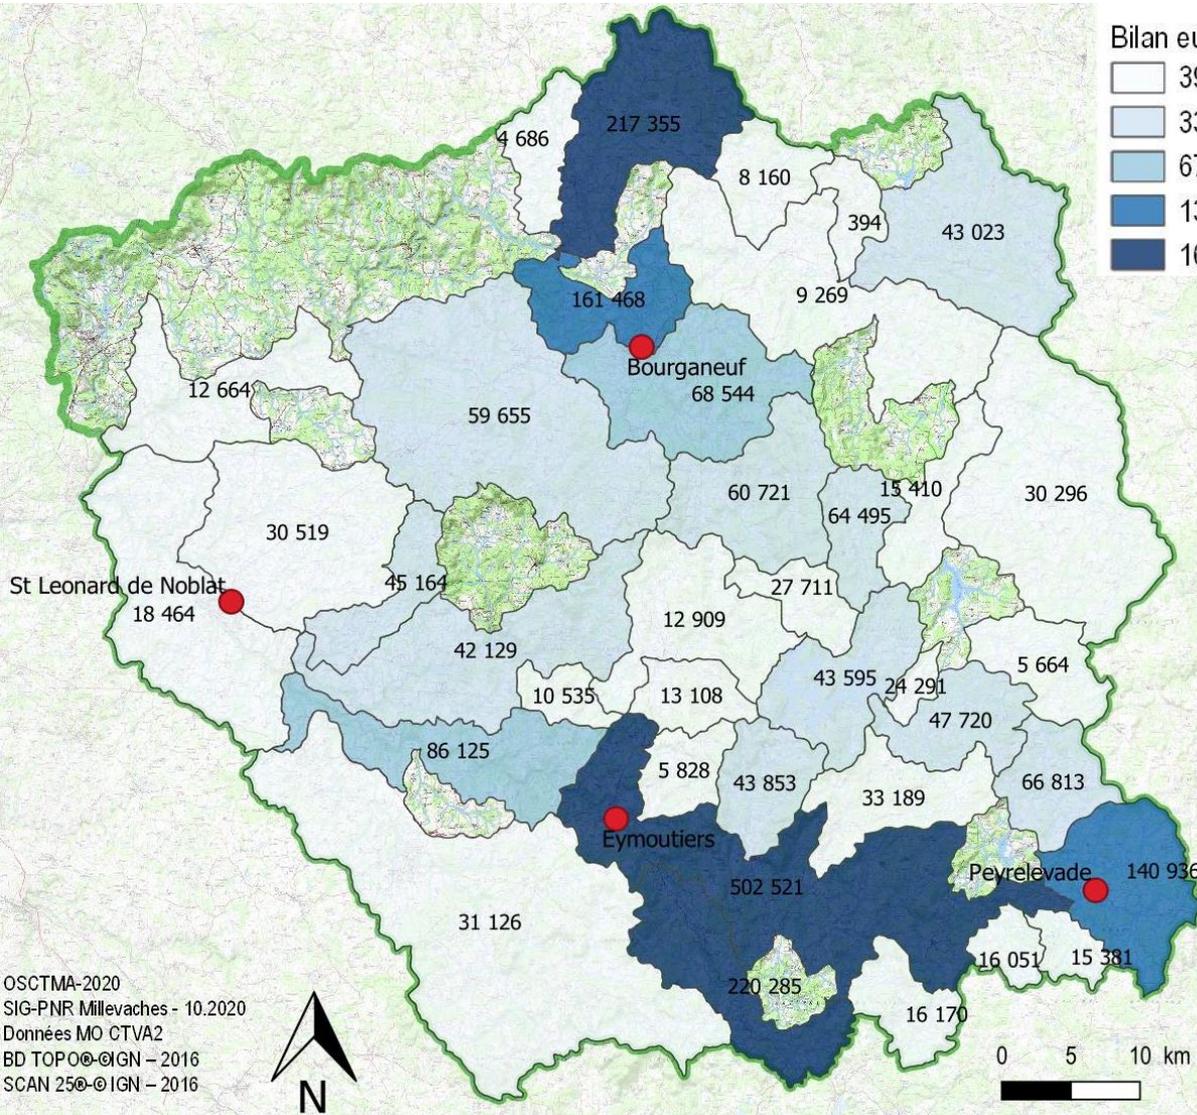

Phases 4 et 5 : ajustements et planification

➤ Ajustement des phases 4 et 5

Thème	PHASE 4 (2020)			PHASE 5 (2021)	Réalisé
	Montant total prévisionnel	Montant total ajusté	Tx de réalisation Ajusté / Prév	Montant total prévisionnel	
Animation et coordination du programme	566 637	510 364	90%	566 116	En attente des données de réalisations Demande de mises à jours des actions réalisées / reportées / annulées pour le <u>18/12/2020</u>
Développement de pratiques agricoles respectueuses des zones humides et des milieux aquatiques	117 900	98 700	84%	117 900	
Etudes complémentaires ou préalables à des actions	226 385	157 928	70%	192 570	
Gestion et préservation des zones humides	270 639	209 246	77%	247 300	
Information, sensibilisation et communication	64 299	54 632	85%	36 277	
Restauration de la continuité écologique	804 460	645 660	80%	426 000	
Restauration et entretien des cours d'eau	558 573	453 742	81%	459 984	
Suivis scientifiques	117 925	92 325	78%	131 562	
Total général	2 726 818	2 222 597	82%	2 177 709	

→ Retard des actions prévues en P4

→ P5: Important nombre d'actions à réaliser : cumul des actions des P4 et P5

→ Reporter ou annuler les actions ? Prioriser les actions

→ Réflexion en fonction : faciliter mise en œuvre de l'action, MO, ME prioritaire

Explication du décalage

- Décalage dans le démarrage en P1 : autorisation en juin 2017
→ **Phase 1 : 6 mois**
- Réforme territoriale (2016-2018)
- Défaut d'application de la réglementation (ex : continuité écologique)
- Aléas climatiques : sécheresse → perturbation des suivis piscicoles
- Impondérable propre à chaque MO
- Difficultés de mise en œuvre de certaines actions
- Crise sanitaire liée au COVID (2020)
- Elections 2020
- Disponibilité des entrepreneurs


Planification de la fin de Sources en action 2

1^{er} décembre 2020
Mises à jour OSCTMA
des réalisations et
montants de 2019 (P3)


18 décembre 2020
Mises à jour OSCTMA des
réalisations et montants
de 2020 (P4) et des
ajustements de 2021

Juin 2021
Limite de dépôt des
demandes de subvention

Septembre 2022
Objectif : achèvement des
réalisations des actions de SEA2

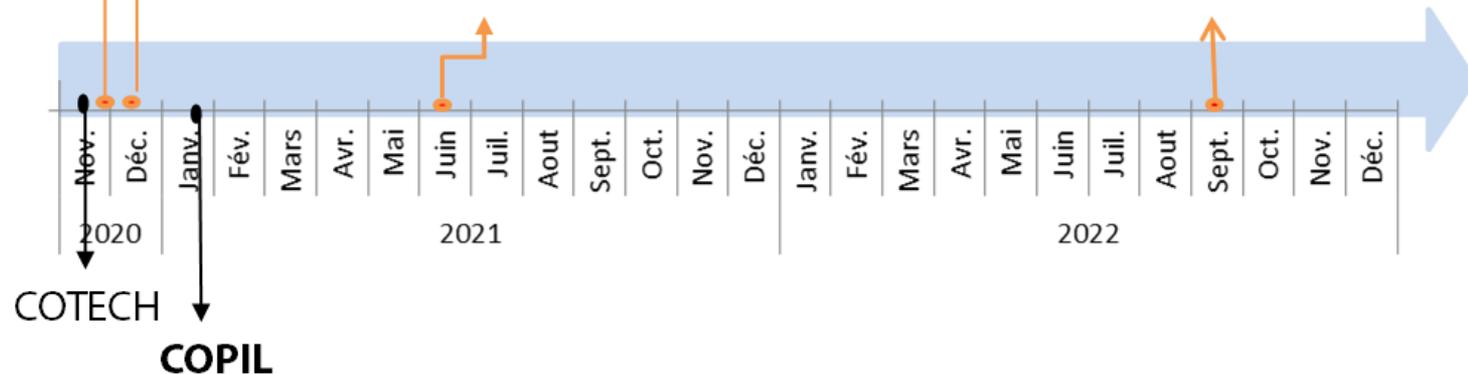

Contrat Territorial - Source en Action 3

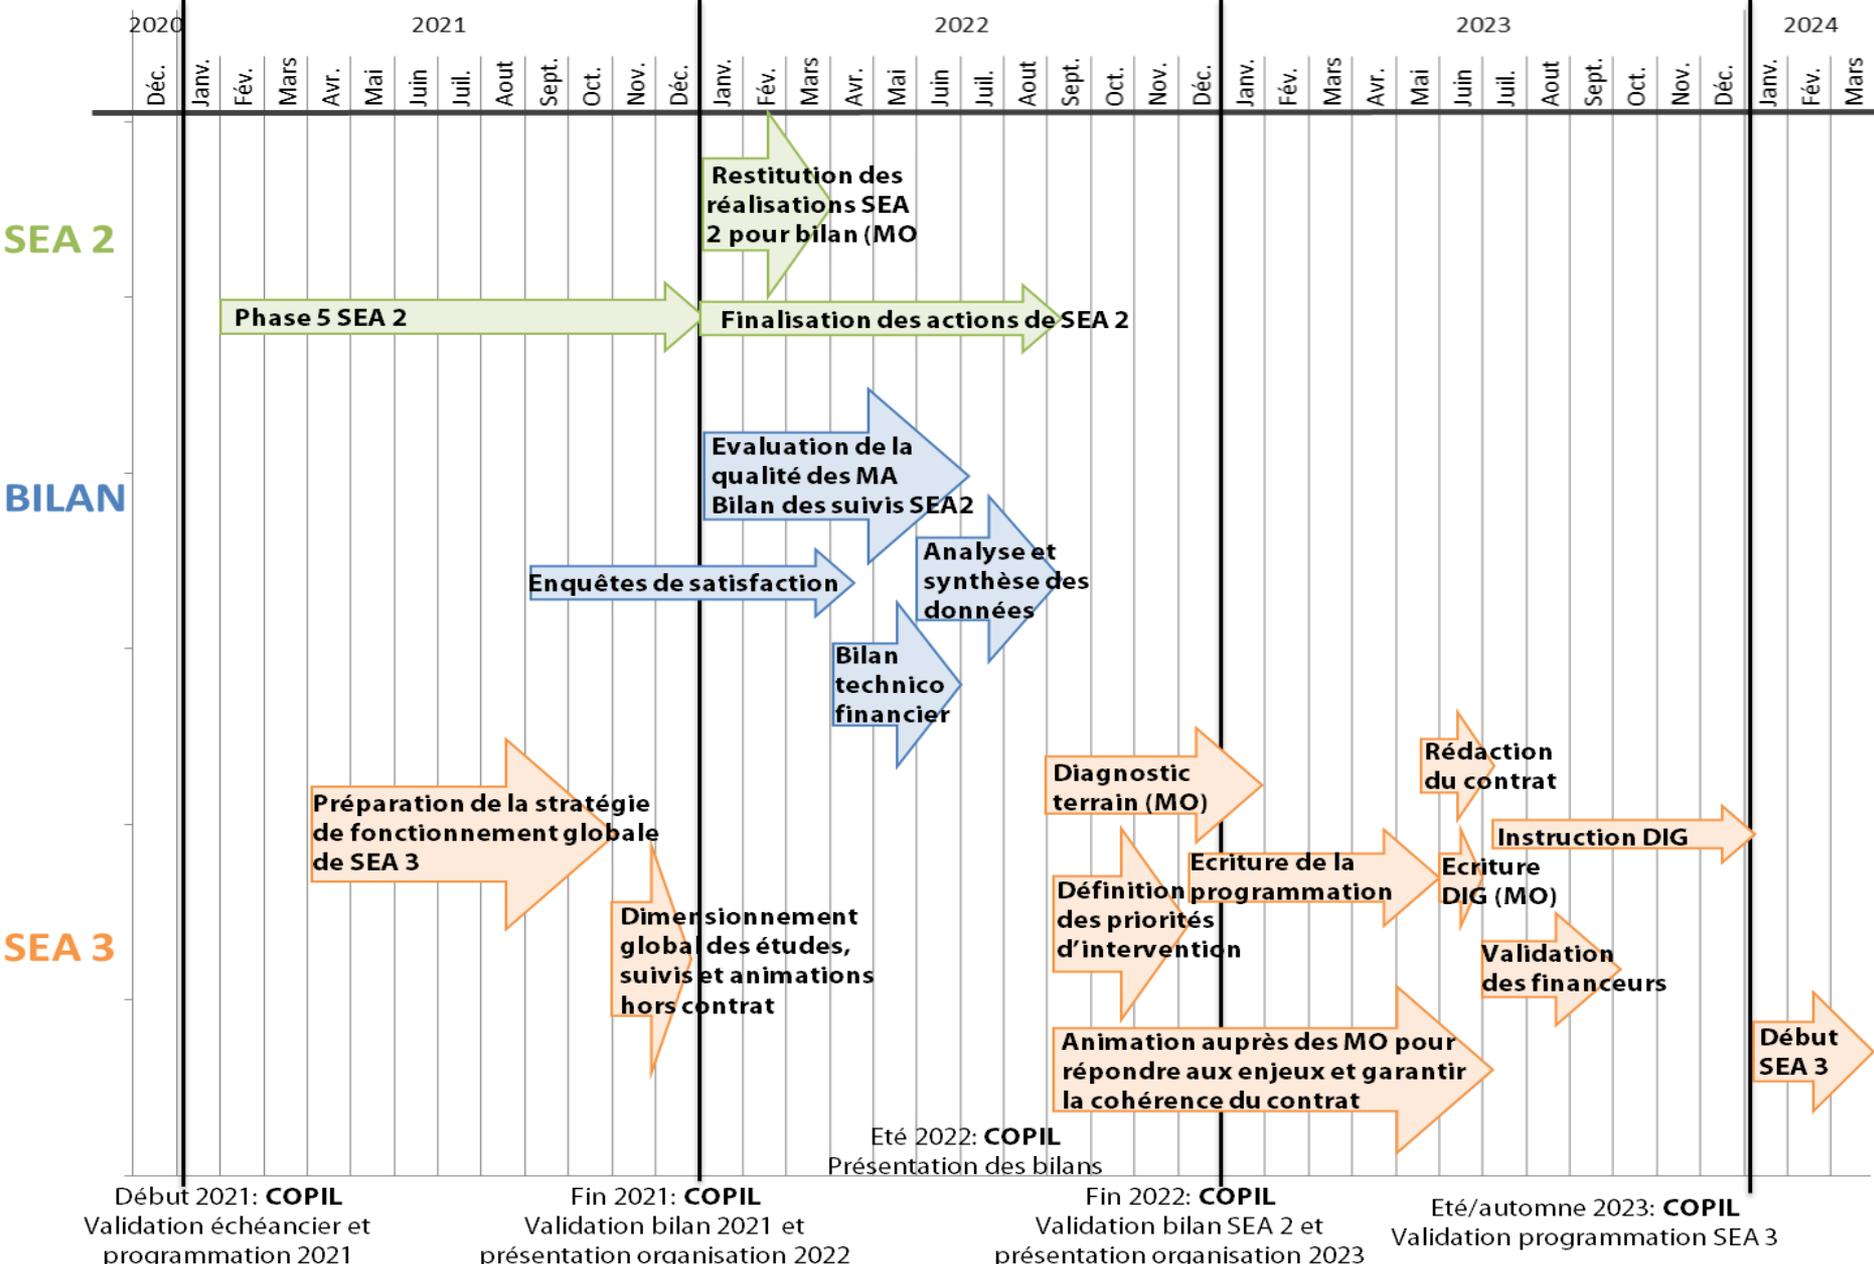

Début 2021: COPIL
Validation échéancier et programmation 2021

Fin 2021: COPIL
Validation bilan 2021 et présentation organisation 2022

Fin 2022: COPIL
Validation bilan SEA 2 et présentation organisation 2023

Été/automne 2023: COPIL
Validation programmation SEA 3

Journées d'échanges en faveur d'une transversalité technique et scientifique

➤ Formation « gestion de l'herbe » (05/2020) → REPORTE en 2021 cause COVID

- Réunion de préparation le 05/03/2020
- A destination des techniciens de Sources en Action
- Formateurs : CIVAM, Chambre d'Agriculture et CEN Nouvelle Aquitaine
- ½ journée en salle et ½ journée sur le terrain

- Réflexion sur une 2nde journée « Question de l'eau à l'échelle de l'exploitation »


➤ Commission scientifique (06/10/2020)

- Espace de présentation et d'échanges en lien avec des projets scientifiques
 - Acquisition de connaissances
 - Conduite d'expérimentation
 - Réalisation de suivi

- Diverses thématiques: suivis biologiques, qualité chimique des eaux, hydrologie, changements climatiques, ...


Etat d'avancement des avenants 1 et 2

- 28 structures signataires
 - 24 signatures reçues
 - 4 signatures non reçues (*en cours d'envoi*)



Prochaines échéances

- **Mises à jour données OSCTMA**
 - 1^{er} décembre 2020 : mises à jour des données 2019 (P3)
 - 18 décembre 2020 : mises à jour des données 2020 (P4) + ajustement des actions et budget de 2021 (P5)
- Janvier 2021: **Recueil des réalisations de 2019**
- Janvier 2021 : **COPIL**
 - Validation des ajustement des réalisations en P4 et P5
 - Planification SA 3
- Processus de dépôt de demandes des subventions

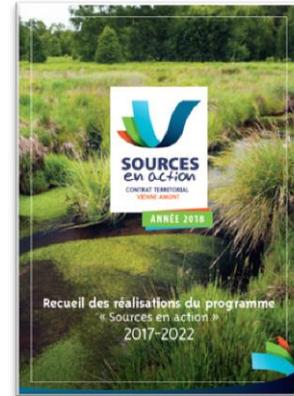

Questions → Réponses



SOURCES
en action

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT

www.sourcesenaction.fr



Hélène THURET

05 55 06 39 42

h.thuret@eptb-vienne.fr



Camille GAUBERT

05 55 96 97 01

c.gaubert@pnr-millevaches.fr



SOURCES
en action

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT

