



SOURCES en action

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT
2024-2026

COPIL

27 novembre 2025
Eymoutiers





ORDRE DU JOUR

- Rappels : historique du contrat et territoire
- Bilan des années 2024 et 2025 (phases 1 et 2)
- Programmation 2026 (phase 3) **A valider**
- Points divers
 - Mise en lumière de trois maîtres d'ouvrage
 - Projet Natalie
 - Prochaines échéances




Rappels

TERRITOIRE & HISTORIQUE DU CONTRAT

TERRITOIRE DU CONTRAT

- Têtes de bassin de la Vienne
 - Zones humides : 22 000ha –10-15% du territoire
 - Tourbières au Sud-Est
 - Réseau hydrographique : forte densité (1,53 km/km²) + long linéaire (3 300 km)
 - Plans d'eau : 1055 –1,2 % de la surface du territoire
- Occupation du sol : Dominance de forêts (60 %) et prairies (24%)
- Précipitations : gradient du sud au nord

- ➔ Milieu riche mais sensible et fragile.
- ➔ Milieu à restaurer et à protéger.



1 Région (Nouvelle-Aquitaine)
3 départements (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne)
91 communes
46 500 habitants

L'HISTORIQUE ET CONTEXTE

- **Contrat Territorial** : outil financier de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
- **Objectifs** : maintien ou restauration du bon état écologique DCE des masses d'eau
- **Double coordination** : EPTB Vienne - PNR ML





Contrat territorial n°3 – 2024-2029

Période 1: 2024-2026

BILAN PROVISOIRE DES ANNÉES 2024-2025



UNE MISE EN ŒUVRE PERTURBÉE

■ 2024


- Atteinte des plafonds des dépenses du 11^{ème} programme de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
- Évolution du règlement d'intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine
- Retard de la validation de certaines DIG
- Météo pluvieuse

■ 2025

- Restriction de l'enveloppe financière de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne qui a contraint à prioriser certaines opérations
- Arrêtés sécheresses

BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2024-2025

- GLOBAL

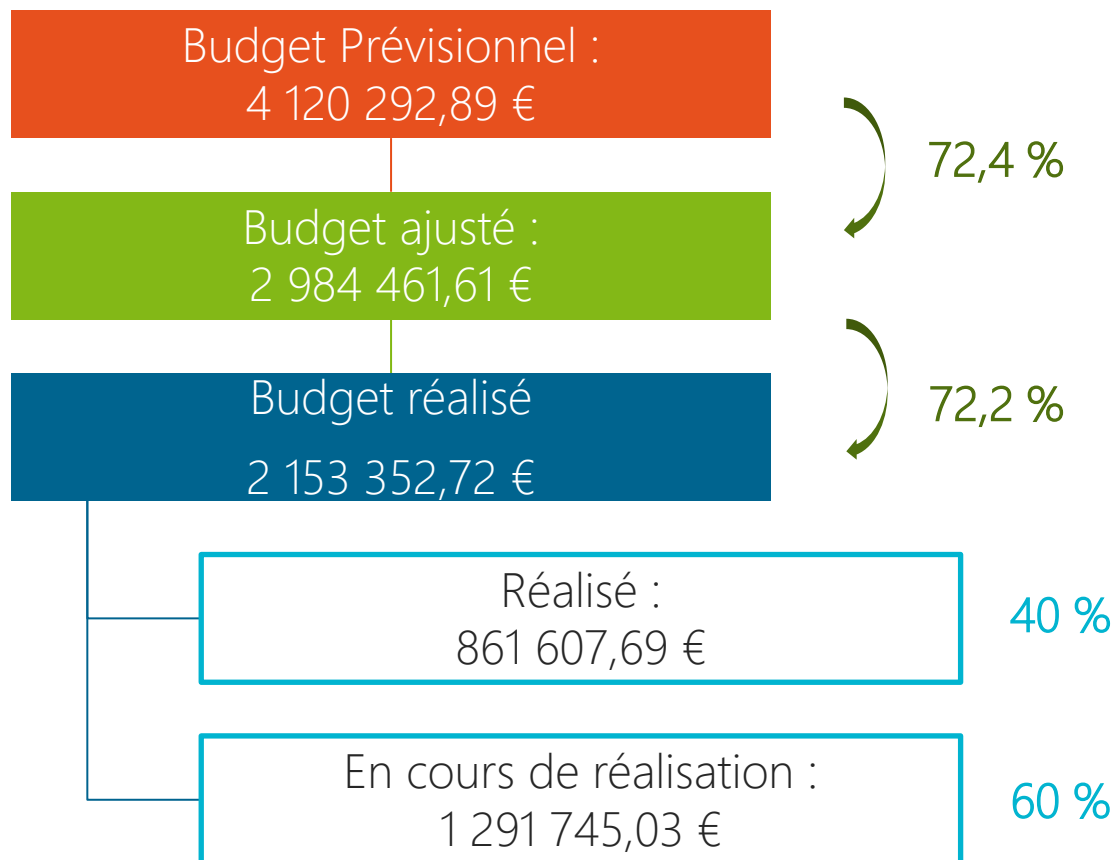

* Les budgets présentés dans ce bilan ne sont pas définitifs car des opérations sont encore en cours de réalisation et n'ont pas été soldées.
Données récoltées en novembre 2025

BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2024-2025 – PAR THÈMES

- Sur la base de 2 153 352,72€ (réalisé, en cours)


Par thématiques (2024 + 2025)	Prévisionnel (signature contrat)	Ajusté (juillet/octobre 2024)	Réalisé ou en cours (novembre 2025)	
Forêt	421 326,00	119 591,00	60 788,00	2,8
Animation agricole	106 978,56	56 158,28	18 619,21	0,9
Continuité écologique et plans d'eau	697 900,00	563 246,00	249 681,40	11,6
Zones humides	430 680,00	298 253,15	166 566,00	7,7
Travaux de restauration (morphologie agricole et hors agricole, ripisylve, EEE)	1 086 407,00	604 180,10	450 777,15	20,9
Suivi	242 961,00	204 134,70	156 213,95	7,2
Coordination et animation	1 011 948,00	1 016 301,00	986 090,01	45,7
Sensibilisation et communication	122 092,33	122 597,38	64 617,00	3,0
Total	4 120 292,89	2 984 461,61	2 153 352,72	100 %

* Les budgets présentés dans ce bilan ne sont pas définitifs car des opérations sont encore en cours de réalisation et n'ont pas été soldées.
Données récoltées en novembre 2025

BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2024-2025 – PAR THÈMES

➤ Sur la base du budget de 2 153 352,72 € (réalisé, en cours)

- Forêt
- Animation agricole
- Continuité écologique et plans d'eau
- Zones humides
- Travaux de restauration
- Suivis
- Coordination et animation
- Sensibilisation et communication


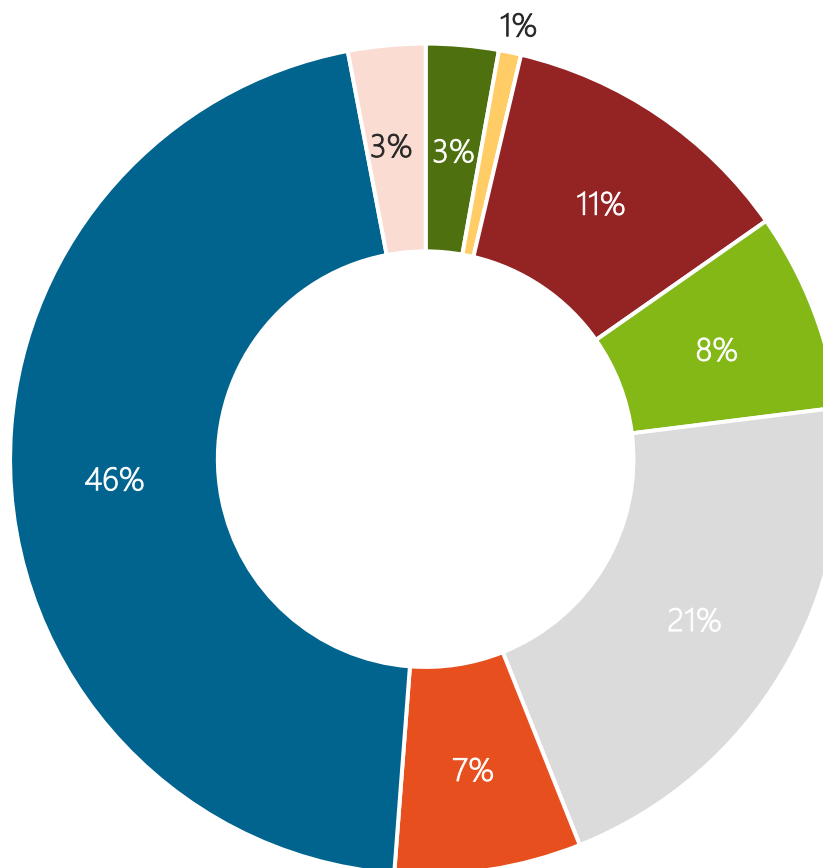


* Les budgets présentés dans ce bilan ne sont pas définitifs car des opérations sont encore en cours de réalisation et n'ont pas été soldées.

Données récoltées en novembre 2025

BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2024-2025 – PAR TYPE DE MASSES D'EAU

- Sur la base du budget de 2 153 352,72 € (réalisé, en cours)

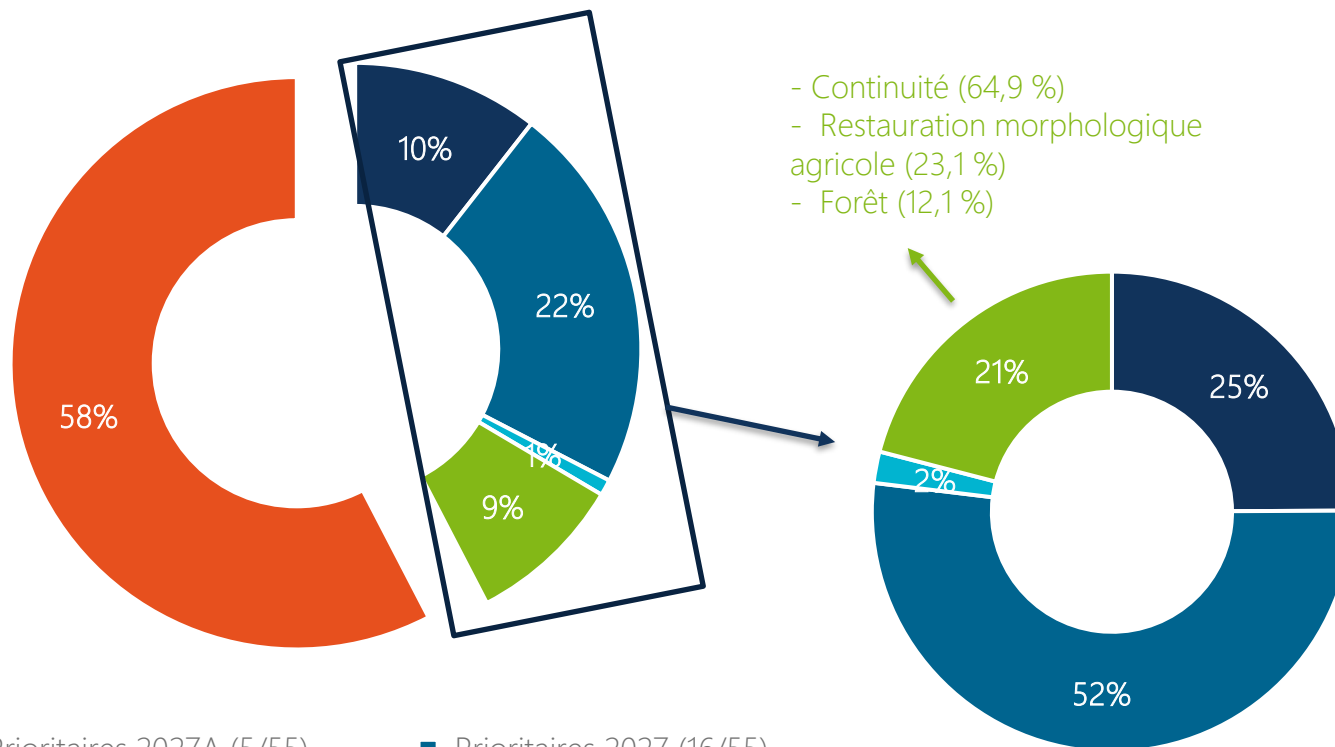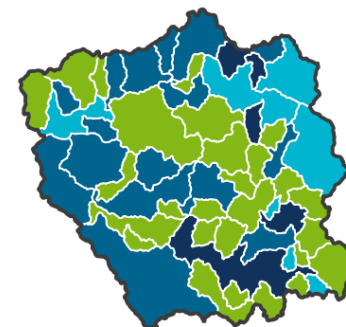



79 % sur des masses d'eau prioritaires

* Les budgets présentés dans ce bilan ne sont pas définitifs car des opérations sont encore en cours de réalisation et n'ont pas été soldées.

Données récoltées en novembre 2025

BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2024-2025 – SELON LES THÉMATIQUES CŒUR DE CIBLE

- Sur la base du budget ajusté de de 2 153 352,72 €

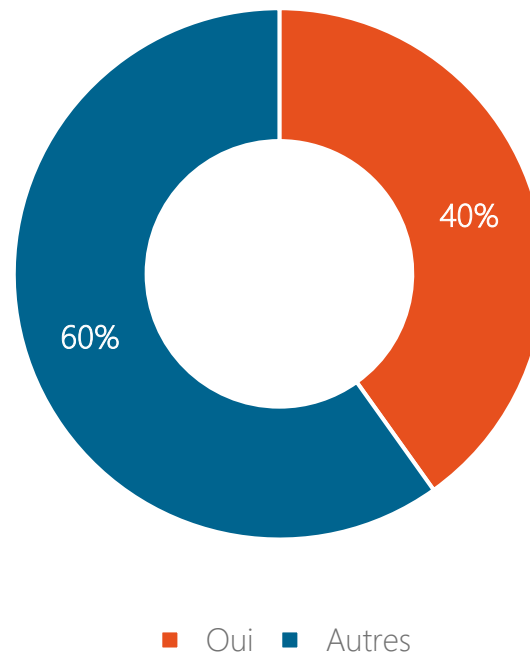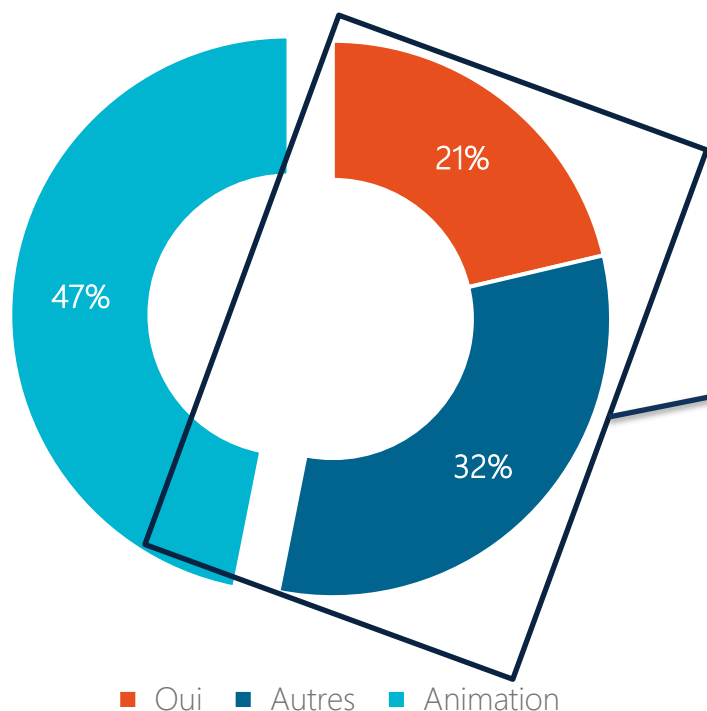

40 % sur des thématiques cœur de cible

* Les budgets présentés dans ce bilan ne sont pas définitifs car des opérations sont encore en cours de réalisation et n'ont pas été soldées.
Données récoltées en novembre 2025



DE NOMBREUX PROJETS HORS FINANCEMENT DU CONTRAT

- Projet européen Natalie – [EPTB Vienne, PNR ML, SABV](#)
- Étude R&D « fonctionnalités des têtes de bassin de la Vienne » – [BRGM, EPTB Vienne](#)
- Programme pour les propriétaires forestiers de Monts et Barrages – [PETR MB, CNPF](#)
- Restauration de tourbières et zones humides : Rebière Nègre, Prugnolas... – [CEN](#)
- Restauration de la continuité écologique :
 - Plans d'eau : Chavanat – [Fondation des pêcheurs, CSO...](#)
 - Ouvrages transversaux : La Varache + 1 autre projet en cours – [application de la règle 8 du SAGE Vienne...](#)
- Stratégie « plans d'eau » – [Animation conjointe PETR MB et EPTB Vienne](#)
- Natura 2000
- Suivis thermiques – [Fédérations de pêche](#)
- *Liste non exhaustive...*



Contrat territorial n°3 – 2024-2029

Période 1: 2024-2026

PROGRAMMATION AJUSTÉE 2026





DES CONTRAINTES ENCORE PRÉSENTES

- Répercussions des précédentes phases
 - Nombreux reports des années 2024 et 2025
 - Des travaux encore en cours de réalisation

- De nouvelles évolutions
 - Des mobilités d'agents au sein des structures
 - Des contraintes budgétaires et des évolutions probables des subventions

PROGRAMMATION 2026 AJUSTÉE

- GLOBAL

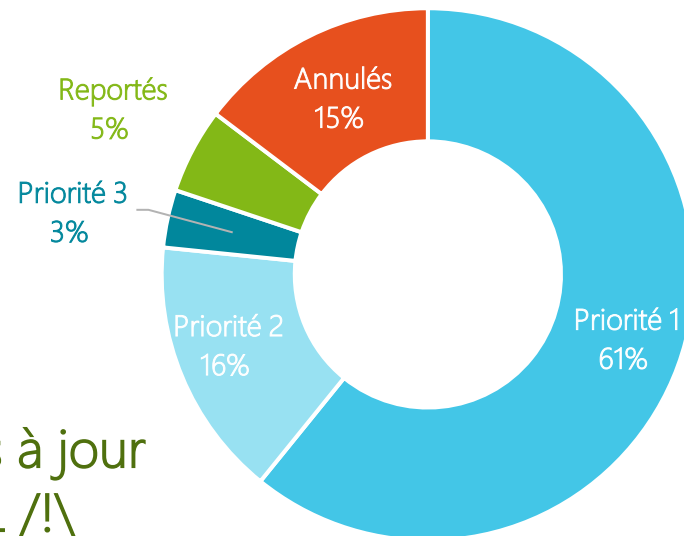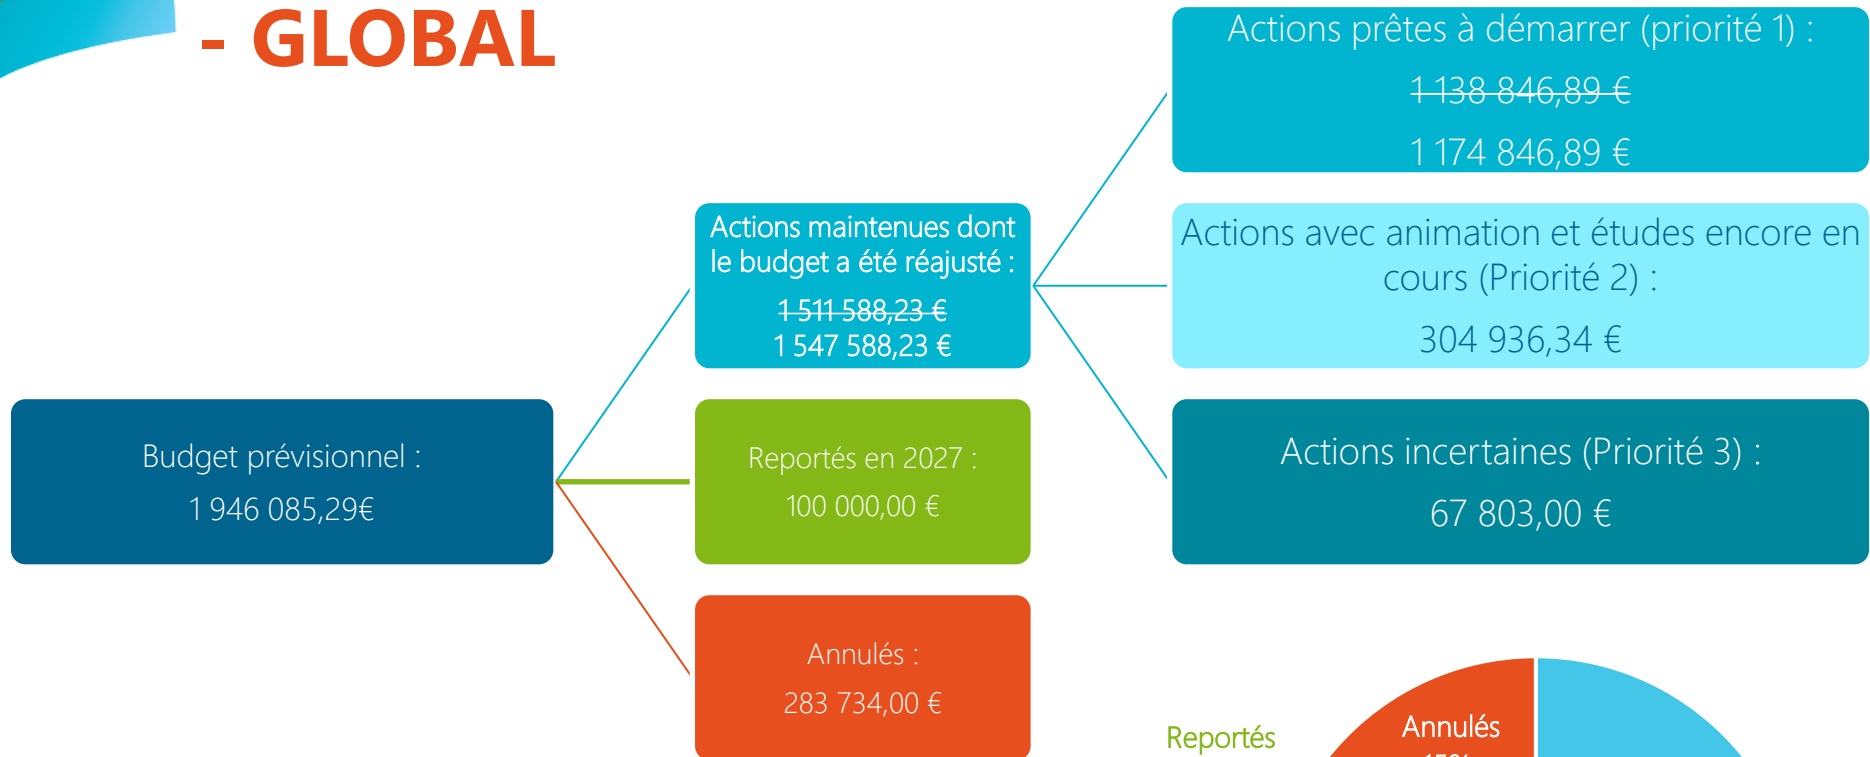


/!\ Graphique mis à jour après le COPIL /!\

PROGRAMMATION 2026 AJUSTÉE – PAR THÈMES

➤ Sur la base du budget ajusté de ~~1 511 588,23 €~~ 1 547 588,23 €

/!\ Graphique mis à jour
après le COPIL /!\

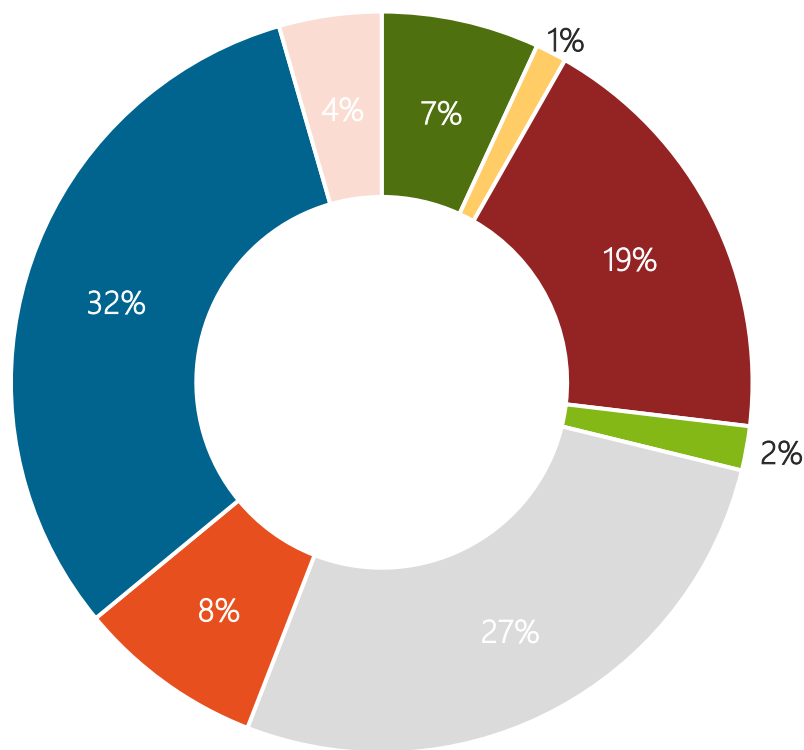

- Foret
- Continuité
- Autres restauration
- Coordination et animation générale




- Agricole
- Zones humides
- Suivis
- Sensibilisation et communication

PROGRAMMATION 2026 AJUSTÉE – PAR TYPE DE MASSES D'EAU

- Sur la base du budget ajusté de ~~1 511 588,23 €~~ 1 547 588,23 €



/!\ Graphiques mis à jour
après le COPIL /!\

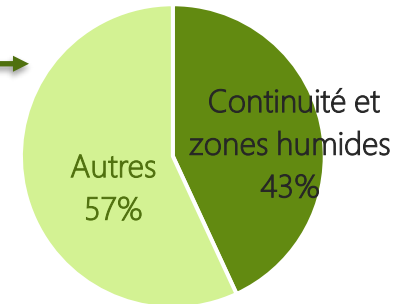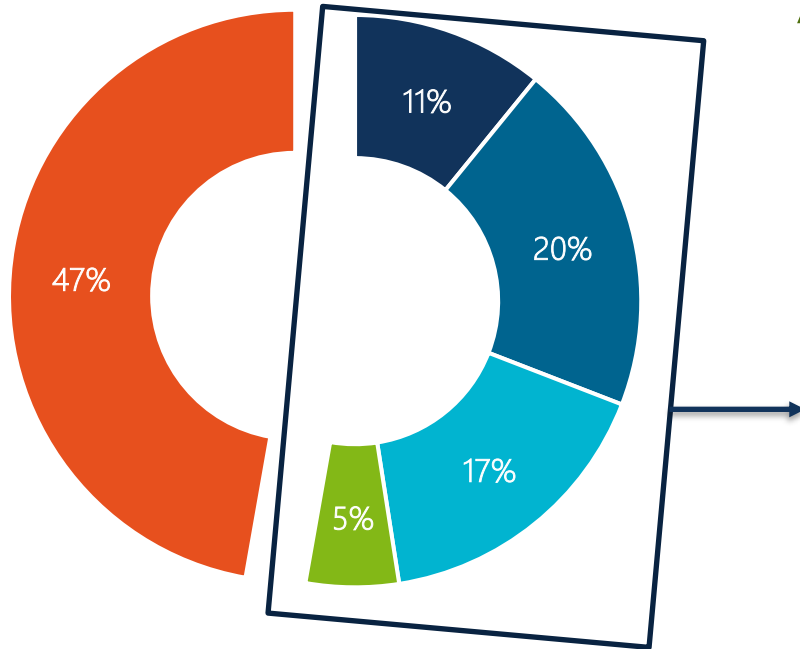


- Prioritaires 2027A (5/55)
- Prioritaires 2027 (16/55)
- Prioritaires à risque (7/55)
- Non prioritaire (27/55)
- Non concerné

79 % sur des masses d'eau prioritaires

BILAN FINANCIER PROVISOIRE


– SELON LES THÉMATIQUES CŒUR DE CIBLE

- Sur la base du budget ajusté de ~~1 511 588,23 €~~ 1 547 588,23 €

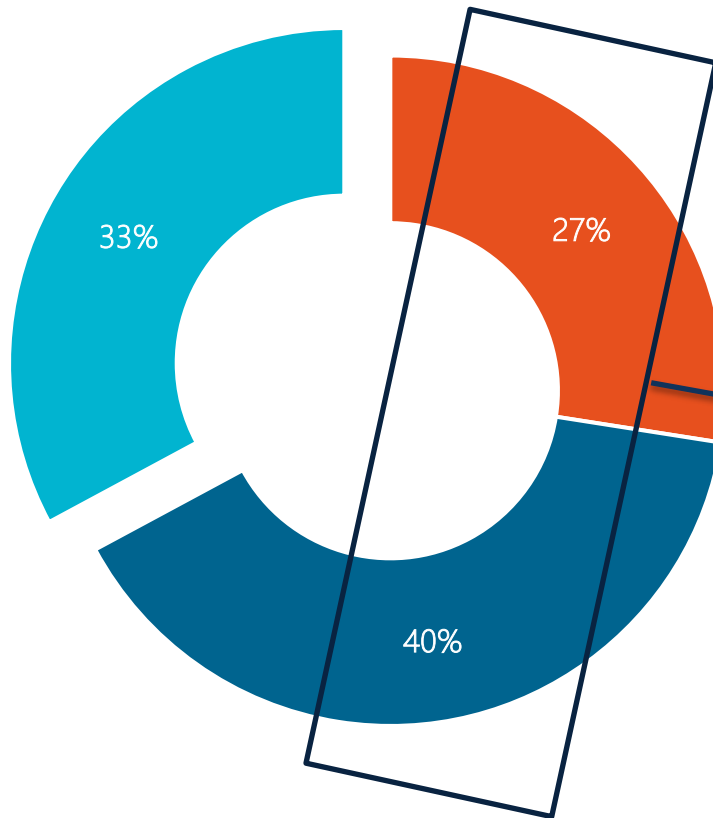

■ Oui ■ Autres ■ Animation

/!\ Graphiques mis à jour
après le COPIL /!\

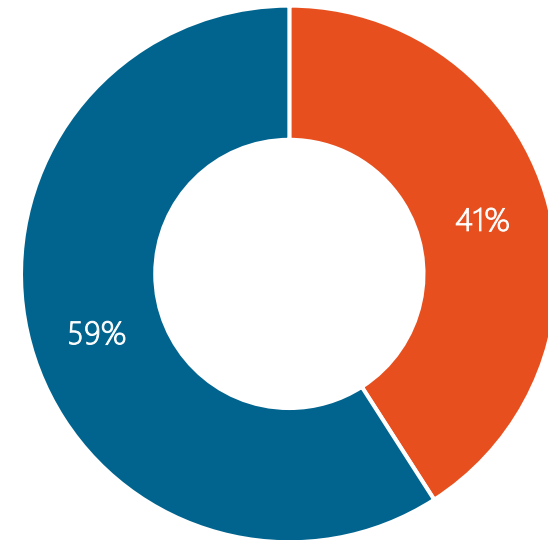

■ Oui ■ Autres

41 % sur des thématiques cœur de cible

PROGRAMMATION 2026 DÉTAILLÉE - PAR THÉMATIQUE

➤ Coordination

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
EPTB - PNR	86 142,00 €	+ 6,9 % 92 065,31 €	Modifications internes à l'EPTB

➤ Communication générale

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
EPTB – CSO - TLMV	30 094,17 €	+ 26,8 % 38 167,00 €	↑ TLMV

➤ Sensibilisation

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
LNE	23 452,00€	+ 32,3 % 31 022,00€	Diminution ATE. Augmentation de 5 à 6 projets d'écoles.

PROGRAMMATION 2026 DÉTAILLÉE

- PAR THÉMATIQUE

➤ Animation générale

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CGS – CSO – HCC/V2M – CEN NA – FD23 – PETR – PNR – SABV	427 619,00 €	- 7,5 % → 395 552,00 €	CSO ↓ / PETR et SABV ↑ Fusion de HCC et V2M (délégation)

➤ Animation forestière

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
ONF – CRFP	97 403,00 €	- 71,9 % → 27 403,00 €	CRPF : Annulation de l'action

➤ Animation agricole

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
Bio NA, PNRML, SABV	61 589,28 €	- 66,1 % → 20 864,28 €	Bio NA : Réduction actions (RH) SABV : Annulation PNR : Ajout d'une ligne pour les diagnostics dans le cadre des MAEC ZH

PROGRAMMATION 2026 DÉTAILLÉE

- PAR THÉMATIQUE

➤ Suivis /!\ Données mises à jour après le COPIL /!\

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CEN NA – FD23 – GMHL – LNE – LPO – MEP19 – PNRML + FD19	139 324,50 €	-27,0 % -9,8 % 101 704,00 € 125 704,00 €	CEN NA : Suppression des suivis LIGERO GMHL ↓ : Diminution du nombre de chantiers accompagnés LNE ↑ : ajustement du volume horaire pour réaliser les actions LPO et FD23 ↓ : ajustements à la marge MEP19 ↓ : 15 stations FD19 : + 8 stations

➤ Études

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
SABV	77 000,00 €	77 000,00 €	Aucune

PROGRAMMATION 2026 DÉTAILLÉE

- PAR THÉMATIQUE

➤ Acquisition zones humides

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CEN - SABV	78 828,00 €	0,00 €	Annulations
		- 100,0 %	

➤ Plan de gestion zones humides

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CEN	35 306,00 €	18 789,00 €	Annulation d'une partie.
		- 46,8 %	

➤ Travaux zones humides

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CEN – HCC – CGS – ONF	111 010,24 €	19 123,24 €	CEN : diminution en gardant CGS : annulation et décalage programmation 2025 HCC : annulation pou réattribution à de la continuité ONF : pas de changement
		- 89,2 %	



PROGRAMMATION 2026 DÉTAILLÉE

- PAR THÉMATIQUE

➤ Acquisition forêt

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel		Budget ajusté	Modifications
V2M - SABV	39 000,00 €		36 000,00 €	Diminution V2M

➤ Plan de gestion forêt

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel		Budget ajusté	Modifications
SABV	8 400,00 €		8 400,00 €	

➤ Travaux forêt

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel		Budget ajusté	Modifications
ONF	26 732,10 €		26 732,10 €	

PROGRAMMATION 2026 DÉTAILLÉE - PAR THÉMATIQUE

➤ Travaux continuité et plans d'eau

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CGS – CSO – HCC – PETR – SABV	251 650,00 €	 216 767,90 €	CGS ↓ : Programmation de 2025 CSO = HCC ↑ : changement de type d'action sans augmentation du budget global de HCC PETR ↑ : augmentation des budgets pour les actions ciblées SABV ↓ : report des actions en 2027 et annulation opérations embâcles

➤ Travaux de restauration morphologique agricole

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CGS – CSO – V2M –PETR – SABV + FD19	372 585,00 €	 261 687,30 € 273 687,30 €	CGS ↑ : suppression programmation 2026 et décalage programmation 2025 CSO ↓ : économie sur les coûts V2M ↓ : ajustement des actions et coûts PETR ↓ : ajustement des actions et coûts SABV =

/!\ Données mises à jour après le COFIL /!\

PROGRAMMATION 2026 DÉTAILLÉE - PAR THÉMATIQUE

➤ Travaux de restauration morphologique hors agricole

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CGS – CSO – HCC – FD23	21 950,00 €	 98 311,10 €	HCC : ↑ changement de type d'action sans augmentation du budget global de HCC CGS ↑ suppression programmation 2026 et décalage programmation 2025 CSO ↑ : réajustement actions et coûts FD23 ↑ : issus des reports de 2025

➤ Autres travaux de restauration (embâcles, ripisylve, EEE)

Maîtres d'ouvrage	Budget prévisionnel	Budget ajusté	Modifications
CGS – HCC – SABV	58 000,00 €	 42 000,00 €	CGS ↓ : suppression programmation 2026 et décalage programmation 2025 HCC ↓ : changement de type d'action sans augmentation du budget global de HCC SABV =

PROGRAMMATION 2026 AJUSTÉE

– PAR THÉMATIQUES

Thématiques	Budget prévisionnel (signature contrat)	Budget ajusté (novembre 2025)	Evolution (%)
Coordination et animation générale	513 761,00	487 617,31	- 5,1
Sensibilisation et communication	53 546,17	69 189,00	+ 29,2
Études	77 000,00	77 000,00	=
Suivis	139 324,50	125 704,00	- 9,8
Forêt (dont animation)	171 535,10	98 535,10	- 42,6
Animation agricole	61 589,28	20 864,28	- 66,1
Zones humides	225 144,24	37 912,24	- 83,2
Continuité	251 650,00	216 767,90	- 13,9
Travaux de restauration (dont agricoles)	452 535,00	413 998,40	- 8,5
Total	1 946 085,29	1 547 588,23	- 20,48

/!\ Données mises à jour après le COPIL /!\



VALIDATION DE LA PROGRAMMATION 2026 ?



Mise en lumière des maîtres d'ouvrage

PETR MONTS & BARRAGES



27 NOVEMBRE 2025



COPIL SOURCES EN ACTION


PETR DU PAYS MONTS ET BARRAGES

PETR DU PAYS MONTS ET BARRAGES


Territoire du PETR du Pays Monts et Barrages concerné par le CTVA

Légende


- Ville
- ▭ Périmètre du CTVA ou Sources en action
- ▭ Territoire GEMAPI du PETR
- ▭ périmètre du Pays Monts et Barrages
- tronçon hydrographique

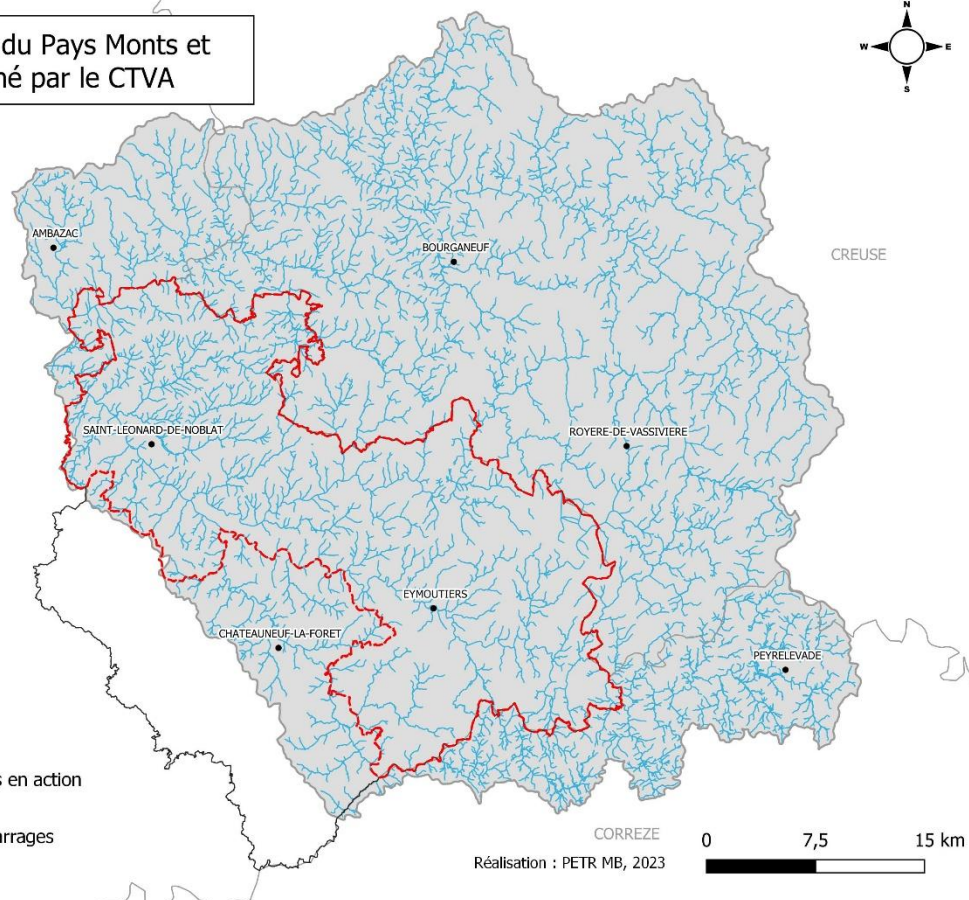

PROJET CONTINUITÉ : RUISSEAU DU ROC

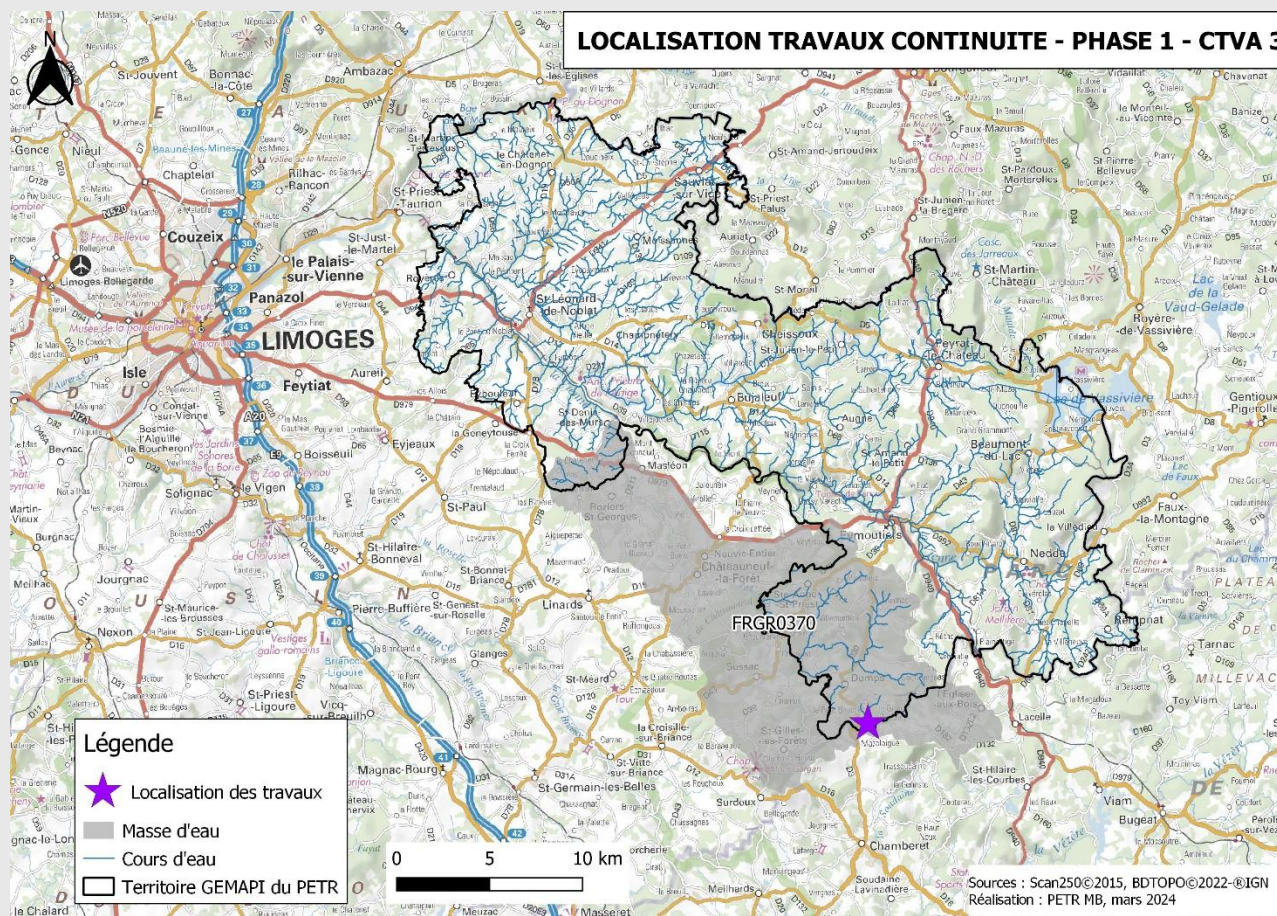

PROJET CONTINUITÉ : RUISSEAU DU ROC

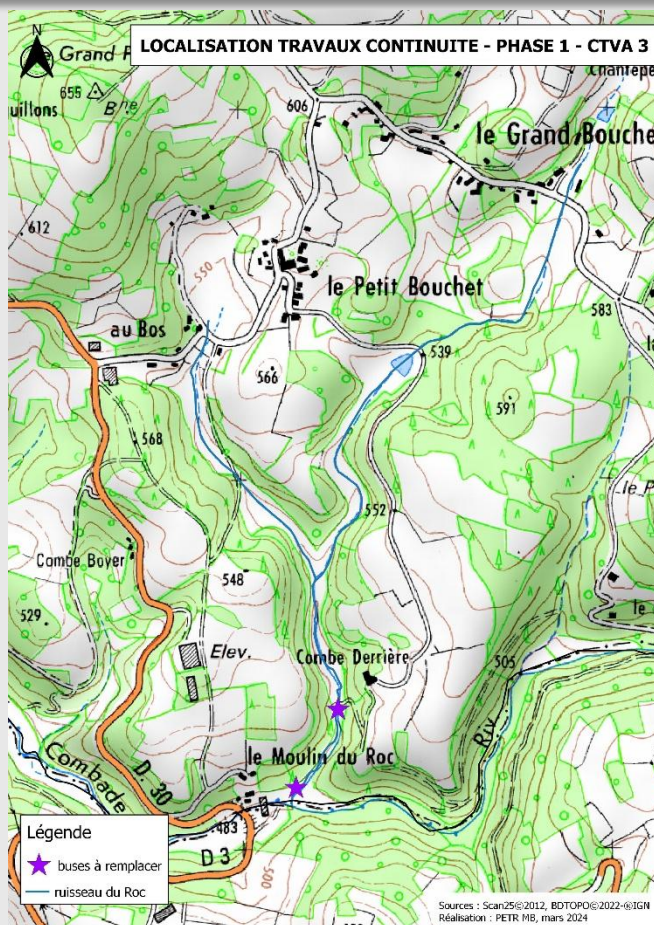

2 obstacles traités :

- ✓ 1 buse effacée sur une parcelle privée
- ✓ 1 buse remplacée sous un chemin communal

2 050 ml de ruisseaux réouverts

Partenaires techniques :

- ✓ AAPPMA du bassin de la Combade
- ✓ Fédération de pêche 87
- ✓ MEP 19
- ✓ PNR de Millevaches



PROJET CONTINUITÉ : RUISSEAU DU ROC

Montant total du chantier : **18 840 € TTC (SATPA)**



Buse parcelle privée avant travaux



Buse parcelle privée après travaux



PROJET CONTINUITÉ : RUISSEAU DU ROC

Partenaires financiers : **AELB, AAPPMA, commune de Doms**




Buse sous chemin communal avant travaux



Buse sous chemin communal après travaux

PROJET CONTINUITÉ ET AGRICOLE : RUISSEAU DE LAVAUD

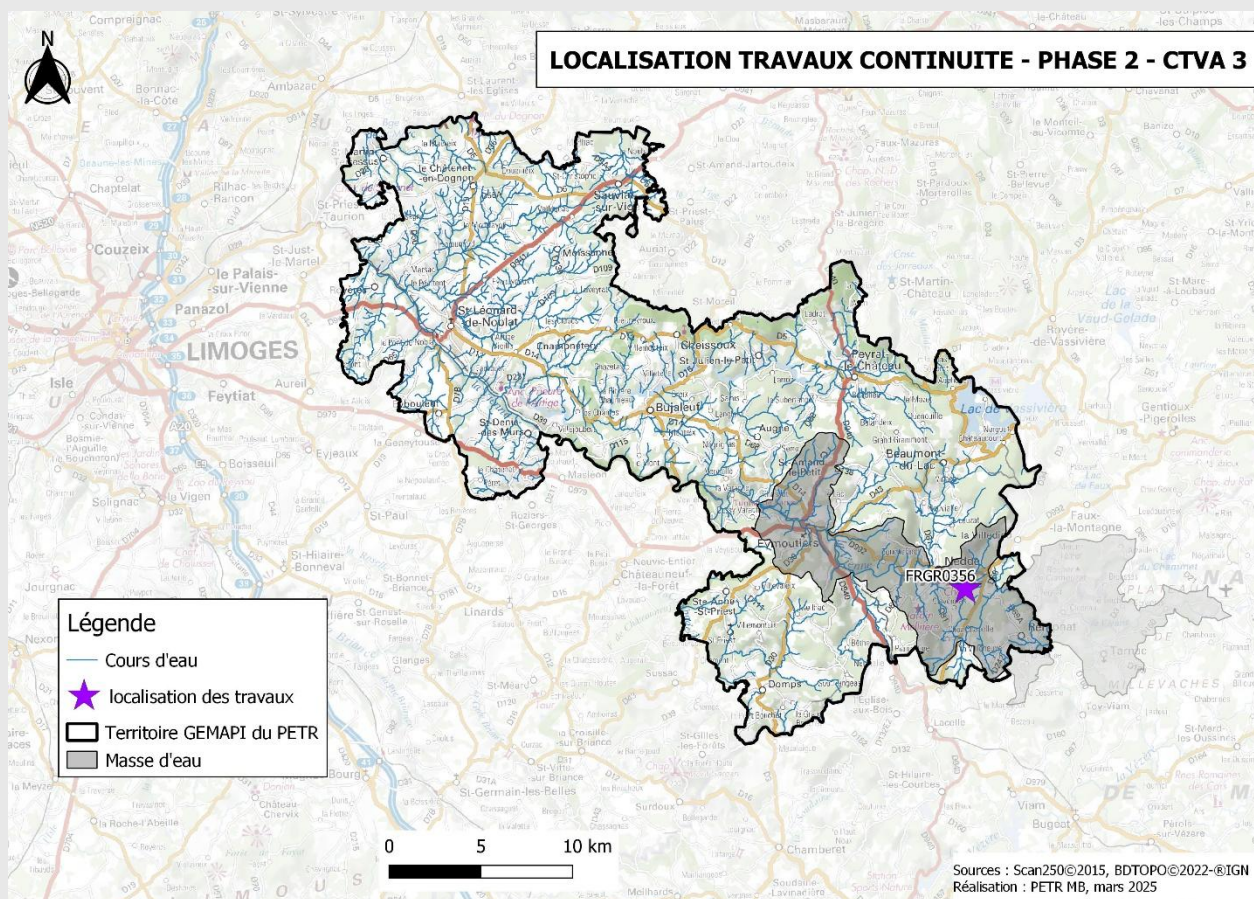

PROJET CONTINUITÉ ET AGRICOLE : RUISSEAU DE LAVAUD



1 obstacle traité :

- ✓ 1 buse remplacée sous une route communale

2 230 ml de ruisseau réouverts

Partenaires techniques :

- ✓ AAPPMA Vienne amont la Pelaude
- ✓ Fédération de pêche 87
- ✓ MEP 19



PROJET CONTINUITÉ ET AGRICOLE : RUISSEAU DE LAVAUD

Amont buse

Montant total du chantier : **38 573, 40 € TTC (DUSSOCHAUD)**






PROJET CONTINUITÉ ET AGRICOLE : RUISSEAU DE LAVAUD

Aval buse

Partenaires financiers :

- ✓ AELB
- ✓ RNA
- ✓ AAPPMA
- ✓ Commune de Nedde

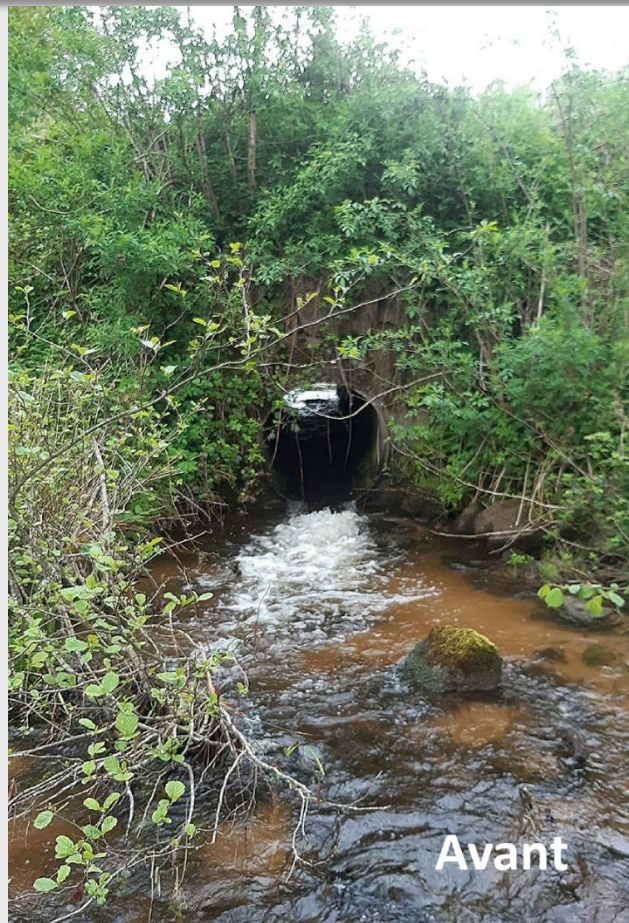

PROJET CONTINUITÉ ET AGRICOLE : RUISSEAU DE LAVAUD


Parcelles amont/aval :

- ✓ **6 franchissements : 26 880 € TTC (SATPA)**
- ✓ **2 510 m de clôture : 8 075, 10 € TTC (ALEFPA ESAT)**

Montant total du chantier : **34 955, 10 € TTC**

Partenaires financiers :

- ✓ **AELB**
- ✓ **RNA**
- ✓ **AAPPMA**
- ✓ **propriétaire**

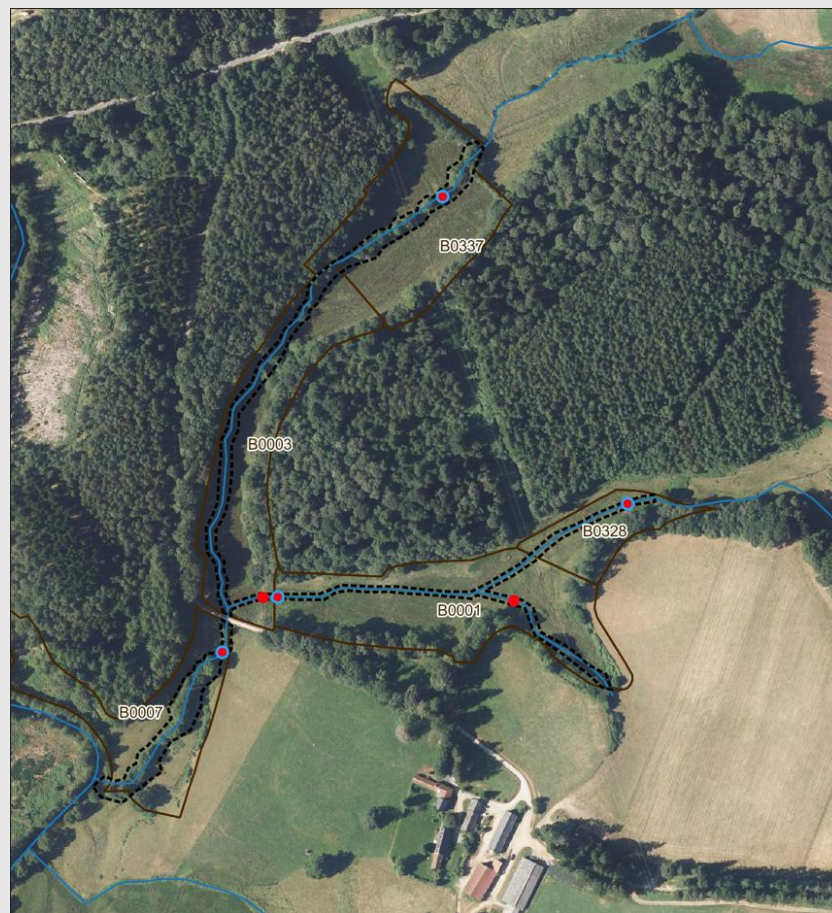



PROJET CONTINUITÉ ET AGRICOLE : RUISSEAU DE LAVAUD



Avant le passage à gué



Après le passage à gué




PROJET CONTINUITÉ ET AGRICOLE : RUISSEAU DE LAVAUD



clôture

PROJET ÉTANG : RUISSEAU DE LA BOBILANCE

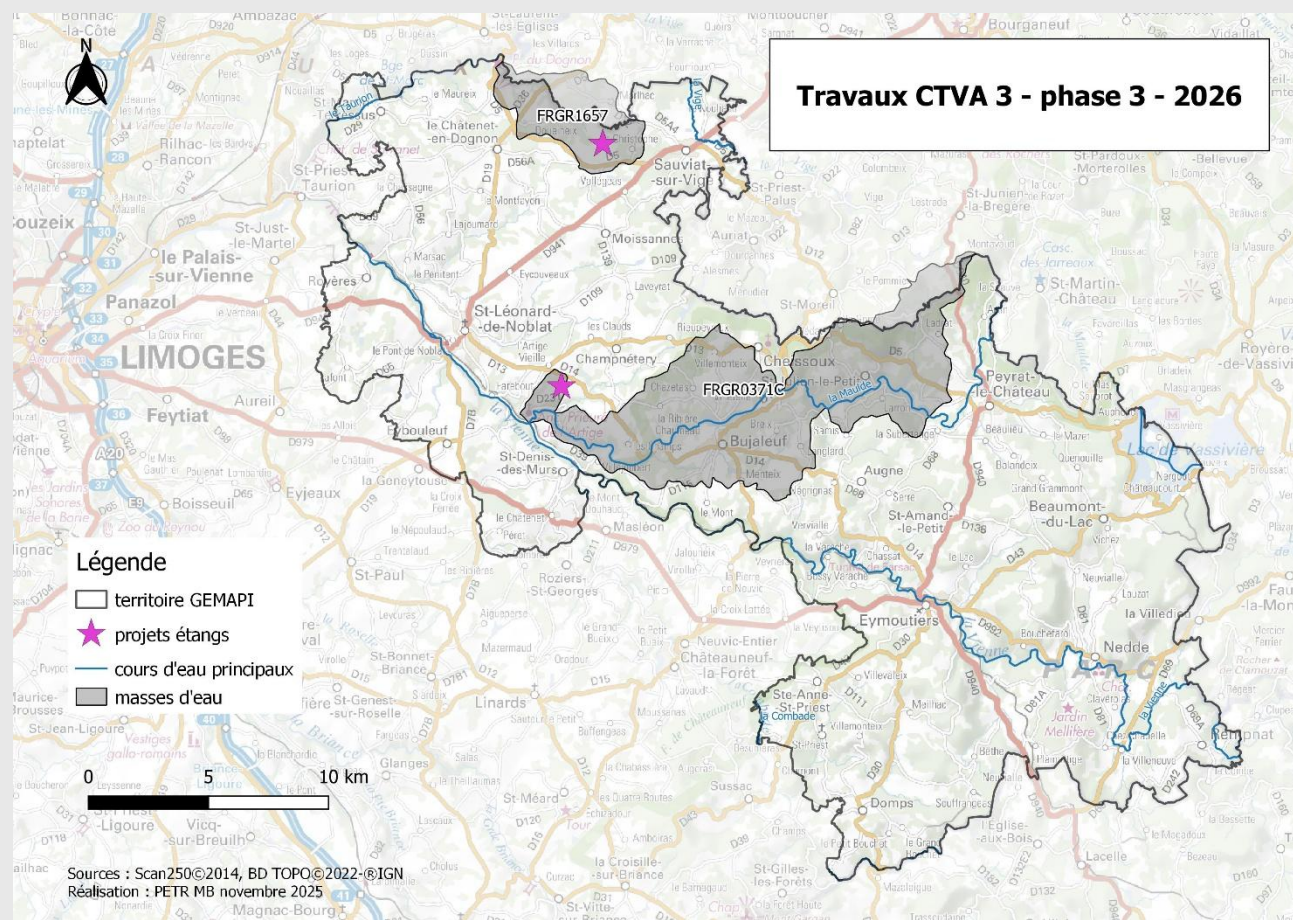

PROJET ÉTANG : RUISSEAU DE LA BOBILANCE

Etang + pont cadre : **41 247 € TTC**


Aménagements agricoles : **34 926 € TTC**

- ✓ 3 points d'abreuvements
- ✓ 4 franchissements
- ✓ 420 m de clôture

Total estimatif du chantier : **76 173 € TTC**

Partenaires financiers :

- ✓ AELB ?
- ✓ RNA ?

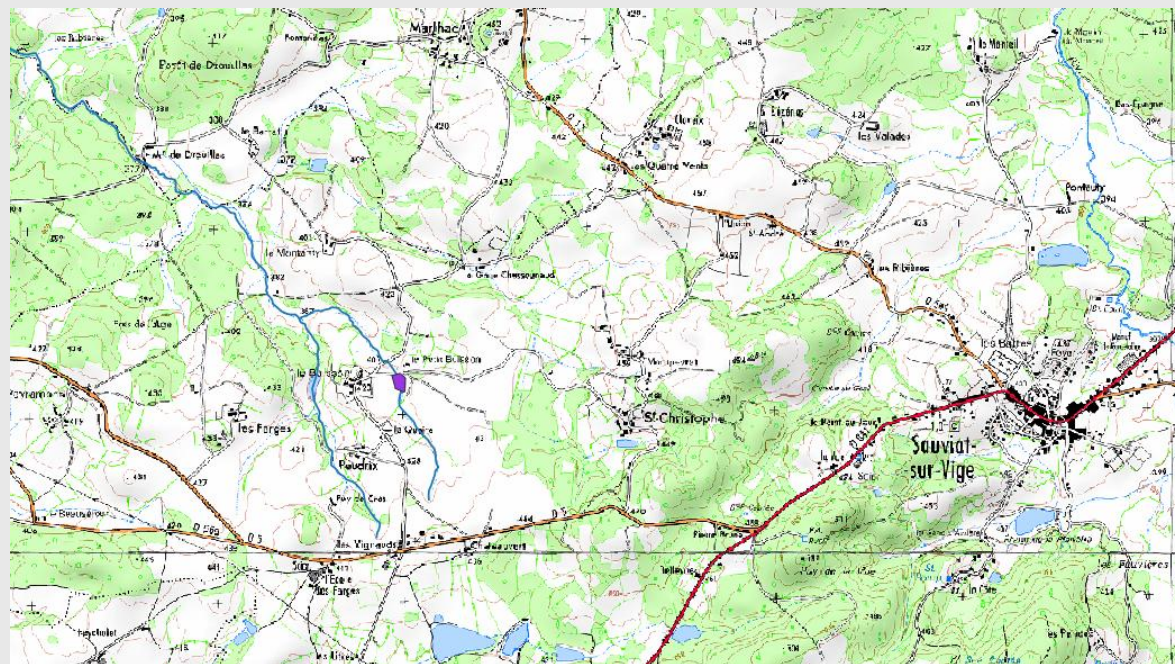



Mise en lumière des maîtres d'ouvrage

TÉLÉMILLEVACHES



➤ Nouveau site internet

<https://sourcesenaction.fr/>

- Médiathèque pour télécharger les documents, visionner les vidéos...
- Espace privé : diaporamas et comptes-rendus de réunions...



Mise en lumière des maîtres d'ouvrage

CC CREUSE SUD OUEST





Contrat Territorial Milieux Aquatiques Vienne amont “Sources en action”

Comité de pilotage du 27 novembre 2024



SOMMAIRE



SECTION

01

Territoire de
CC CSO

SECTION

02

Actions
réalisées

SECTION

03


Projets 2026

01

Territoire
CC CSO



Territoire CC Creuse Sud-Ouest

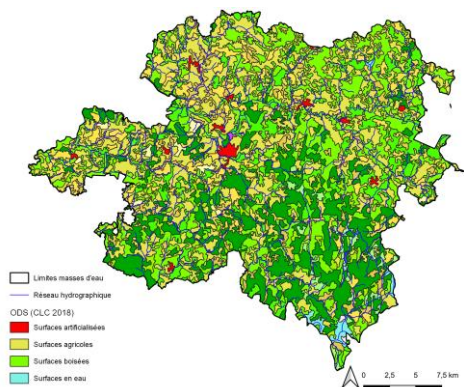

56 % territoire = surfaces boisées
42 % = surfaces agricoles avec 70 % de prairies et 30 % de cultures

± 850 ouvrages dont 394 ouvrages inscrits au ROE => 61 % = barrages (étangs, lacs, ...) et seuils transversaux


750 km²
1 100 km linéaire de cours d'eau

36 communes
Densité = 13,5 hab/km²
Mitage de l'habitat

Zones humides
=> ± 11 % du territoire

> 400 étangs de plus de 1 000 m²
= 2,5 % du territoire


Mosaïques d'habitats naturels => nombreux sites avec procédures réglementaires

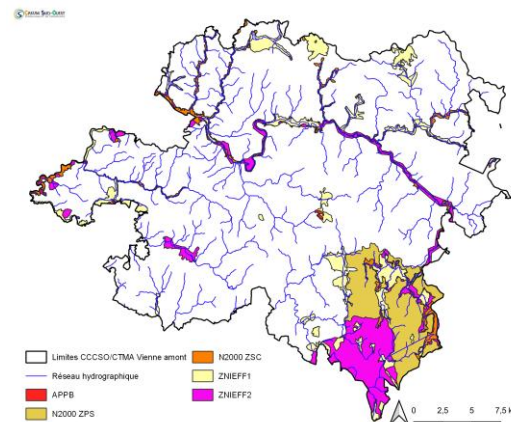

Territoire CC Creuse Sud-Ouest



29 masses d'eau dont 5 masses d'eau plans d'eau (EDL 2019) :
- 14 en bon état écologique
- 15 en état moyen et/ou médiocre

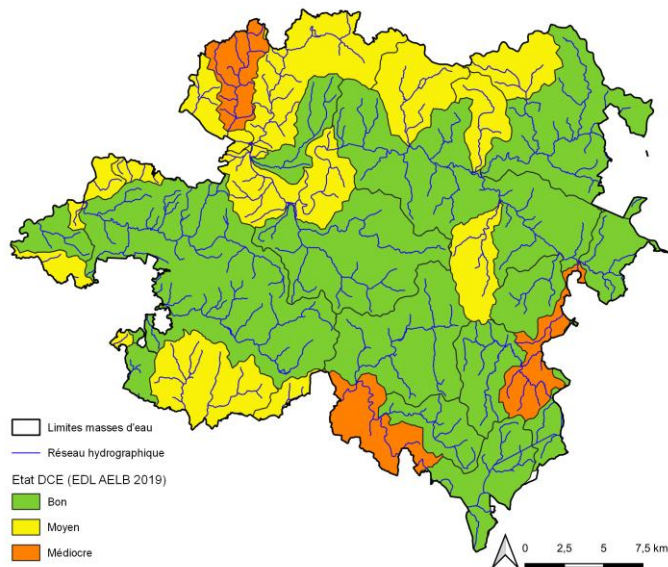

> 2/3 des masses d'eau = risque de non atteinte des objectifs de la DCE :

- obstacles à la continuité (13 masses d'eau)
- morphologie (5 masses d'eau)
- hydrologie (4 masses d'eau)

Obstacles à la continuité => nombreux ouvrages (seuils, barrages, étangs sur cours d'eau, ...)

Hydrologie => drainage des parcelles agricoles, plantation de résineux et/ou peupliers en bord de cours d'eau, nombreux étangs, dégradation des zones humides, ...

Morphologie => pratiques agricoles et forestières (piétinements, érosion des parcelles, rectification, recalibrage et déplacements des cours d'eau, ...)

02

Actions réalisées

Travaux d'aménagements agricoles
Animation auprès des propriétaires d'étangs




Travaux d'aménagements agricoles



41 passages à gué



Dispositifs
d'abreuvement

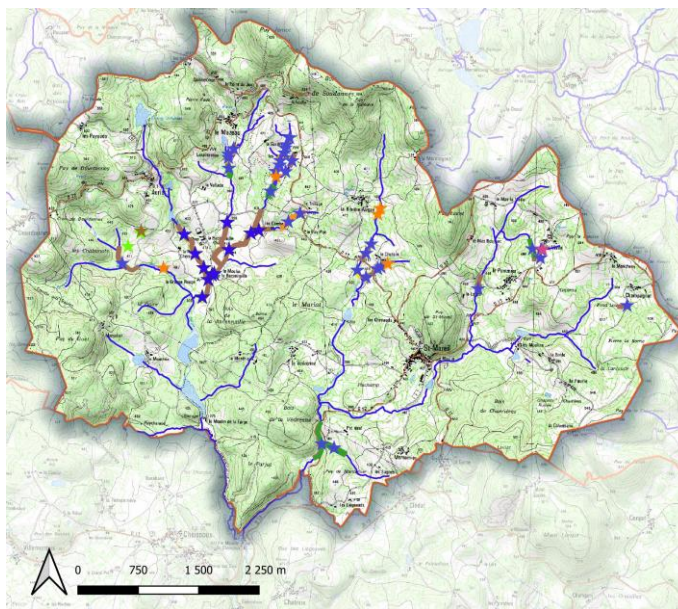

13 275 ml de clôtures



Restauration
hydromorphologique



2 150 ml de
débroussaillage
sélectif



Animation propriétaires d'étangs



Animation sur 2 masses d'eau

Le Pic avec entrée DDT 23



Visites systématiques

Comptes-rendus visites propriétaires
avec coordonnées CC CSO

Le Cheissoux avec
entrée CC CSO



Réunion infos
collective propriétaires

Visites sur sites

Autres sources (demandes
spontanées, ...)



Travaux effacement en cours pour chapelet de 4 étangs
AP pour 7 étangs => travaux à venir en 2026
8 décisions d'effacement
2 AP de mises aux normes



Travaux effacement étangs
Chavanat

03

Projets 2026






Travaux Banize FRGR 372

24 passages à gué



32 dispositifs d'abreuvement

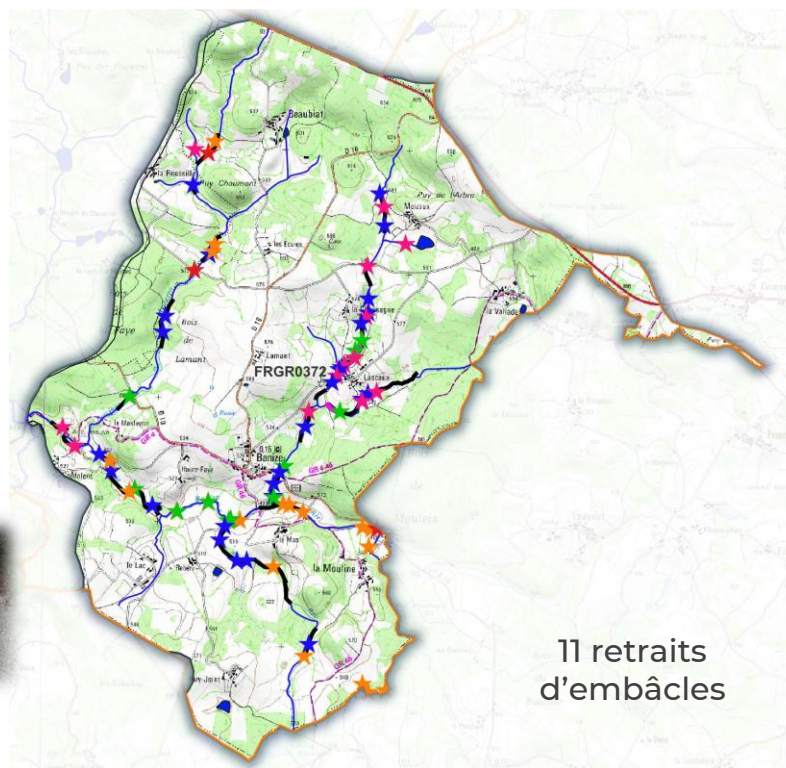

11 retraits d'embâcles

13 373 ml de clôtures



186 ml de remise en talweg

3 aménagements d'ouvrage continuité






Thaurion FRGR 368a et Leyrenne 1705


3 passages à gué



THAURION

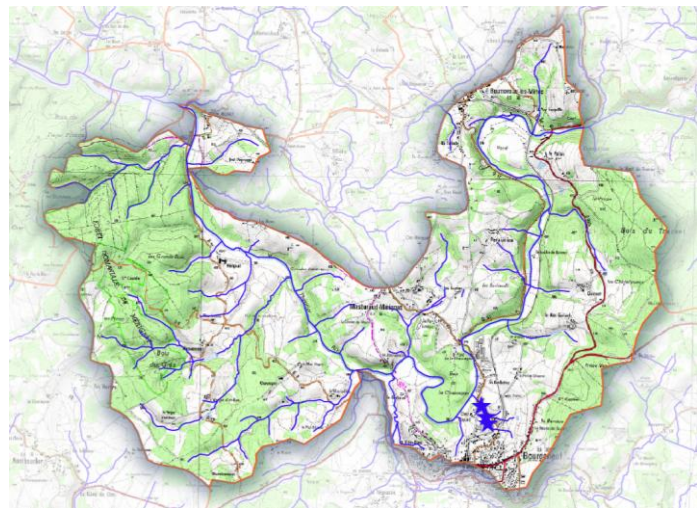

LEYRENNE

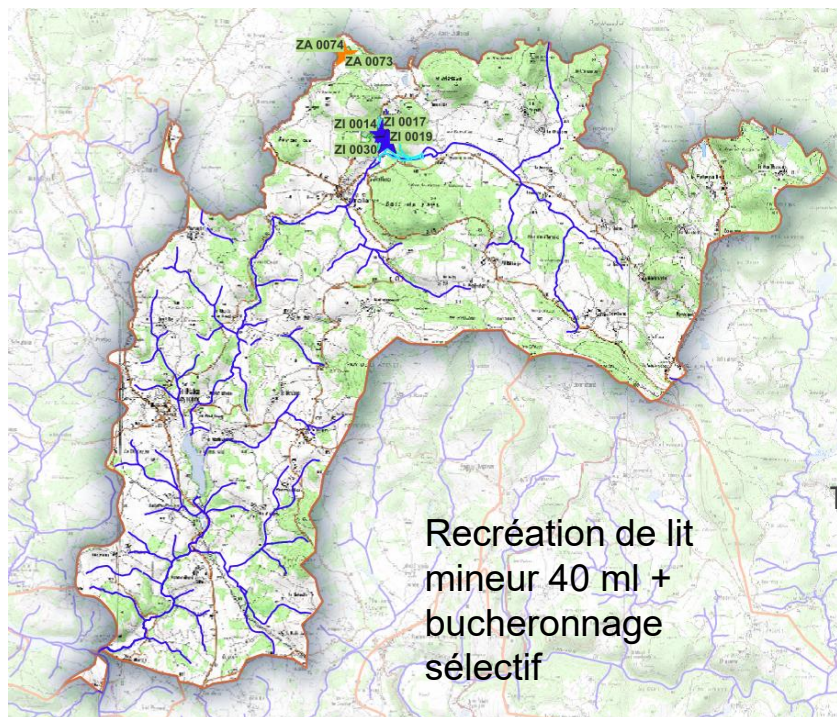

1 passage à gué



clôtures




1 descente aménagée





Cellule animation plan d'eau 2026

- Suivi des dossiers en cours
- Développement animation propriétaires sur le Thaurion FRGR 367b

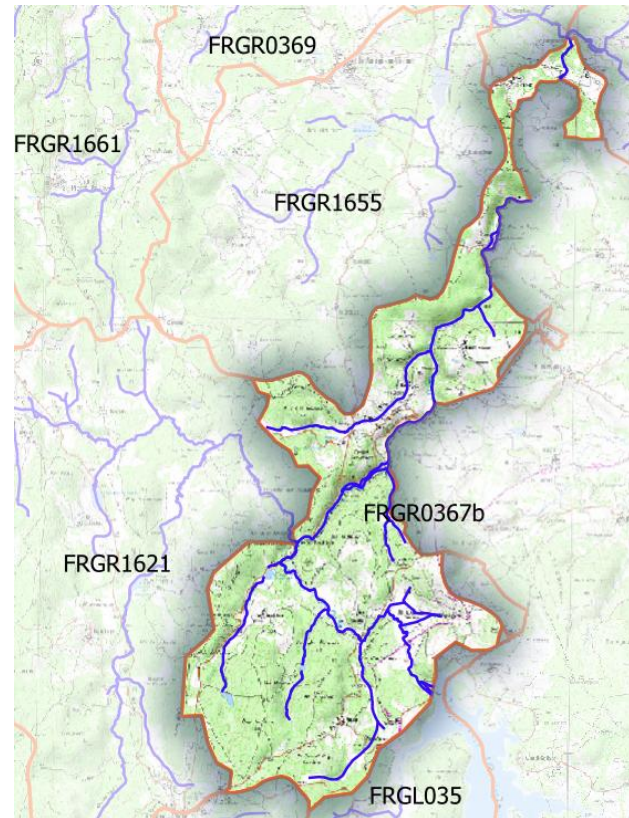



NATURE
2050

Points divers

PROGRAMME NATALIE



NATALIE

Accelerating and mainstreaming
transformative NATure-bAsed solutions to
enhance resiLIence to climate change
for diverse bio-geographical European
regions

Avancées du projet NATALIE

COPIL SEA du 27/11/2025

Justine GAUME – EPTB Vienne

Camille GAUBERT – PNR ML

Vanessa ROUSSY - SABV



LE PROJET EUROPÉEN NATALIE

LE PROJET EUROPÉEN NATALIE

De la mission Adaptation au Changement Climatique de la CE (« MACC »)

Objectif : Démontrer que les **solutions fondées sur la nature (SfN)** peuvent être des mesures robustes d'**adaptation au changement climatique** et accélérer leur déploiement.

Cible : Les régions (le niveau local = le fondement de l'adaptation, cf stratégie d'Adaptation de la CE du 24 février 2021)

⇒ Objectif CE : aider au moins 150 régions EU à devenir résilientes au climat d'ici à 2030.



Contenu technique :

- mise en œuvre de 18 mesures, principalement des SfN : dont 1 étude de cas en France
- modélisation de l'efficacité de ces mesures (quantitatif, qualitatif, biodiv, sols...)
- modélisation socio-économique des impacts du CC avec ou sans ces mesures
- travail sur l'acceptabilité sociale des SfN par implication des acteurs dans leur co-crédation
- test de 3 outils de financement de ces SfN
- rédaction de recommandations politiques pour accélérer le déploiement de ces mesures

8 sites de démonstration et 4 sites de réplication



L'ÉTUDE DE CAS FRANÇAISE : DES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE ET DANS LE GRAND-EST

Restauration d'écosystèmes aquatiques et gestion de l'eau en France

Demo Site #6 – Vienne River



Follower #6 – Grand-Est



CS#1-Flood and Wildfire risk mitigation in Greece
DS#1- Lelantine plain - GR

CS#2-Fresh water habitat restoration in urban ecosystems, in Romania

DS#2- Vacaresti Natural Park - RO
FL#2- Bucharest Children World Park - RO

CS#3-Constructed wetlands in Latvia and Lithuania

DS#3- Zemgale Region - LV
FL#3- Lithuania - LT

CS#4-Alternative water management solutions in Spanish archipelagos

DS#4- Canary Islands - SP
FL#4- Balears - SP

CS#5 - Aquifer recharge for water reuse in Belgium

DS#5- Blue Horizon Limburg - BE

CS#6-Aquatic system restoration and water management in France

DS#6- Vienne River - FR
FL#6- Grand Est - FR

CS#7-Coastal management with NBS in Iceland

DS#7- Arctic - IS


CS#8-Sustainable river restoration, maintenance and management in Italy

DS#8- Venice - IT


OBJECTIFS DU DS#6 AU SEIN DU PROJET NATALIE

Prouver et diffuser l'efficacité des SFN :

- **Amélioration de la quantité d'eau disponible** → augmentation de débits, diminution de l'évaporation, soutien d'étiage
- Amélioration de la qualité de l'eau → diminution des températures et de l'eutrophisation, fonctions épuratrices des ZH
- Amélioration de la biodiversité → milieux plus fonctionnels, gestion adaptée

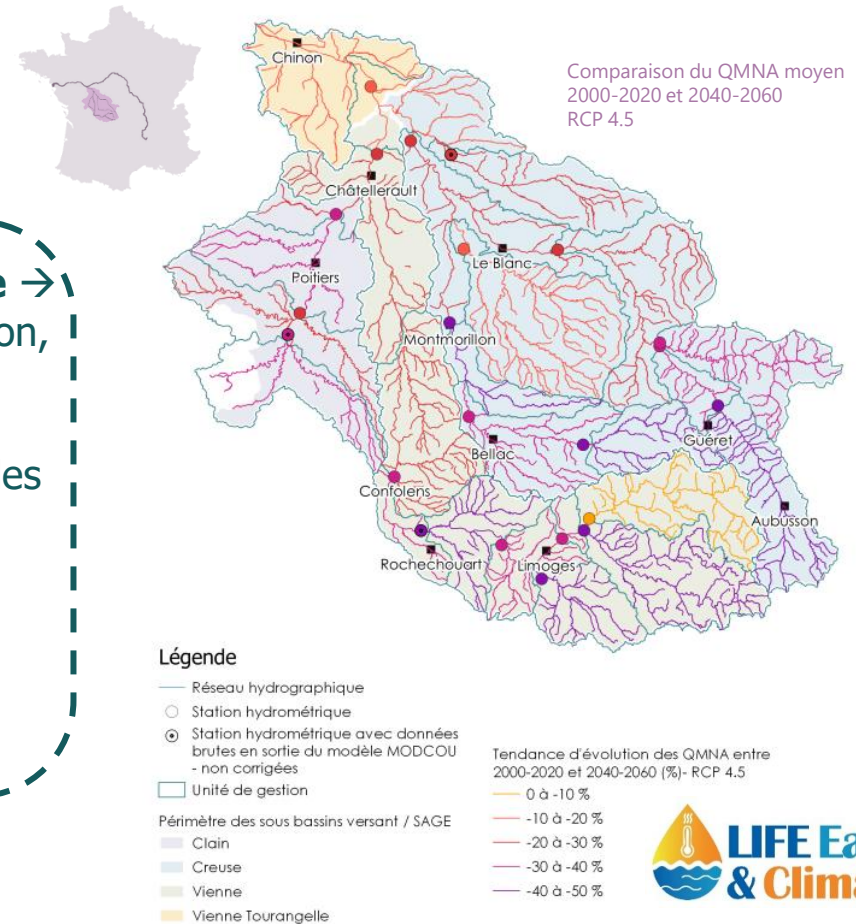

LES 7 SITES SÉLECTIONNÉS

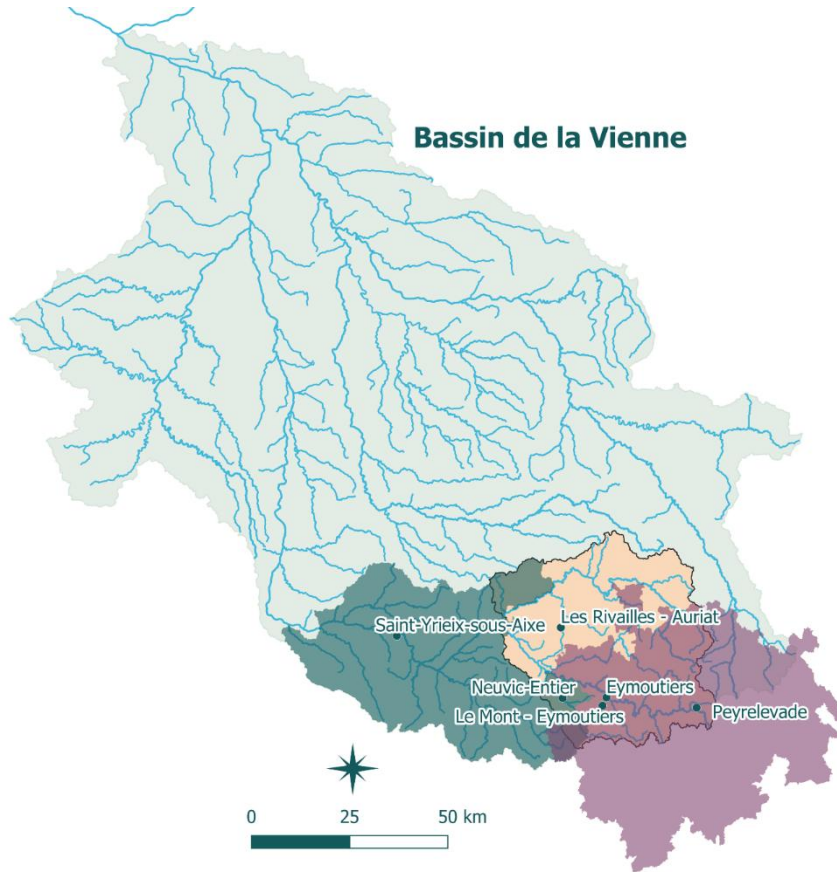

Site 1 – EPTBV : Effacement de 4 étangs en chapelet



Site 3 – PNR : Neutralisation de drains en tourbière (site du Mont, CEN NA)



Site 2 – EPTBV : Effacement d'un étang



Site 7 – SABV : Effacement d'un ancien étang comblé

Site 4 – PNR : Effacement d'un étang

Site 5 – PNR : Effacement de 2 étangs

Site 6 – PNR : Effacement d'un étang


AVANCÉES DES ACTIONS SUR LE BASSIN DE LA VIENNE

SITE 1 : EFFACEMENT D'UN ÉTANG À SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE (EPTBV)




SITE 2 : EFFACEMENT DE 4 ÉTANGS À AURIAT (EPTBV)

Évolution des débits (L.s⁻¹) à l'amont et à l'aval des étangs - Vallon Stéphane Lorient

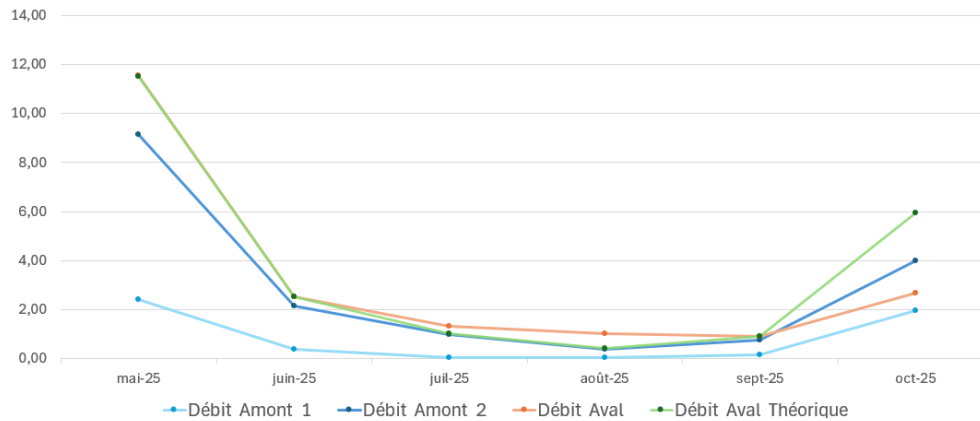

Évolution des températures (°C) à l'amont et à l'aval des étangs - Vallon Stéphane Lorient

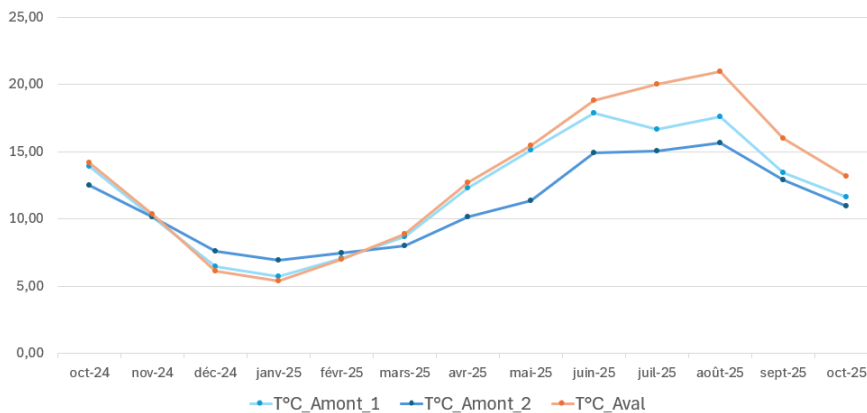


Analyse chimique des eaux réalisée en septembre 2025

	Amont 1	Amont 2	Aval	
Azote Kjeldahl mg.L ⁻¹ N	<0,5	0,74	2,4	x4
MES mg.L ⁻¹	6,9	230	7700 (PE>50mg)	x65
DCO mg.L ⁻¹ O2	11	28	68	x3,5
DBO5 mg.L ⁻¹ O2	0,7	0,6	1,9	x3
Phosphore total mg.L ⁻¹	0,02	0,02	0,12	x6

→ Les fuites du moine constituent un soutien d'étiage, mais avec une eau plus chaude et eutrophisée

SITE 2 : EFFACEMENT DE 4 ÉTANGS À AURIAT (EPTBV)

Évolution des débits (L.s⁻¹) à l'amont et à l'aval des étangs - Vallon Stéphane Lorient

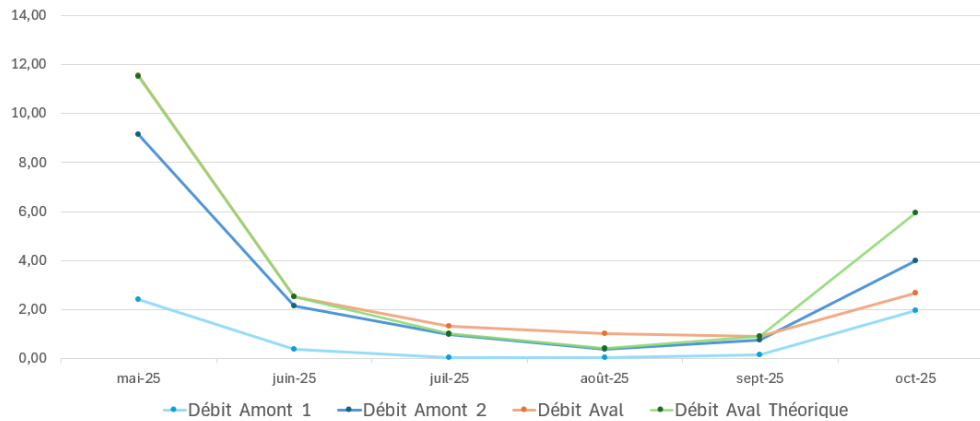

Monthly mean temperature evolution based on position of the hydrological station.
Site n°2 - AURIAT, SD error bars



Analyse chimique des eaux réalisée en septembre 2025

	Amont 1	Amont 2	Aval	
Azote Kjeldahl mg.L ⁻¹ N	<0,5	0,74	2,4	x4
MES mg.L ⁻¹	6,9	230	7700 (PE>50mg)	x65
DCO mg.L ⁻¹ O2	11	28	68	x3,5
DBO5 mg.L ⁻¹ O2	0,7	0,6	1,9	x3
Phosphore total mg.L ⁻¹	0,02	0,02	0,12	x6

→ Les fuites du moine constituent un soutien d'étiage, mais avec une eau plus chaude et eutrophisée

SITE 3 : NEUTRALISATION DE DRAINS DANS LA TOURBIÈRE DU MONT À EYMOUTIERS (PNR ML, CEN NA)




SITE 5 : EFFACEMENT D'UN ÉTANG À PEYRELEVADE (PNR ML)



Augmentation de la température directement en aval de la digue:
jusqu'à +9.87°C en température moyenne journalière


Refroidissement de l'eau plus en aval (présence d'une ripisylve)
A la dernière station (550 m en aval), l'impact de l'étang disparaît quasiment.

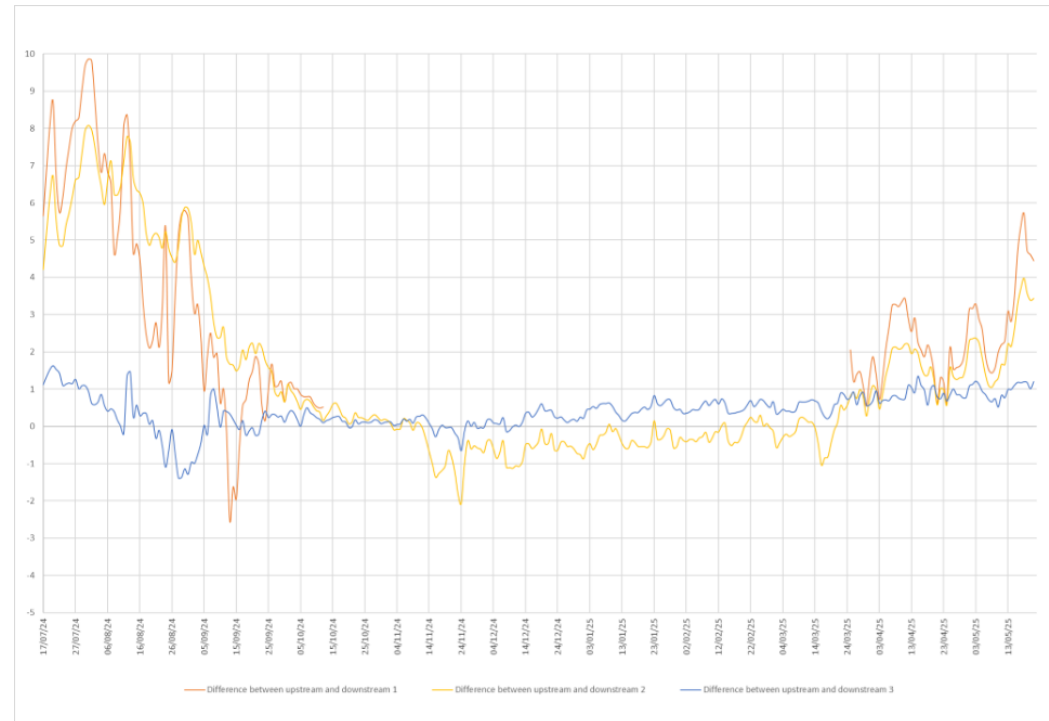

SITE 7 : EFFACEMENT D'UN ANCIEN ÉTANG COMBLÉ À NEUVIC-ENTIER (SABV)



Schéma du fonctionnement hydraulique de l'ouvrage

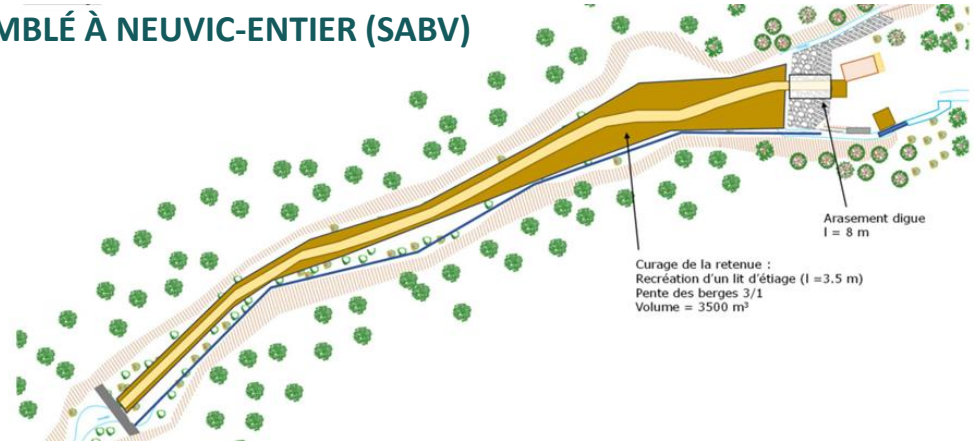

Synthèse des enjeux identifiés au droit du projet


	Continuité écologique			Hydromorphologie			Zone naturelle remarquable	Physico-chimie	Biologie
Compartiment	Piscicole	Sédimentaire	Lit mineur	Berge	Ripisylve	Lit majeur			
Niveau d'enjeu	Fort	Fort	Moyen	Faible	Faible	Faible	Fort	Fort	Fort
Détail de l'enjeu	Ouvrage infranchissable	Ouvrage bloquant, mais retenue comblée	Pente du lit mineur et habitats localement modifiés par l'ouvrage (250 m)	Pas d'enjeu particulier	Ripisylve dense sur l'ensemble de l'aire d'étude	Pas d'influence de l'ouvrage sur ce compartiment	Prairie humide en aval de l'ouvrage en rive gauche	Qualité physico-chimique de l'eau à préserver en phase travaux	Pop de TRF fonctionnelle sur le Vergnas, Mulette perlière sur la Vienne à l'aval
Compartiment	Prélèvements d'eau	Rejet d'assainissement	Hydro-électricité	Sécurité des biens et des personnes	Halieutisme	Loisirs	Patrimoine	Paysage	Site inscrit / classé
Niveau d'enjeu	Nul	Nul	Nul	Nul	Moyen	Nul	Faible	Faible	Nul
Détail de l'enjeu	Pas de prélèvement à proximité	Pas de rejet dans la zone du projet	Non concerné par cet enjeu, hydrologie trop faible	Pas d'enjeu sureté lié à l'ouvrage	Cours d'eau de première catégorie	Aucune activité de loisir recensée à proximité	Plus d'usage du barrage	Pas de visibilité de l'ouvrage, situé dans un vallon encaissé et densément boisé	Pas de site inscrit ou classé à proximité

Enjeu environnemental
 Enjeu récréatif

Enjeu socio économique
 Enjeu patrimonial

SUIVRE NOS ACTIONS : UNE SÉRIE DE VIDÉOS DISPONIBLE !

Chaîne YouTube de l'EPTB Vienne



5 vidéos déjà disponibles sur le projet européen NATALIE !



NATALIE

Accelerating and mainstreaming
transformative NATure-bAsed solutions to
enhance resiLIence to climate change
for diverse bio-geographical European
regions

Merci !

j.gaume@eptb-vienne.fr



www.natalieproject.eu



[@NatalieProject](https://www.linkedin.com/company/NatalieProject)



natalieproject@oieau.fr



Funded by
the European Union



UK Research
and Innovation



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
State Secretariat for Education,
Research and Innovation SERI



Informations diverses

PROCHAINES ÉCHÉANCES

DEMANDES DE SUBVENTIONS

2025

déc

jan.

fev.

mars

avr.

mai

juin

2026

juill.

aout

sept.

oct.

nov.

dec.

Agence
de l'eau
Loire
Bretagne

31/12/2025

Actions démarrant
au 01/01/2026
(Animation,
Communication...)

Autres opérations : Déposer sur la plateforme **dès que le dossier est prêt**. Ne pas attendre

./!\ 2024 : fin des dépôts en juin - 2025 : fin des dépôts en oct. ./!

* Si les actions débutent avant février -> déposer d'ici le 31/12/2025

Région
Nouvelle
Aquitaine

Plateforme en ligne en cours de déploiement. Déposer **dès que le dossier est prêt. ./!\ Évolution probable des taux**

CD19

Finance uniquement les aménagements de plan d'eau.
Commission tous les mois.

CD23


Développement d'une plateforme dématérialisée [1^{er} trim]
Déposer la demande en amont des travaux

CD87

Déposer sur la plateforme
du 02/02 au 31/05 *

* Avant le démarrage des opérations (ou courrier de
demande d'autorisation de commencement des
travaux)

PROCHAINES ÉCHÉANCES

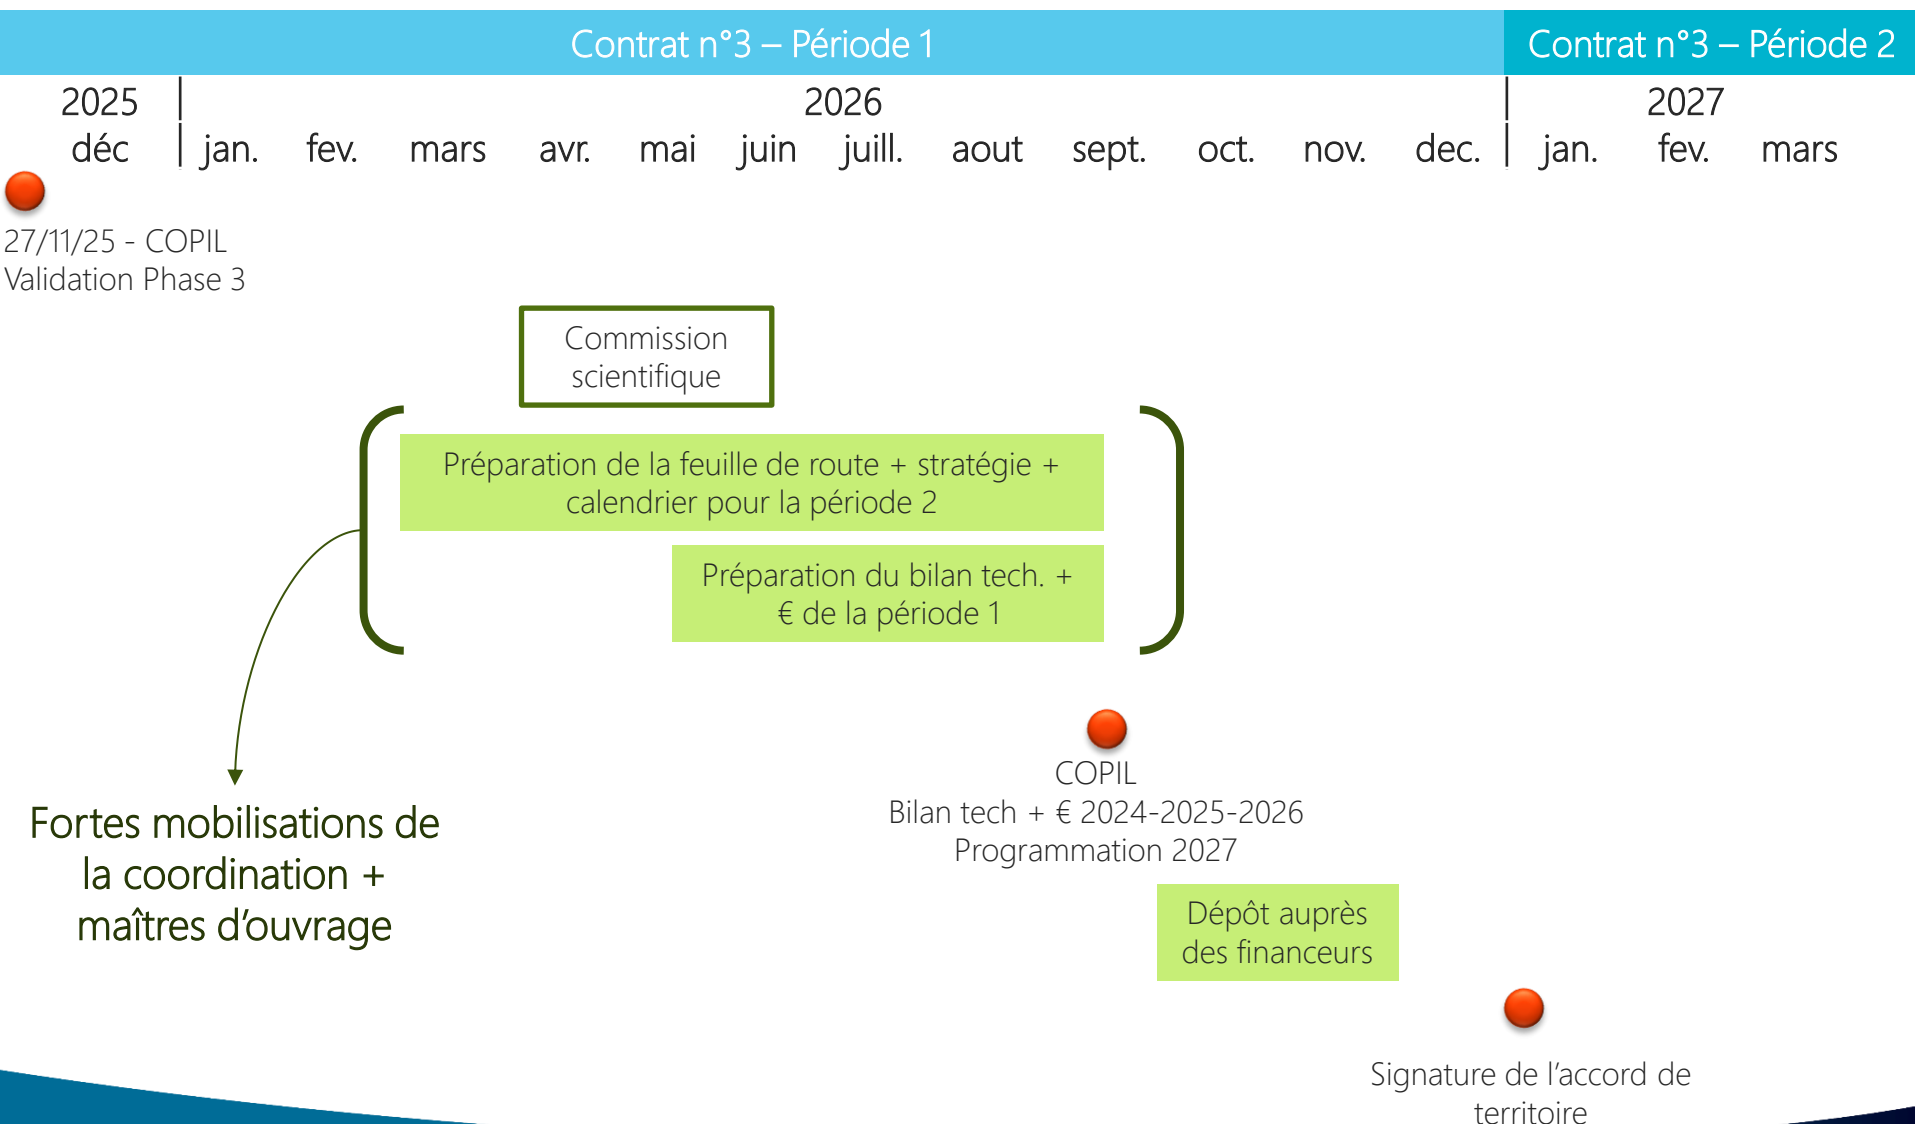

M E R C I !

Les maîtres d'ouvrage du troisième programme « Sources en action » :



Le troisième programme « Sources en action » bénéficie de subventions de :



NOUS CONTACTER



SOURCES
en action

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT

WWW.SOURCESENACTION.FR

HÉLÈNE THURET

05 55 06 39 42

h.thuret@eptb-vienne.fr



CAMILLE GAUBERT

06 77 83 89 51

c.gaubert@pnr-millevalches.fr

