



SOURCES *en action*

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT

Programmation prévisionnelle **Sources en action 3**

06 avril 2023





ORDRE DU JOUR

- Calendrier et état d'avancement
- Définitions
- Présentation programmation SEA 3
 - Financier
 - Opérations
- Financements
- Questions diverses

CALENDRIER ET AVANCEMENT

!/ 29/06 : COPIL !/

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1 D	1 M	1 M	1 S	1 L	1 J	1 S	1 M	1 V	1 D	1 M	1 V
2 L	2 J	2 J	2 D	2 M	2 V	2 D	2 M	2 S	2 L	2 J	2 S
3 M	3 V	3 V	3 L	3 M	3 S	3 L	3 J	3 D	3 M	3 V	3 D
4 M	4 S	4 S	4 M	4 J	4 D	4 M	4 V	4 L	4 M	4 S	4 L
5 J	5 D	5 D	5 M	5 V	5 L	5 M	5 S	5 M	5 J	5 D	5 M
6 V	6 L	6 L	6 J	6 S	6 M	6 J	6 D	6 M	6 V	6 L	6 M
7 S	7 M	Réu de NA	7 V	7 D	7 M	7 V	7 L	7 J	7 S	7 M	7 J
8 D	8 M	8 M	8 S	8 L	8 J	8 S	8 M	8 V	8 D	8 M	8 V
9 L	9 J	Réu CDEP	9 D	9 M	9 V	9 D	9 M	9 S	9 L	9 J	9 S
10 M	10 V	10 V	10 L	10 M	10 S	10 L	10 J	10 D	10 M	10 V	10 D
11 M	11 S	11 S	11 M	11 J	11 D	11 M	11 V	11 L	11 M	11 S	11 L
12 J	12 D	12 D	12 M	12 V	12 L	12 M	12 S	12 M	12 J	12 D	12 M
13 V	13 L	Limite réceptions supplémentaire	13 J	13 S	13 M	13 J	13 D	13 M	13 V	13 L	13 M
14 S	14 M	14 M	14 V	14 D	14 M	14 V	14 L	14 J	14 S	14 M	14 J
15 D	15 M	15 M	15 S	15 L	15 J	15 S	15 M	15 V	15 D	15 M	15 V
16 L	16 J	16 J	16 D	16 M	16 V	16 D	16 M	16 S	16 L	16 J	16 S
17 M	17 V	17 V	17 L	17 M	17 S	17 L	17 J	17 D	17 M	17 V	17 D
18 M	18 S	18 S	18 M	18 J	18 D	18 M	18 V	18 L	18 M	18 S	18 L
19 J	19 D	19 D	19 M	19 V	19 L	19 M	19 S	19 J	19 V	19 D	19 M
20 V	20 L	20 L	20 J	20 S	20 M	20 J	20 D	20 M	20 V	20 L	20 M
21 S	21 M	CO TSOH suite et programmation	21 V	21 D	21 M	21 V	21 L	21 J	21 S	21 M	21 J
22 D	22 M	22 M	22 S	22 L	22 J	22 S	22 M	22 V	22 D	22 M	22 V
23 L	23 J	23 J	23 D	23 M	23 V	COPI validation du contrat	23 D	23 M	23 S	23 J	23 S
24 M	24 V	Limite PPT COMBI	24 L	24 M	24 S	24 L	24 J	24 D	24 M	24 V	24 D
25 M	25 S	25 S	25 M	25 J	25 D	25 M	25 V	25 L	25 M	25 S	25 L
26 J	26 D	26 D	26 M	26 V	26 L	26 M	26 S	26 M	26 J	26 D	26 M
27 V	27 L	27 L	27 J	27 S	27 M	27 J	27 D	27 M	27 V	27 L	27 M
28 S	28 M	Fin des diag	28 V	28 D	28 M	28 V	28 L	28 J	28 S	28 M	28 J
29 D	29 M	29 M	29 S	29 L	29 J	COPI validation du contrat	29 S	29 M	29 D	29 M	29 V
30 L	30 J	30 J	30 D	30 M	30 V	30 D	30 M	30 S	30 L	30 J	30 S
31 M	31 V	31 V	31 L	31 M	31 J	31 L	31 J	31 M	31 M	31 D	31 D
Diagnostic terrain	Ecriture programmation	Ecriture contrat	Validation contrat	Dépôt contrat	Validation de la CLE SAGE Yverre	Instructions fin travaux					
	Ecriture DIG	Dépôt DIG			Instructions DIG						



RETOUR SUR LA COMMISSION SCIENTIFIQUE

- 7/03/23 : commission scientifique à Eymoutiers
+/- 35 personnes présentes

Présentations des bilans des suivis sur 2017-2021 et des perspectives pour 2024-2029
La **plus-value des suivis** (bio, physico-chimie...) pour **justifier de l'effet d'une opération** a été démontrée à maintes reprises

- Nécessité de poursuivre ces suivis, mais évolution de la stratégie de suivis :
 - Les suivis seront attribués à des opérations travaux afin de faire un diagnostic avant (rédaction de préconisations) et après travaux (effets des travaux)
 - IAM et pêche: maintien des stations historiques

Supports de séances <https://sourcesenaction.fr/calendrier/>

Compte-rendu en cours de rédaction

QUELQUES DÉFINITIONS

- Les actions permettant de lever des pressions
 - **Actions prioritaires (AELB)** : actions permettant de lever les pressions identifiées par la DCE
 - **Actions prioritaires (DIAG)** : actions permettant de lever les pressions identifiées lors des diagnostics de terrain
 - **Actions d'accompagnement** : autres actions permettant la restauration des milieux aquatiques (acquisition, suivi, ripisylve...)

 - **Spécificités des actions « morphologiques »**
 - **Actions structurantes** : diversification des écoulements, mise en défens...
 - **Actions complémentaires** : ripisylve
- À l'échelle du contrat les actions structurantes doivent représenter 80 % de l'enveloppe budgétaire des actions « morphologiques »

/!\ Si restauration d'une ripisylve particulièrement « fermée » et liée à des actions de restauration du cours d'eau peut être considérée comme « structurante ».

/!\ Une action « ripisylve » intervenant moins de 10 ans après une action ayant déjà eu lieu est considérée comme de l'entretien.

PROGRAMMATION GLOBALE FINANCIER

Montants prévisionnels annualisé

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Animation	529 239	562 453	560 636	590 752	595 541	612 865
<i>Animation CA ?</i>	<i>120 380</i>	<i>108 130</i>	<i>108 130</i>	<i>73 720</i>	<i>73 720</i>	<i>73 720</i>
Communication et sensibilisation	53 178	48 178	48 178	48 178	48 178	48 178
Etude et suivi	162 937	208 968	206 231	221 752	175 600	189 068
Travaux	675 902	539 633	619 817	620 750	788 650	781 707
Acquisition	84 000	104 400	105 828	102 000	107 000	107 000
TOTAL	1 625 635	1 571 762	1 648 820	1 657 151	1 788 688	1 812 537

Information reçue le 05/04
:
+ 270 000 € en animation non inclus dans les tableaux

Montants prévisionnels non annualisés

	2024 à 2029	2024 et 2025	2025 et 2026	2026 et 2028	2027 à 2029	2027 et 2028
Etude et suivi	10 000	-	-	8 000	15 000	31 000
Travaux	15 000	100 000	441 140	103 000	22 000	348 400
Acquisition	29 000	-	-	-	-	-

PROGRAMMATION GLOBALE FINANCIER

- Montants prévisionnels

	TOTAL	
Animation	4 009 286 *	36%
Communication et sensibilisation	294 067	3%
Etude, suivi et plan de gestion	1 228 553	11%
Travaux	5 055 999	45%
Acquisition	639 228	6%
TOTAL	11 227 133 pour 6 ans	

* Quid des CA (557 800€)

POUR RAPPEL

Montants prévisionnels
SEA 1 : 7,5 M€ pour 5 ans
SEA 2 : 12,3 M€ pour 5 ans

Montants réalisés
SEA 1 : 4,8 M€ pour 5 ans
SEA 2 : 6,7 M€ pour 5 ans

Information reçue le 05/04 :
+ 270 000 € en animation non inclus dans les tableaux, soit 11 497 133 €

PROGRAMMATION DETAILS



Masses d'eau à enjeux 2027 A

Code	Nom	DCE 2015	DCE 2019	Risque(s)	Actions prioritaires (AELB)	Actions prioritaires (diagnostics)	Actions d'accompagnement	TOTAL contrat
FRGR0356	La Vienne depuis Peyrelevade jusqu'à l'aval de la retenue de Bussy	Moyen	Moyen	Morpho Obstacles	544 000€ (83%)	-	108 000€ (17%)	652 000€
FRGR1390	La Maulde et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue de Vassivière	Moyen	Moyen	Obstacles	16 000€ (41%)	23 000€ (59%)	-	39 000€
FRGR1661	Le Vidaillat et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Bon	Moyen	Pesticides	-	129 000€ (100%)	-	129 000€
FRGR1686	Le Marque et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Moyen	Moyen	Obstacles	100 000€ (100%)	-	-	100 000€
FRGR1691	Le Vavette et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Moyen	Moyen	Obstacles	51 000€ (57%)	35 840€ (40%)	2 000€ (2%)	88 840€
TOTAL					711 000€ (70%)	187 840€ (19%)	110 000€ (11%)	1 008 840€

/!\ enjeux bivalves connus

PROGRAMMATION EXEMPLE




FRGR0356	La Vienne depuis Peyrelevade jusqu'à l'aval de la retenue de Bussy			
Etat DCE 2015	Moyen	Risque global	Morphologiques	Obstacles à l'écoulement
Etat DCE 2019	Moyen	Oui	Oui	Oui

Actions prioritaires (AELB)	Continuité	CC V2M : Aménagement routier (Enclose) PETR : Suppression seuil (Lachaud) – Gestion d’embâcles (Lachaud et Charapoux) PNR ML : Travaux seuils (Nedde)
	Morpho	CC V2M : Restauration ponctuelle d’écoulement (5km) – Mise en défens (Vienne et Enclose) – Restauration ZH (7,5ha) (Enclose) FD19 : Mise en défens + descentes aménagées ou passages à gué (entre Peyrelevade et Servières) PETR : Abreuvoir + Franchissement + clôtures (Lubet, Lavaud, Romager, Chaud, affluent de la Vienne (Vialle), Charapoux) – Remise dans le lit (ruiss Lavaud) – Restauration ripisylve (Lachaud et Charapoux)
Actions prioritaires (Diag)	-	-
Actions d’accompagnement (suivi, acquisition...)	Suivis	FD19 : Suivi Peyrelevade
	Foret	CC V2M : Acquisition parcelle forestière
	ZH	CC V2M : Acquisition parcelle ZH

Liste non exhaustive. Détails par masse d'eau dans le fichier Excel


PROGRAMMATION DETAILS

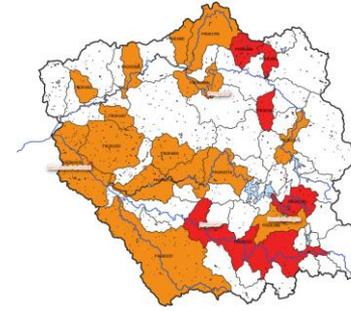

Masses d'eau à enjeux 2027

Code	Nom	DCE 2015	DCE 2019	Risque(s)	Actions prioritaires (AELB)	Actions prioritaires (diagnostics)	Actions d'accompagnement	TOTAL contrat
FRGR0357b	La Vienne depuis la confluence de la Maulde jusqu'à la confluence avec le Taurion	Moyen	Moyen	Morpho Obstacles Hydro	358 000€ (95%)	-	17300€ (5%)	375 300
FRGR0370	La Combade et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Bon	Moyen	Obstacles	456 000€ (61%)	184 450€ (25%)	109 900€ (15%)	750 350
FRGR0371b	La Maulde depuis la retenue de Vassivière jusqu'à l'amont du plan d'eau de Mont Laron	Moyen	Médiocre	Obstacles	20 000€ (33%)	40 000€ (67%)	-	60 000
FRGR0371c	La Maulde depuis l'amont du plan d'eau de Mont Laron jusqu'à la confluence avec la Vienne	-	Moyen	Obstacles Macropoll	76 700€ (100%)	-	-	76 700
FRGR1306	La Feuillade et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Médiocre	Moyen	Morpho Obstacles Hydro Macropoll	100 750€ (100%)	-	-	100 750
FRGR1603	Le Cheissoux et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Maulde	Bon	Moyen	Morpho Hydro	293 590€ (94%)	18 550€ (6%)	-	312 140
FRGR1650	Le Tard et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Maulde	Bon	Moyen	Pesticides Obstacles Hydro	51 700€ (19%)	220 000€ (81%)	-	271 700

PROGRAMMATION DETAILS

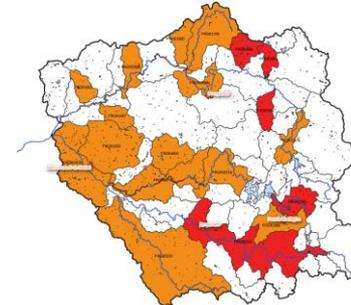

Masses d'eau à enjeux 2027

Code	Nom	DCE 2015	DCE 2019	Risque(s)	Actions prioritaires (AELB)	Actions prioritaires (diagnostics)	Actions d'accompagnement	TOTAL contrat
FRGR1657	La Bobilance et ses affluents depuis la source jusqu'au complexe de Saint-Marc	Médiocre	Moyen	Pesticides Hydro	35 000€ (47%)	40 000€ (53%)	-	75 000
FRGR1663	Le Coussac et ses affluents depuis la source jusqu'au complexe de Saint-Marc	Médiocre	Médiocre	Obstacles	214 000€ (70%)	87 000€ (28%)	5 000€ (2%)	306 000
⚠️ FRGR1682	Le Grandrieux et ses affluents depuis la source jusqu'au complexe de la Roche Talamy	Bon	Médiocre	Obstacles	60 000€ (16%)	313 400€ (83%)	6 000€ (2%)	379 400
⚠️ FRGR0368a	Le Taurion depuis Thauron jusqu'au complexe de la Roche Talamie	Moyen	Moyen	Morpho Obstacles	<i>Diag territorial CC CSO : ME non prioritaire à ce titre</i>			
FRGR0367b	Le Taurion depuis la retenue de Lavaud-Gelade jusqu'à la confluence avec la Banize	Médiocre	Médiocre	Morpho Obstacles Hydro	<i>Diag territorial CC CSO : ME non prioritaire à ce titre</i>			
FRGR0368c	Le Taurion depuis le complexe de la Roche Talamie jusqu'au complexe Saint-Marc	Moyen	Moyen	Obstacles	<i>Sur le territoire de la CC Bénévent Grand Bourg. Des discussions ont été initiées en 2022.</i>			
⚠️ FRGR1705	La Leyrenne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Moyen	Moyen	Morpho Obstacles	<i>En partie sur le territoire de la CC Bénévent Grand Bourg. Diag territorial CC CSO : ME non prioritaire</i>			
TOTAL					1 665 740€ (62 %)	903 400€ (33%)	138 200€ [5%]	2 707 340

PROGRAMMATION EXEMPLE


FRGR1650	Le Tard et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Maulde				
Etat DCE 2015	Bon	Risque global	Hydro	Obstacles	Pesticides
Etat DCE 2019	Moyen	Oui	Oui	Oui	Oui



Actions prioritaires (AELB)	Continuité	PETR : aménagement ou effacement étang
	Hydro	PETR : Restauration de zones humides : dédrainage (La Galamach) (en partenariat avec le CEN)
Actions prioritaires (Diag)	Morpho	PETR : 16 abreuvements, 27 franchissements, 16 800ml clôtures (Le Moulard, Le Palland, La Galamache, La Mareille, ruisseau lieu-dit Eycouveaux) – Remise dans le lit + renaturation (affluent de la Galamache) + restauration de ripisylve (800ml)
Actions d'accompagnement	-	
	-	
	-	

Liste non exhaustive. Détails par masse d'eau dans le fichier Excel


PROGRAMMATION DETAILS

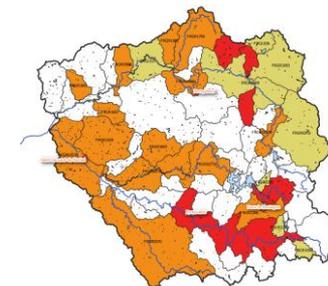

Masses d'eau présentant un risque

Code	Nom	DCE 2015	DCE 2019	Risque(s)	Actions prioritaires (AELB)	Actions prioritaires (diagnostics)	Actions d'accompagnement	TOTAL contrat
⚠ FRGR0369	Le Taurion depuis la confluence de la Banize jusqu'à Thauron	Bon	Bon	Obstacle	<i>Diag territorial CC CSO : ME non prioritaire à ce titre</i>			
FRGR0372	La Banize et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Bon	Bon	Morpho Obstacles	307 485€ (98%)	-	6 000€ (2%)	313 485€
FRGR1098	Le Chamboux et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Bon	Bon	Morpho Obstacles Hydro	60 000€ (100%)	-	-	60 000€
⚠ FRGR2235	La Gane et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue de Vassivière	Bon	Bon	Obstacles	-	5 000€ (100%)	-	5 000€
⚠ FRGR1693	La Gosne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Bon	Bon	Obstacles	5 000€ (71%)	2 000€ (29%)	-	7 000€
FRGR2259	La Chandouille et ses affluents depuis la retenue du Chammet jusqu'à la confluence	Bon	Bon	Morpho Obstacles	45 000€ (85%)	-	8 000€ (15%)	53 000€
FRGL027	Complexe de la Roche Talamie	Moyen	Moyen	Nitrates	<i>Sur le territoire de la CC Bénévent Grand Bourg</i>			
FRGL036	Complexe de St Marc	Moyen	Bon	?	-			
TOTAL					417 485€ (95%)	7 000€ (2%)	14 000€ (3%)	438 485€

PROGRAMMATION DETAILS

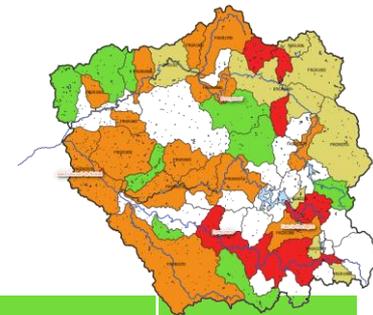

Autres masses d'eau (programmation depuis le diagnostic terrain)

	Code	Nom	DCE 2015	DCE 2019	Risque(s)	Actions prioritaires (AELB)	Actions prioritaires (diagnostics)	Actions d'accompagnement	TOTAL contrat
CD23 /!\	FRGR1513	Le Taurion et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue de Lavaud-Gelade	Bon	Bon	-	-	27 350€ (100%)	-	27 350€
CD23	FRGR1528	L'Alesmes et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Maulde	Moyen	Bon	-	-	16 600€ (100%)	-	16 600€
CD23	FRGR1632	Le Pic et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Maulde	Très bon	Bon	-	-	63 784€ (100%)	-	63 784€
CD23	FRGR1666	la Mourne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Bon	Bon	-	-	103 000€ (93%)	8 000€ (7%)	111 000€
	FRGR1142	La Ribière et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Très bon	Très bon	-	-	7 000€ (100%)	-	7 000€
	FRGR1264	Le Vergnas et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne	Très bon	Bon	-	-	95 000€ (80%)	24 100€ (20%)	119 100€
	FRGR1672	Le Parleur et ses affluents depuis la source jusqu'au complexe de Saint-Marc	Bon	Bon	-	-	155 300€ (70%)	66 600€ (30%)	221 900€
CD23	FRGR1675	Les Egaux et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Taurion	Médiocre	Bon	-	-	30 000€ (100%)	-	30 000€
	FRGR1685	La Gane et ses affluents depuis la source jusqu'au complexe de Saint-Marc	Bon	Bon	-	-	184 600€ (84%)	35400€ (16%)	220 000 €
	TOTAL						682 634€ (84%)	134 100€ (16%)	816 734€

PROGRAMMATION DETAILS

- Toutes masses d'eau (actions non localisables)

	Total général
Communication	294 067
<i>TMV</i>	132 565
<i>EPTB V</i>	24 000
<i>CC CGS</i>	5 000
<i>CC CSO</i>	24 000
Sensibilisation	108 501
<i>LNE</i>	108 501
Animation	3 971 486
Suivis, études	646 647
<i>CEN NA</i>	90 500
<i>GMHL</i>	128 085
<i>LNE</i>	136 221
<i>LPO</i>	99 841
<i>MEP19 + FD</i>	156 000
<i>PNR</i>	12 000
Total	4 888 199

Selon la stratégie du 3^{ème} contrat, ces actions seront rattachées à une opération continuité (seuil ou étang, aménagement ou effacement) :

- Un état des lieux avant travaux permettra de préconiser les opérations
- Un suivi après travaux permettra d'évaluer l'effet des travaux

Le financement des suivis normés est assuré (CEN, MEP + FD, PNR).

Le financement des autres suivis « connaissance » n'est pas assuré (voir OFB ou DREAL ?), il faudra argumenter sur la plus-value de ces suivis et garantir qu'ils permettront de mettre en évidence l'effet des actions associées.

PROGRAMMATION DETAILS

- Des masses d'eau à confirmer/préciser

	Total général
Continuité	210 500
CC CGS	95 500
CC CSO	100 000
PNRML	15 000
Etude	15 000
HCC	15 000
Forêt	35 000
CC V2M	20 000
PNRML	15 000
Restauration morphologie	18 000
CC CGS	18 000
Restauration ripisylve	2 400
CC CGS	2 400
ZH	1 071 634
CC V2M	15 000
CEN NA	1 056 634
ZH ou Forêt	15 000
CC CGS	15 000
Total général	1 367 534

PROGRAMMATION BILAN

- Proportion par rapport à l'enveloppe globale

	Montant	
2027A	984 840€	9%
2027	2 707 340€	24%
À risque	438 485€	4%
Autres ME (diag terrain)	816 734€	7%
Actions à localiser	1 367 534€	12%
Toutes ME	4 912 200€	44%
TOTAL	11 227 133 €	



Actions localisables	Montant	
ME prioritaires	4 130 665 €	65%
ME non prioritaires	816 734 €	13%
Actions à localiser	1 367 534 €	22%
TOTAL	6 314 933	



PROGRAMMATION

- Programmations non définitives (ajustables jusqu'à début juin)
- Manque encore quelques données

FINANCEMENTS

- **Mi-mai** : envoi de la programmation aux financeurs qui intégreront les taux d'accompagnement

- **Plan de résilience de l'AELB**
 - Modification du 11^{ème} programme à compter du 6 avril 2023 et jusqu'en 2024 (compris)
 - **Évolution Zones Humides**
 - » Taux d'aide à 70% + 10% (soit 80%) si sur des zones de revitalisation rurale
 - » Études (plan de gestion, inventaire), travaux, acquisition
 - » Toutes structures
 - » Priorisation sur masses d'eau dégradées

 - **Évolution Continuité écologique** : Effacement seuil (hors moulin Liste 2) ou étang privé
 - » Taux : 100%. Si porté par une collectivité, doit être inscrit dans le budget en fonctionnement
 - » Travaux + mesures d'accompagnement

- **Appels à projets** : biodiversité (plus large que espèces PNA) et renaturation villes et villages



NOUS CONTACTER



SOURCES
en action

CONTRAT TERRITORIAL
VIENNE AMONT

WWW.SOURCESENACTION.FR

HÉLÈNE THURET

05 55 06 39 42

h.thuret@eptb-vienne.fr



CAMILLE GAUBERT

06 77 83 89 51

c.gaubert@pnr-millevaches.fr

